

EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE QUITO CABLES




LÍNEA OFELIA - ROLDOS

EPMMOP

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

QUITO
ALCALDÍA





EPMMOP

QUITO
ALCALDÍA



ESTACIÓN OFELIA




EPMMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

QUITO
ALCALDÍA

Ejecución de Obras Preliminares

- Remoción de Postes de Alumbrado Público ejecutado por la EEQ
- Replanteo y nivelación de edificaciones.

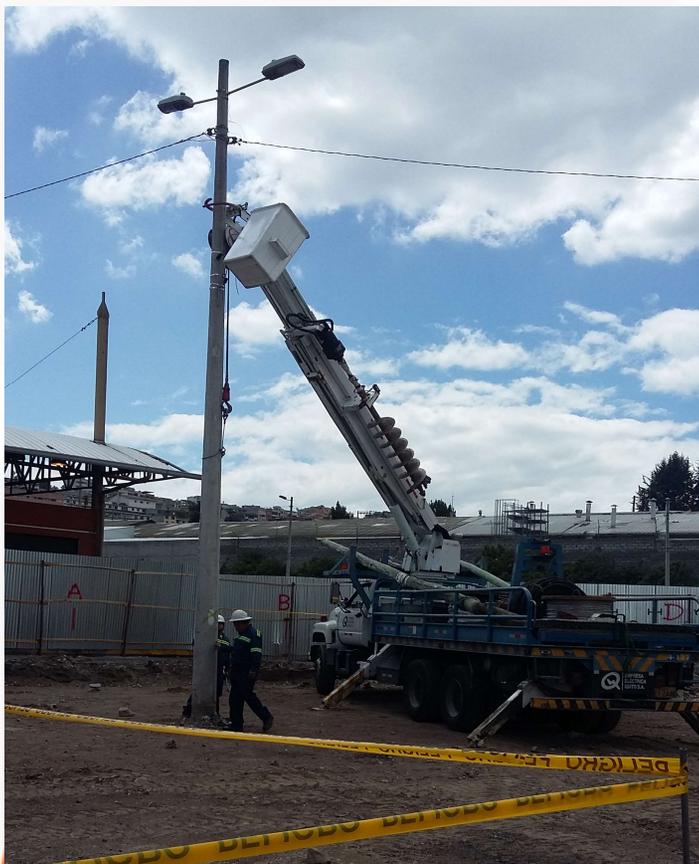

Ejecución de Obras Preliminares

- Desmontaje de Estructura Metálica



REUBICACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL CORREDOR CENTRAL NORTE (rubro nuevo):

- Reubicación de la nueva acometida eléctrica que provee al Corredor Central Norte: construcción de zanjas, cajas de revisión, instalación de tuberías, tendido de cables, compactación y tendido de asfalto.



Obras Civiles

- Armado de Pedestales
- Fundición de Replanto en Cimentación



ESTACIÓN COLINAS



EPMMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

QUITO
ALCALDÍA

Ejecución de Obras Preliminares

Replanteo y Nivelación

Derrocamiento de estructuras existentes



Obras Civiles

Excavación y Fundición de Cimentación (Pilas Prebarrenadas)



Obras Civiles

Fundición de Replantes



Suspensión del plazo contractual

- Oficio 437-CG de 28 de abril de 2017
 - Hallazgo de un posible material cultural
 - Falta de disponibilidad de predios
 - Literal P , cláusula 17 del contrato
 - Tercer párrafo, numeral 103-2.03 Especificaciones generales del MTOP
 - Sin perjuicio de que el contratista pueda avanzar en trabajos preliminares



2016			2017												2018											
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		



- PERIODO EN SUSPENSION -



Avance Ejecución del Monto Contractual

- **PROYECTO:** Quito Cables, Línea Norte: Roldós-Ofelia

- Planilla 1; \$18,287.35 ; 0.04%
- Planilla 2; \$12,394.85 ; 0.03%
- Planilla 3; \$30,409.05 ; 0.07%
- Planilla 4; \$25,462.94 ; 0.06%
- Planilla 5; \$14,591.59 ; 0.03%

Monto Total Ejecutado:
\$101'145.78

Avance: 0.23%



■ Por planillar: ■ Planilla 1 ■ Planilla 2 ■ Planilla 3 ■ Planilla 4 ■ Planilla 5



ESTADO DE PREDIOS



Información predios Quito Cables

- **Total de predios requeridos:** **34**
- Mediante acuerdo de negociación, pagados y liberados físicamente: **22**
- San José del Condado, existe liberación legal, no física, valores consignados en CNJ **8**
- En procesos de liberación **4**



SISTEMA ELECTROMECAÁNICO

EPMMOP

QUITO
ALCALDÍA



Componente Electromecánico

- CEE propone la inclusión de rubros nuevos y eliminación de otros, que comprenden rubros del componente electromecánico y de montaje.
- Una vez generado la propuesta del CEE (especificaciones técnicas, apus, tabla de cantidades), será remitido a EPMMOP quien a su vez oficializará a la fiscalización para su respectivo análisis y aprobación, para proceder a la suscripción del contrato complementario entre CEE y EPMMOP.
- El CEE realizará el proceso de contratación internacional a través del portal de compras públicas del SERCOP.



CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR



Medida Cautelar

- El Comité pro mejoras de Urbanización el Condado, presenta una Demanda de Medidas Cautelares en contra del MDMQ y EPMMOP
- La Unidad Judicial Penal de Carcelén acepta la demanda y como medida cautelar dispone que:
 - El MDMQ y EPMMOP implementen una mesa de participación ciudadana efectiva con la comunidad de la Urbanización El Condado con el acompañamiento y supervisión del CPCCS

Mesas de Trabajo

- 13 de noviembre de 2017, se acordó la entrega por parte de EPMMOP de toda la información concerniente al proyecto Quitocables (acuerdo cumplido por parte de EPMMOP).
- 27 de noviembre de 2017, se acordó realizar una presentación clara y completa del proyecto Quito (acuerdo cumplido por parte de EPMMOP).
- 21 de diciembre de 2017, se acordó dividir las mesas de participación ciudadana en tres temas generales: (acuerdo cumplido por parte de EPMMOP).
 - * Componente Económico del proyecto Quitocables.
 - * Componente de Ingeniería del proyecto Quitocables.
 - * Componente Jurídico y gestión de conflictos del proyecto Quitocables.



