

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000034

PROYECTO No. FECHA: 20 ABRIL DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TRONC 4 FASE II Y OYKOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO R. TRONC - OYKOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ROR Y S.P.R.
MANTENIMIENTO DE BOMBAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1;
Otros: PATRULLA EXAMINADORA
En reparación: 1 TRACTOR OYKOTO
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- En operación nocturna se realizó todos los trabajos en tronc 4 fase II y se cubrió los trabajos fiscalizadamente por parte de la empresa.
- Construcción de diques de contención de lodos, tronc 4 fase II.
- Disponibilidad de equipos, todos los equipos en operación.
- Control de puntos escombreras TRONC - EP.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000033

PROYECTO No. FECHA: 29 ABRIL 2017 DÍA: SÁBADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRAZO 4 FASE II / QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAZO - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE LOS PLATAFORMAS SUR OCCIDENTAL
RECEPCIÓN DE Lodos Y ESCOMBROS ESCOMBREDA QUITO
PLATAFORMA DE LTA
RECEPCIÓN DE Lodos EN LA NOCHE TRAZO 3
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA SUR DE ACCESO AL TRAZO 3

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras -; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros: RESTRODETECTORES
En reparación: 1 TRACTOR ZAPATA
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Disposición de 4 SIOTEROS y lodos ESCOMBREDA DE QUITO
- RECEPCIÓN DE Lodos EN PLATAFORMA SUR TRAZO FASE II
- Limpieza de Av. JIMÓN BOIVAR y JIM ISTEVEN DEL TRAZO 4 FASE II
- CONTROL DE POLVOS ESCOMBREDA


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000032

PROYECTO No. FECHA: 23/06/06 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN TRAZO 4 TMB II Y OVALITO

CONTRATISTA: COMPAÑIA FUERTE TRAZO OVALITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESCOMBREAS NOROCC Y SUR
- LEVANTAMIENTO DE LAS INTERIORS Y EXTERIORS
RECEPCIÓN DE LOSAS EN ESCOMBREAS OVALITO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: 2 ESTADYCLIMORA
En reparación: 1 TRACTOR
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

OPERACION NORMAL DE LAS ESCOMBREAS NOROCC-EP
TRAZO 4 TMB II Y OVALITO.

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000031

PROYECTO No. FECHA: 27.12.90 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRENAS TIPOSE A FASE II y OTRAS

CONTRATISTA: COMPLEJO TRATO QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL PLATAFORMA NOROCCIDENTAL
EMPRESA DE ELA
RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBRENAS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras - ; Volquetas -
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos - ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación: 1
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte X
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte X

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

RECEPCION DE ESCOMBROS Y 10000 F3 PLATAFORMA NOROCCIDENTAL, SUR.
TIPOSE A FASE II


- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR y SIN INTERFERENCIA DE LA ESCOMBRENA TIPOSE A FASE II
- CONTROL DE POLVO ESCOMBRENAS.
- RECEPCION DE MATERIAL SECO Y 10000 EN ESCOMBRENA OYACOTO



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

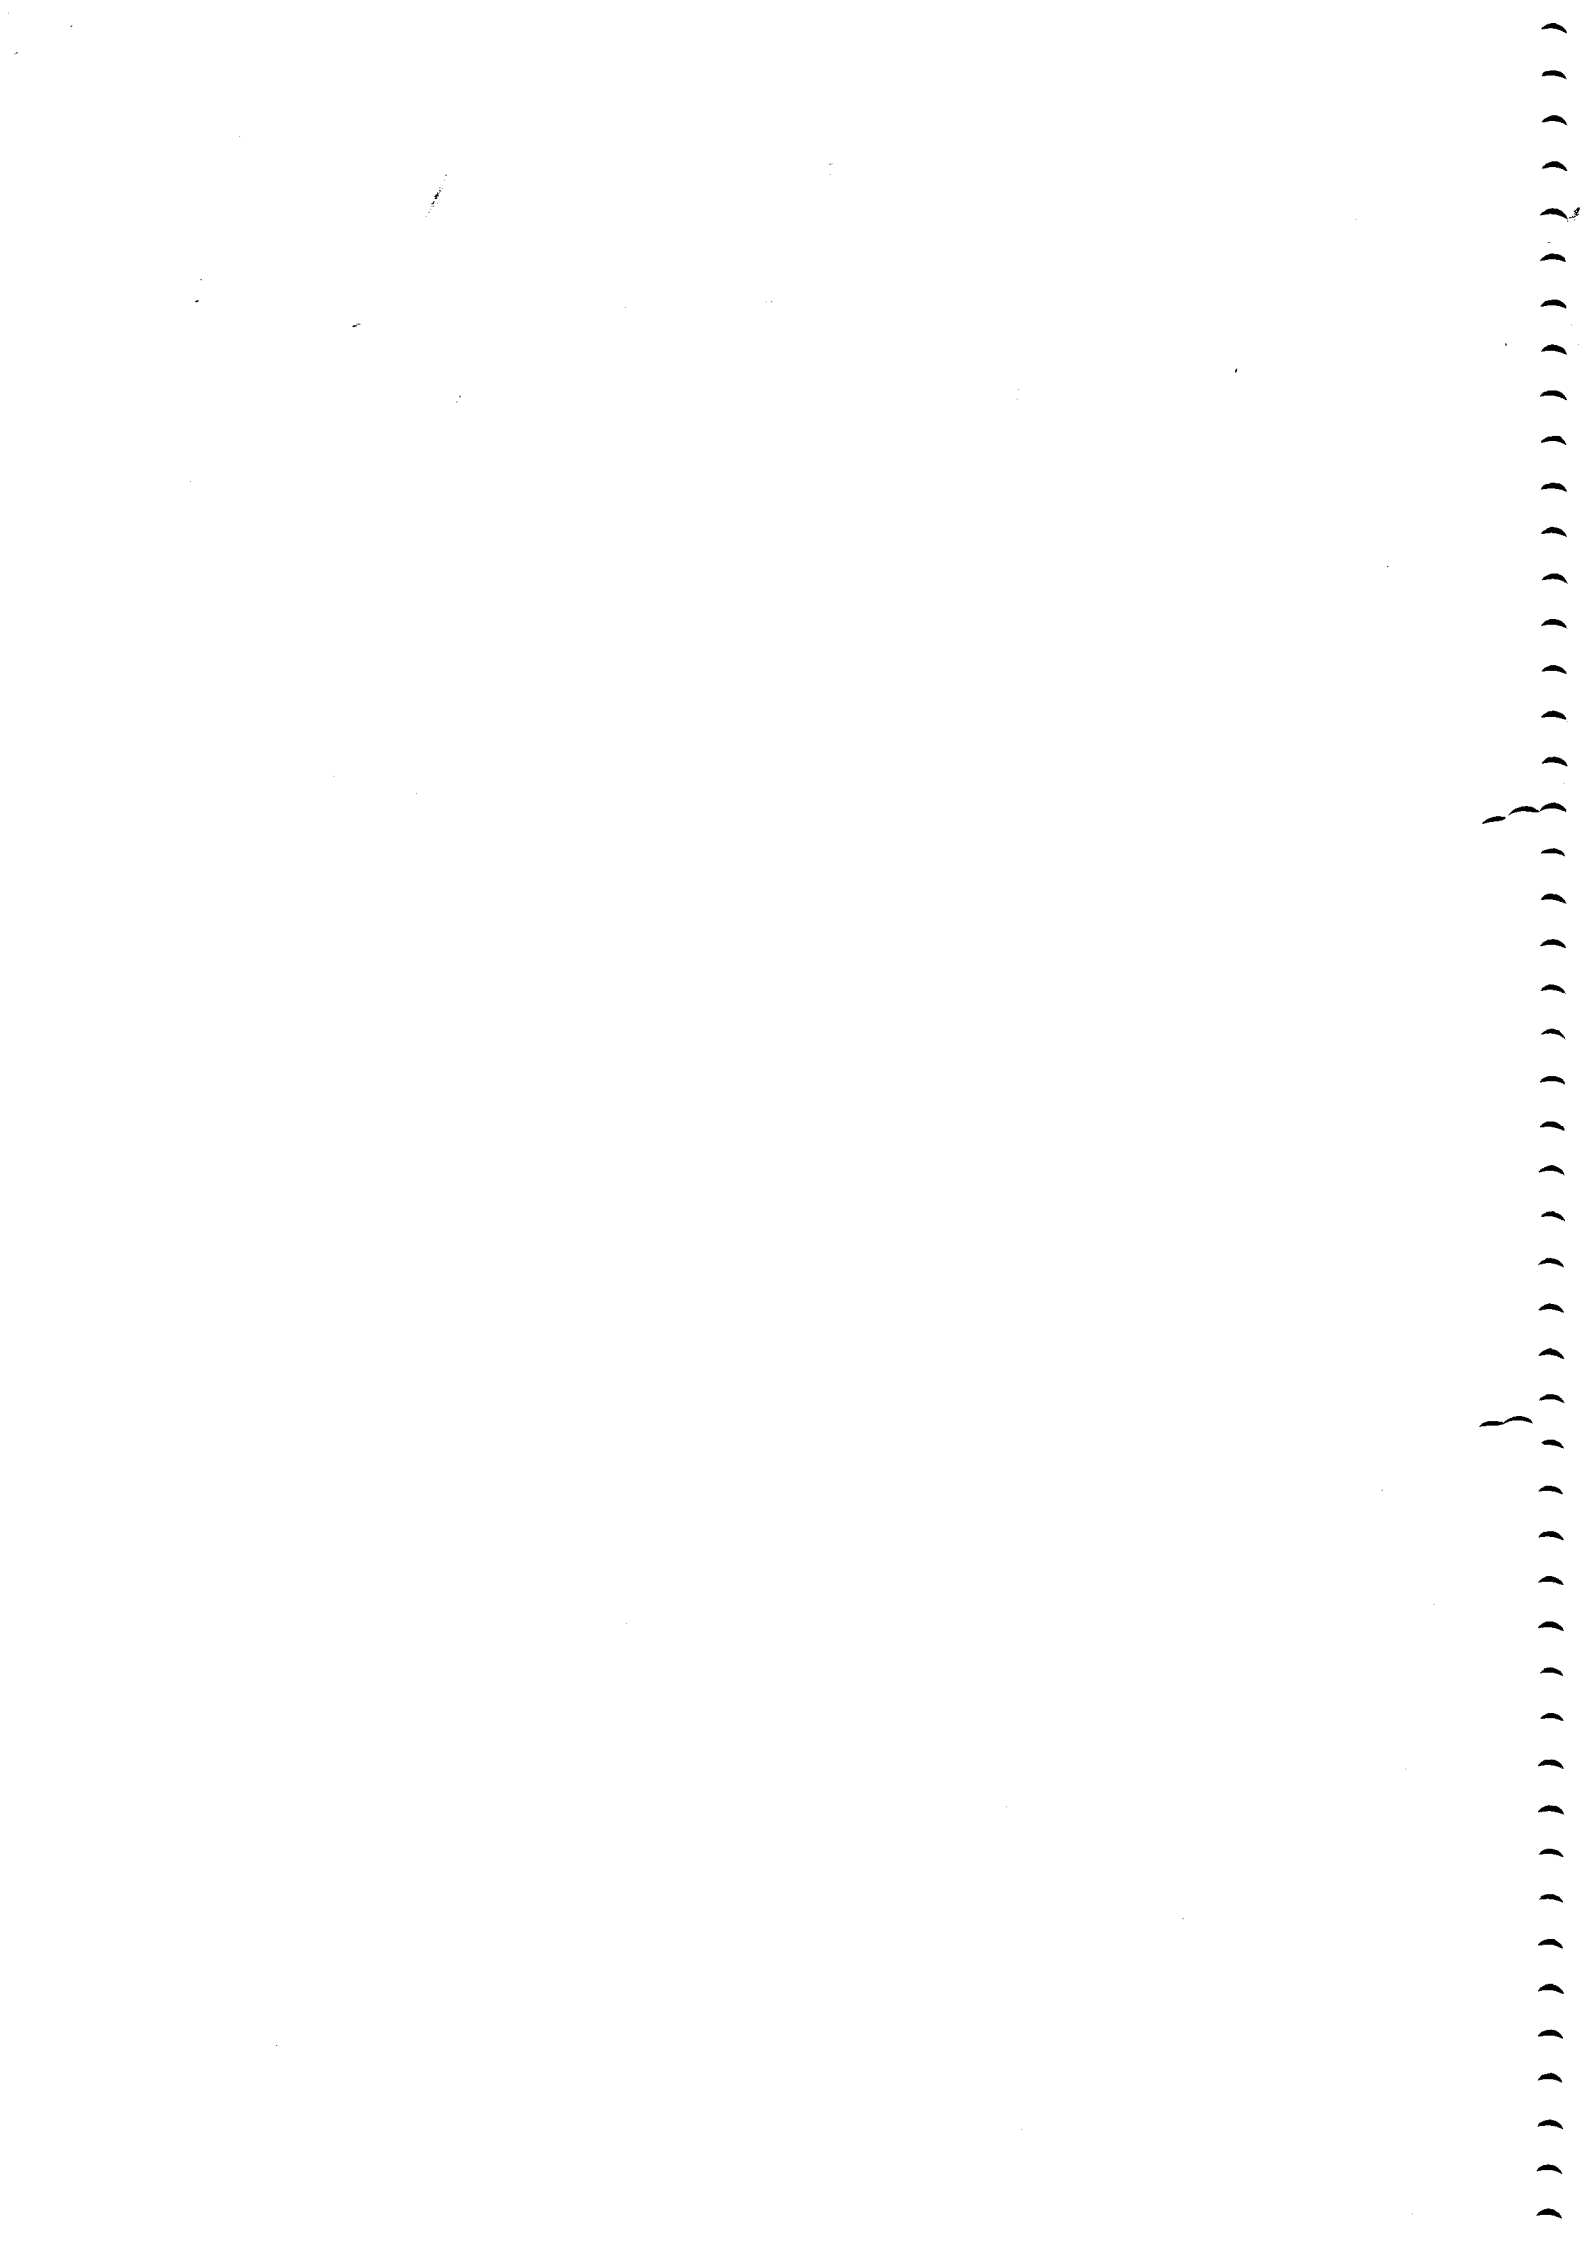

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000030

PROYECTO No FECHA: 26 DE ABRIL DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRONC 4 FASE 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONC OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL PLATAFORMA SUIZ OCCIDENTAL
- LIMPIEZA DE VÍAS
- RECEPCION DE MATERIALES ESCOMBRERAS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

OPERACION DE ESCOMBRERAS Y OYACOTO


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000029

PROYECTO No FECHA: 25 ABRIL DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCÓN FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIALES PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIALES ESCOMBRERAS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 10
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

SE CONTINUA RECIBIENDO MATERIAL EN PLATAFORMA SUR - OCCIDENTAL
TROTE Y FASE II
- ARRIBO DE VÍAS INTERNAS TROTE Y FASE II
- RECEPCIÓN DE MATERIALES SACO / LODO EN ESCOMBRERA
OYACOTO.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000028

PROYECTO No. FECHA: 24 ABRIL DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRONJE 4 FASES II Y OYACOTB

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONJE - OYACOTB
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL.
RECEPCIÓN DE MATERIAL ESCOMBRERA OYACOTB

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- SIN NOVEDAD OPERACION DE FISCALIZACION EYGIRES-EP
- CONTROL DE POLVOS ESOTRAMELAI
- ARRIBO DE VAS INTERNAS DE LA ESCOMBUELA EN TRONJE 4 FASES II



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000027

PROYECTO No. FECHA: 23 ABRIL DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROJE OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
ADECUACION DE PLATAFORMA NORTE Y SUR
ZONA DE USAS/

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION DE LAS ESCOMBRELERAS DEL TROJE Y FASE II Y OYACOTO SIN HOVEDAD.
- ENTREGA DE VIDA DE ACUESO A ESCOMBRELERAS.
- CONTROL DE PUNOS ESCOMBRELERAS.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000026

PROYECTO No FECHA: 22 ABRIL DÍA: SÁBADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRAZO 4 FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO TRAZO OBRAS
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR ORIENTAL ;
LIMPIEZA DE VÍAS
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LODO EN ESCOMBRERAS DE OBRAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 8
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ENTREGA DE AV. SINCE BOMBAR CON FOTOHUELA OMA.
- ARRABO DE PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL PARA RECEPCIÓN DE MATERIAL EN TRAZO 4 FASE II
- CONTROL DE PUNJOS DE LOS BLENAS.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, LODO EN ESCOMBRERA OBRAS.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000025

PROYECTO No. FECHA: 21/04/2017 DÍA: Viernes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASE Y FASE II Y OYACUTO

CONTRATISTA: COMUSCA TRASE - OYACUTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL / LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LODO EN ESCOMBRERA OYACUTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR - OCCIDENTAL (TRASE Y FASE II)
- LIMPIEZA DE VÍAS INTERIORES DEL TRASE Y FASE II Y AV. SIMÓN BOLÍVAR.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL SECO Y LODO EN ESCOMBRERA DE OYACUTO
- CONTROL DE PUNTO DE LAS ESCOMBRERAS.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000024

PROYECTO No FECHA: 20/04/2017 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: Escombrera Tercer y Fase II y Oyacoto

CONTRATISTA: Consorcio Tercer y Oyacoto
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material en plataformas norte y sur occidentales / construcción dique en escombrera III / limpieza Av. Simón Bolívar
- Recepción de lodos y sedos en escombrera Oyacoto

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 5
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado 0 Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti 0 Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte 0

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

Se continúa con la operación normal de las escombreras del Tercer y Fase II y Oyacoto. Sin novedad.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000023

PROYECTO No FECHA: 14/04/2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRONTO Y FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONTO - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / CONSTRUCCIÓN DIQUE EN ESCOMBRETA III / Limpieza de caminos y vías de acceso a la ESCOMBRETA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y BUELOS EN PLATAFORMA ESCOMBRETA OYALOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 100000 1 1 NOCTURNO
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL
- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO Y DIQUE DE INSTALACIÓN EN LA ESCOMBRETA EN TRONTO Y FASE II.
- CONTROL POR LOS ESTOYBUENAS.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESTOYBUENA DE OYALOTO.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000022

PROYECTO No. FECHA: 18/04/2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: Escomeras Trase 4 Fase II y Oyacoto

CONTRATISTA: Consorcio Trase - Oyacoto
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE LUDOS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / ACCESOS DE COMUNOS EN
PLATAFORMAS / CONSTRUCCIÓN DIQUE DE CONTENCIÓN ESCOMBRERAS III / Ampliación vías de
ACCESO A LA ESCOMBRERA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LUDOS EN LA ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 5
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado x Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter x Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti x Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE PROCEDE A RECIBIR LUDOS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL
- SE PROCEDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE EN LA SIEMBRE EN TIERRA PARA LO CUAL SE PROCEDE A LA CONFORMACIÓN DEL DIQUE DE CONTENCIÓN.
- ACCESOS DE VÍAS INTERIORES TRASE Y FASE II.
- RECEPCIÓN DE ESCOMBROS / LUDOS EN ESCOMBRERA DE OYACOTO
- CONTROL DE POLVOS EN ESCOMBRERA.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000021

PROYECTO No FECHA: 17/04/2017 DÍA: Lunes
DESCRIPCIÓN: Escombrera Trose 4 Fase II y Oyacoto

CONTRATISTA: Consorcio Trose Oyacoto
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción material en plataforma 202 - ocupacional / conformación de dique para recepción de lodo en escombrera Trose III / Limpieza y mantenimiento de vías de acceso a plataformas (Trose 4).
- Recepción de material seco y lodo en escombrera Oyacoto

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniiveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

SE CONTINUA CON LA OPERACION NORMAL DE LAS ESCOMBRERAS DEL TROSE 4 FASE II Y OYACOTO, SIN NOVEDAD ALGUNA.
- SE REALIZA EL CONTROL DE POLVOS EN LAS ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000020

PROYECTO No. FECHA: 15/04/2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMAS NORTE Y SUR - CIRCUNFERENCIA PERIFERICA DE UPS DE ACCESO.
- RECEPCIÓN DE JAROS Y SACA EN ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION NORMAL EN TRASE A FASE II, con Disposición de MATERIAL EN PLATAFORMA NORTE Y SUR.
- LIMPIEZA DE AV. JIRON BONUAR Y VIA INTERNA PERIFERICA EN TRASE A FASE II.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL SACA Y LODOS EN ESCOMBRERA OYACOTO.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000019

PROYECTO No. FECHA: 14/04/2017 DÍA: Viernes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASE 4 FASE II Y OYACUTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OYACUTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMAS NOR Y SUR OCCIDENTALES.
- LIMPIEZA DE CARRETERA Y VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TRASE 4).
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESCOMBRERA OYACUTO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE ESCOMBROS, TIERRA SECA Y LODOS EN ESCOMBRENA DE OYACUTO.
- CONTROL DE POLVOS ESCOMBRENAS IIBIRS-EP.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMAS NOR Y SUR DEL TRASE 4.
- LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO INTERIORES DEL TRASE 4.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000018

PROYECTO No FECHA: 13/04/2017 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSTRU TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR - OCCIDENTAL / LIMPIEZA Y REAJUSTE DE CAMINOS (TRUJE Y)
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 10 DIAS + 1 DIAS
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ..
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- OPERACION NORMAL EN ESCOMBRERAS DEL TRUJE A FASE II Y OYACOTO.
- CONTROL DE POCOS EN ESCOMBRERAS EN GIRC-EP.
- REAJUSTE DE VÍAS INTERNAS TRUJE A FASE II



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000017

PROYECTO No. FECHA: 12/04/2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: Escombrera Trase 4 Fase II y Oyacoto

CONTRATISTA: COMERCIO TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFUERA SUR (DINUC) / MATERIAL SECO
EN PLATAFUERA SUR OCCIDENTAL. MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y LIMPieza
DE VIAS DE ACCESO (TRASE 4)
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESCOMBRETA OYACOTO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: ROMÁN + LINDORNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 5
CHOFERES: 7
MECÁNICOS: 7
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFUERA SUR (DINUC) -
- RECEPCIÓN DE LODOS DEL PATIO DE QUITO EN ESCOMBRETA DE OYACOTO
- MANTENIMIENTO DE VÍAS INTERIORES EN TRASE 4.
- CONTROL DE POLVOS EN ESCOMBRETA.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000016

PROYECTO No FECHA: 17/04/2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: Escombrera Trase IV Fase II y OYALUTO

CONTRATISTA: Camocsa Inose - OYALUTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de lodos y Secos en plataforma Sur - ocacional limpieza de vías y camino de acceso (Trase 4)
- Recepción de lodos y Secos en escombrera OYALUTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 7

AYUD. MAQ.: 5

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1 ;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- Se dispone de el material seco y lodos en plataforma superior sur Trase 4 Fase II

- Limpieza de la Av. LITON BONDAR y Vías Estrechas del Trase 4 con motoniveladora.


- Control de Polvos en Estaciones OYALUTO y Disposición de todo tipo de material seco y húmedo en dicha Estación.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000015

PROYECTO No FECHA: 10/04/2017 DÍA: Lunes
DESCRIPCIÓN: Escarificación fase 4 FASE 4 y OYACOTO

CONTRATISTA: *CONSTRUCIONES TRUJE Y OYACOTO*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y Lodos EN PLANTAS SUR-OCCIDENTAL / MEJORAMIENTO DE CANALES POR ESCARIFICACIÓN EN PLANTAS SUR-OCCIDENTAL / Limpieza de vías de acceso (TRUJE 4)
- RECEPCIÓN DE Lodos y SECOS EN ESCOMBRETA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
YUD. MAQ.: 5
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA AV. JIMY BONDAR EN PLANTAS SUR-OCCIDENTAL
- SE RECIBE Lodos y TIERRA SECA EN PLANTAS SUR-OCCIDENTAL NORTE y SUR SUPERMONES TRUJE 4 FASE 4
- SE DISPONE DE MATERIAL DE ESCARIFICACIÓN Y Lodos EN ESTACION DE OYACOTO
- SE REALIZA CONTROL DE Lodos EN ESTACION OYACOTO.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000014

PROYECTO No. FECHA: 08/04/2017 DÍA: Sábado
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASE 4 FASE II y OYACOTO

CONTRATISTA: Comoros Trase - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material seco en plataforma sur-occidental / 1000 en plaza
Fase sur-occidental / Limpieza de vías de acceso (Trase IV)
- Recepción de material en escombrera OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: Comoros 1 A. Nolasco
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE RECIBE LODO Y TIERRA SECA EN PLATAFORMA SUR
Y NORTE SUPERIOR EN TRASE 4 FASE II
- OPERACION NORMAL DE RECIBO LODO EN CUBETA CONTINUA
DO.
- CONTROL DE LODO EN ESCOMBRERA OYACOTO / RECIBIDO
DE LODO Y TIERRA SECA.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000013

PROYECTO No. FECHA: 07/04/2017 DÍA: Viernes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4 FASE II y OPALOTO

CONTRATISTA: COMARSA TRASE - OPALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR / LOSOS EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL
COMPACTACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CARRETERAS CON ESCOMBROS (TRASE II)
- RECEPCIÓN DE LOSOS Y SECO EN ESCOMBRERA OPALOTO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERATIVA NORMAL EN EL 107 BIENAL DEL TRASE 4 FASE II
Y OPALOTO.


- CONTROL DE PUNOS EN EL 107 BIENAL DE OPALOTO



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000012

PROYECTO No FECHA: 06/04/2017 DÍA: Jueves

DESCRIPCIÓN: Escombreras Trase 4 Fase II y Oyacoto

CONTRATISTA: Consorcio Teusa - Oyacoto

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de lodos en plataforma sur-occidental / tierra seca en plataforma sur-occidental Limpieza de Av. Simón Bolívar
- Recepción de tierra seca y lodos en escombrera Oyacoto

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 6

AYUD. MAQ: 6

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6; Cargadoras 1; Excavadoras 3;

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:


- Recepción de lodos en plataforma sur-occidental Trase 4 Fase II
- Recepción de escombros y tierra seca en plataforma sur-occidental Trase 4 Fase II
- Limpieza de Av. Simón Bolívar y veras laterales de la Escombrera en Trase 4 Fase II
- Recepción de lodos en Escombrera # Escombrera de Oyacoto.



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000011

PROYECTO No FECHA: 03/01/2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASE Y FASE II y OYACATO

CONTRATISTA: CONSUMO TRASE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL LÍQUIDO Y SÓLIDO EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL. REFORZAMIENTO DE PLATAFORMA CON ESCOMBROS
- RECEPCIÓN DE TIERRA SECA Y LÍQUIDA EN ESCOMBROS OYACATO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: LÓPEZ Y T. NARANJO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado x Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter x Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti x Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE REALIZA EL REFORZAMIENTO DE PLATAFORMA SUR Y NORTE EN EL TROTE A FASE II CON ESCOMBROS.
- LIMPIEZA DE VÍA INTERNA DE LA ESTACION TRASE A FASE II
- DISPOSICIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN LA ESCOMBRERA DE OYACATO.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000010

PROYECTO No FECHA: 04/04/2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE Y FASE II y OYACOTO

CONTRATISTA: COMERCIO TRASE - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN MATERIAL LÓDOS Y SECOS EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL Limpieza de Vías de Acceso a ESCOMBRERA
- RECEPCIÓN FIBRA SECA LÓDOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE LÓDOS EN PLATAFORMA SUPERIOR NOROCCIDENTAL TRASE Y
- LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO Y AV. J. ITOY BORDADO con MOTONIVELADORA TRASE Y
- RECEPCIÓN DE LÓDOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERA OYACOTO PARA EL SECTOR NOROCC.

TRASE m³ NOMBRE: m³
OYACOTO m³ NOMBRE: m³



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000009

PROYECTO No. FECHA: 03/04/2017 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASE 4 FASE II y OYACUTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE-OYACUTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN DIQUE (PLATAFORMA SUR) / MOJAS EN PLATAFORMA SUR - OCCIDENTAL
LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A PLATAFORMAS Y AV. SIMÓN BOLÍVAR (TRASE 4)
- RECEPCIÓN MATERIAL MOJAS Y ESCOMBRAS EN OYACUTO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIOMEZ + 1 NOVARENS
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE RECIBE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR TRASE 4
- LIMPIEZA DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍAS INTERMEDIAS DEL TRASE 4.
- RECEPCIÓN DE MOJAS DEL DIQUE QUITO EN LA ESTACION DE OYACUTO.

TRASE DÍA: m³ VOLUTENES NOCHE: m³
OYACUTO DÍA: m³ NOCHE: m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

