

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000188

PROYECTO No. FECHA: 30-SEPT/2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE SACS, LOMAS Y ESCOMBRAS EN PUTAFERRA NORTE
- RECEPCION DE MATERIAL DE SACS Y ESCOMBRAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- ELEVACION DE MURO ENRE CUBETOS DE LOMAS PARA SUR. BATA
- FORTIFICACION DE USAS EN ESCOMBRERA EL TRAJE OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS: SCMOERS

1
1
1
1
2
2
3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Camión Cisterna: 1 ; CAMION

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepcion de material en las escombreras

EMGIRS-EP OYACOTO y El Troje.

Mejoramiento vial


Elevacion de muro perimetral de cubetos

Mitigacion de polvos.

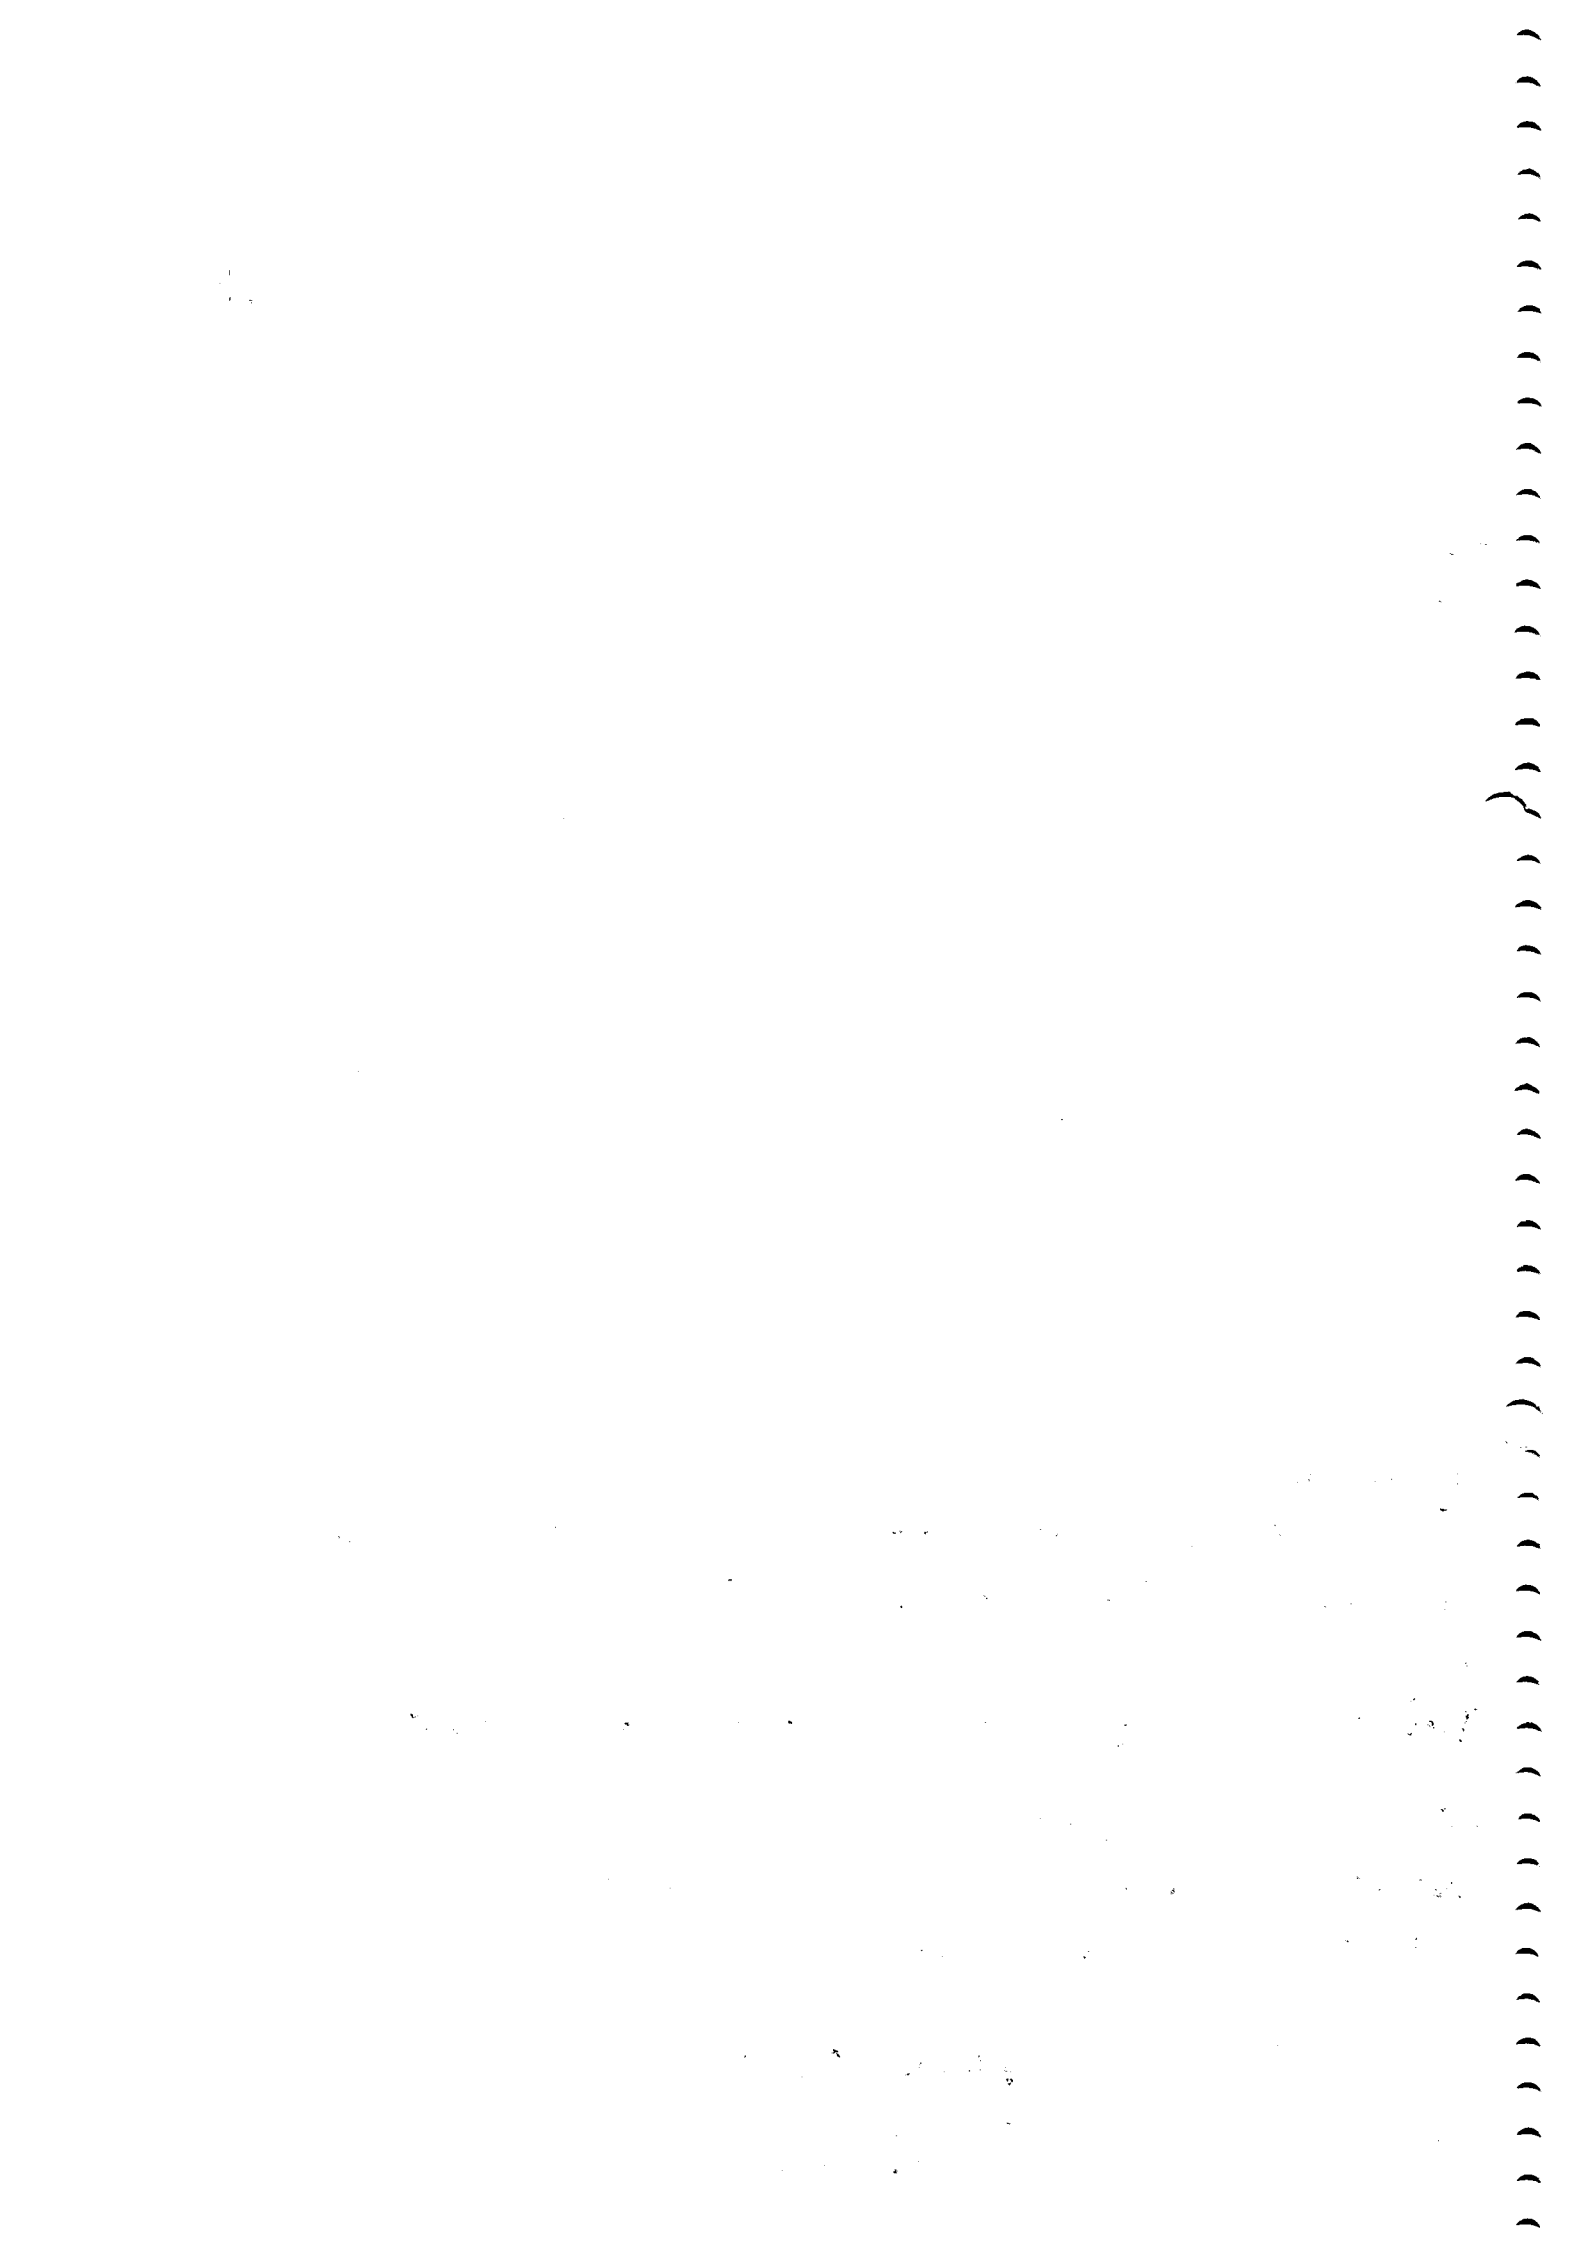
Excavacion para drenaje de cubeto.

Conformacion de zujos


Drs. FERRAN Ponce
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolas
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000187

PROYECTO No. FECHA: 29-501/2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBRA Y SEROS PLATAFORMA NORTE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRA Y SEROS EN ESCOMBRETA OYACOTO
- REPARACIÓN DE VERTEDOR EN EL TRAJE Y OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN Y COMPLETO DE VERTEDOR.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 9
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CARRO ✓
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

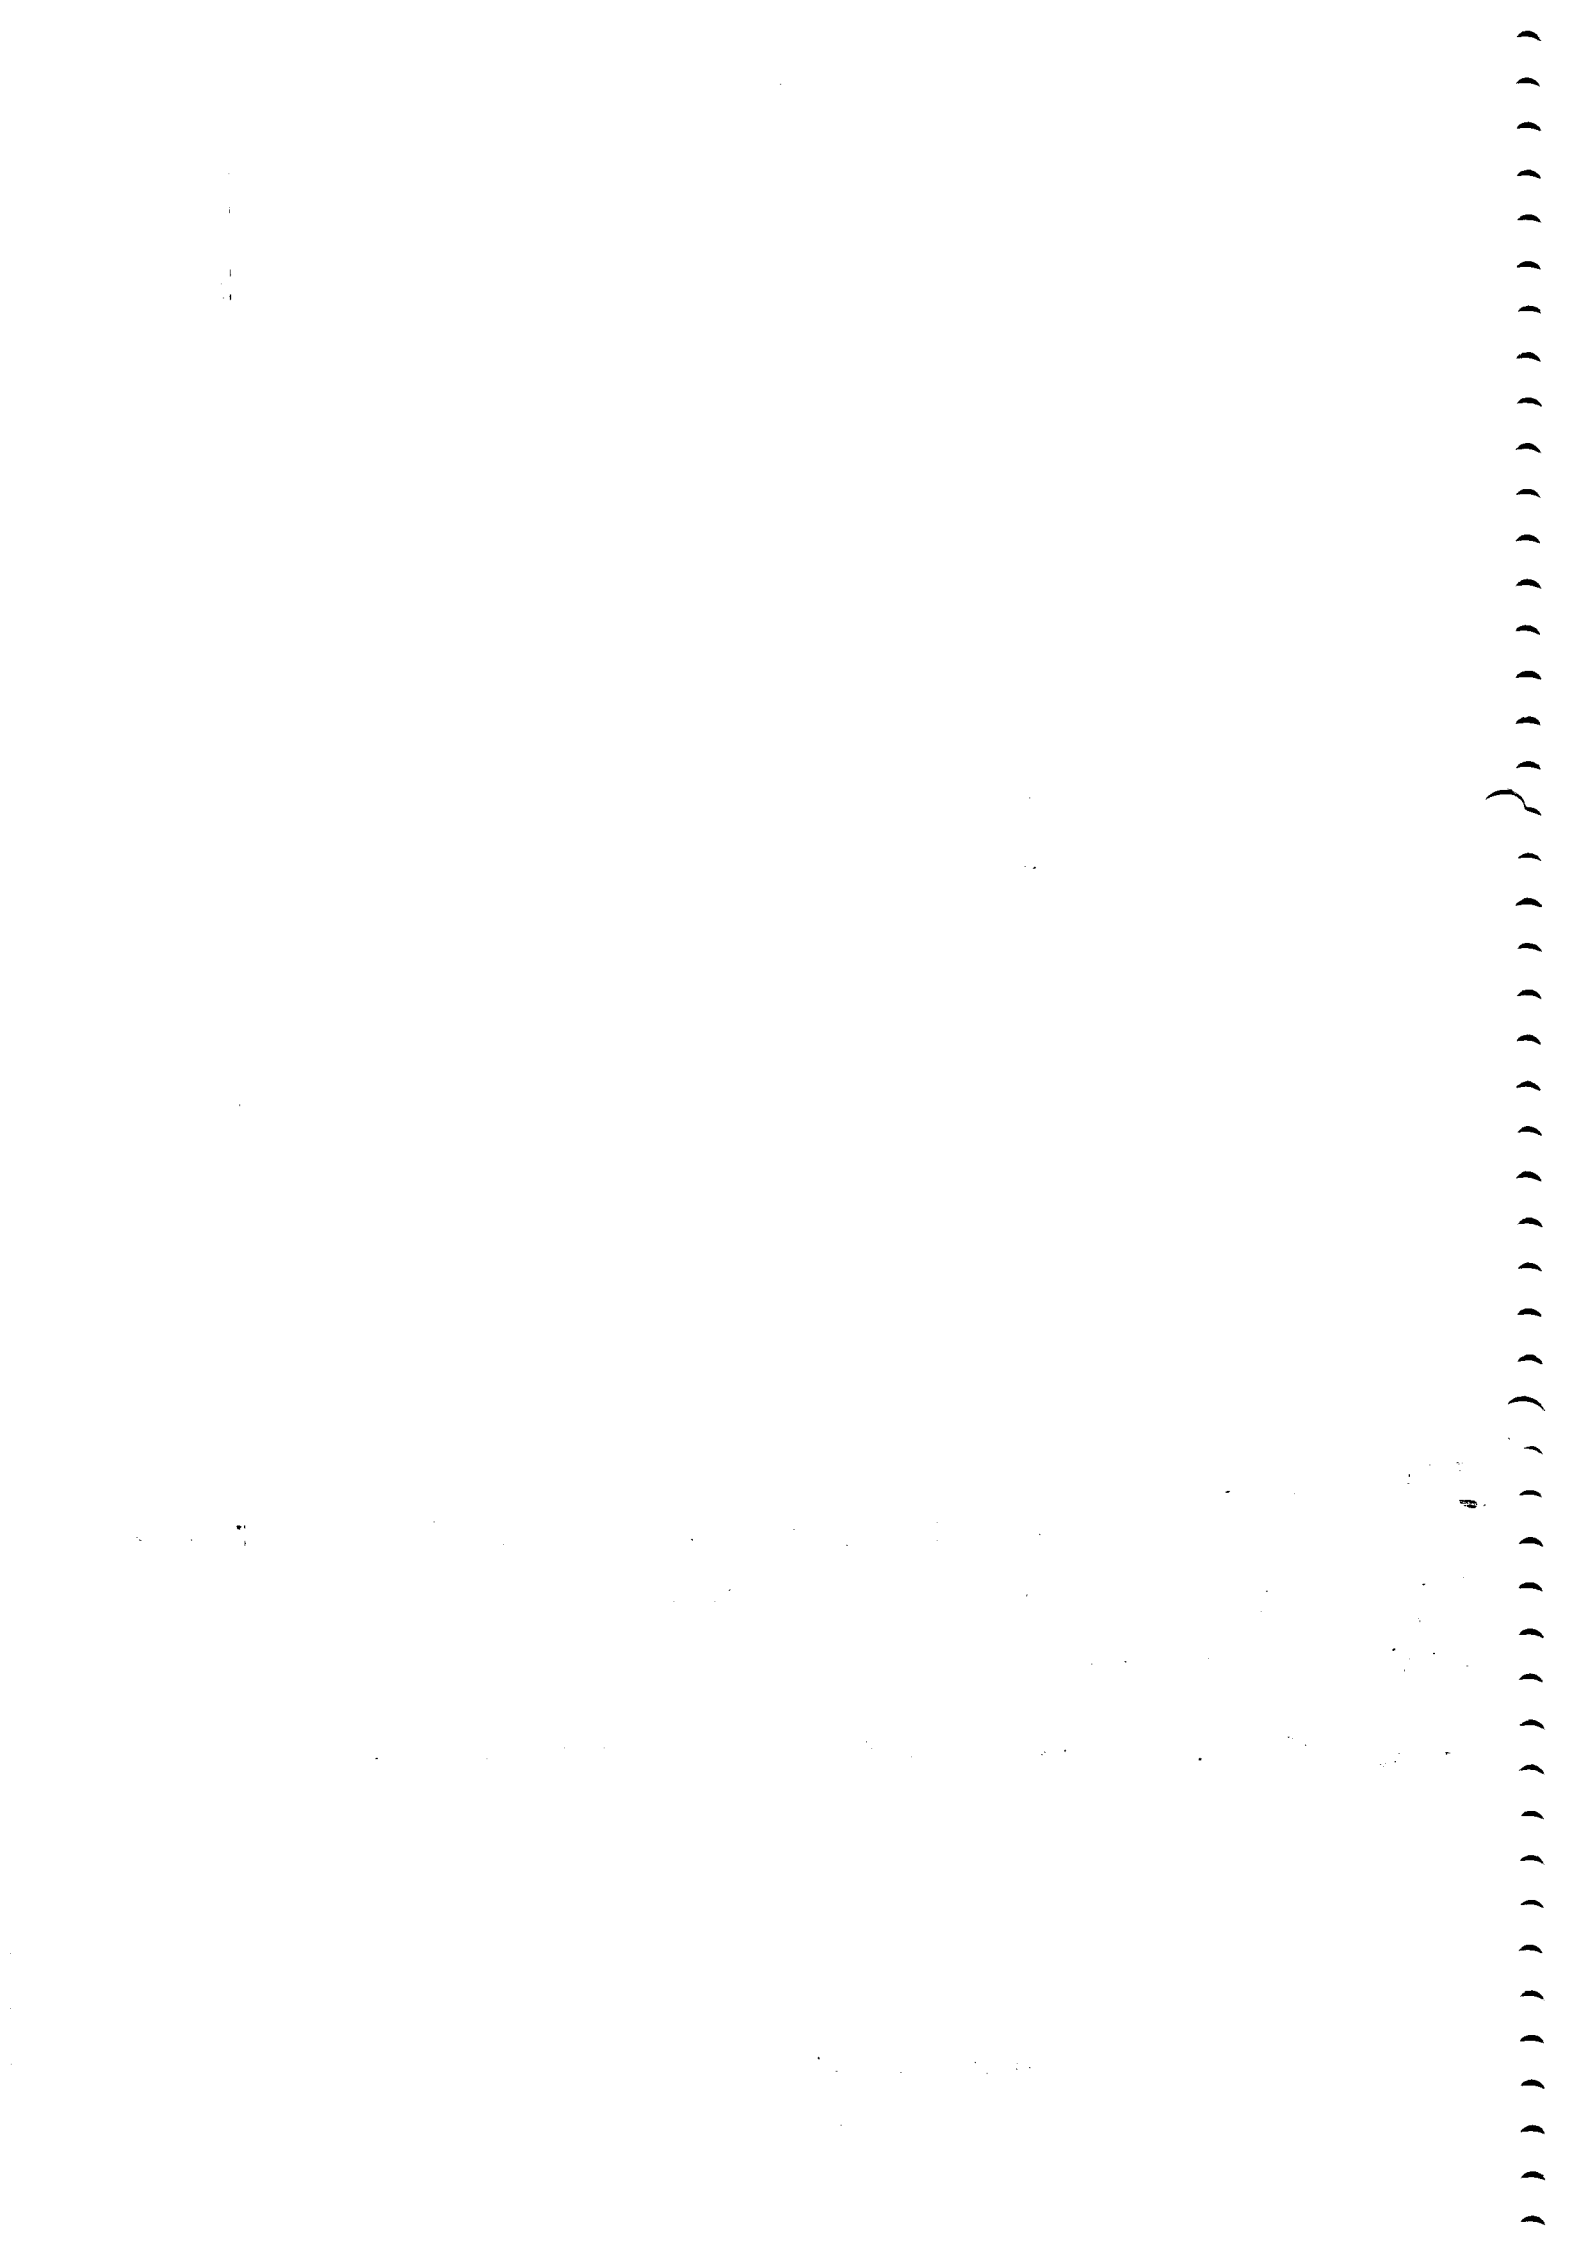
CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Recepción de material escombreras El Traje y Oyacoto.
Mejoramiento vial interno y Externo.
Mitigación de polvos.
Conformación de muro alrededor de cobeto de lodos.


ING. Fernando Rosales
CONTRATISTA


Ing. Martin Norei
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000185

PROYECTO No. FECHA 28-587/2011 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TROJE Y FASE 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: EMISURSA - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS Y SECOS PLÁSTICOS MUYE DÍA Y NOCHES
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA OYACOTO
HIDRATACIÓN DE SUELO EN ESCOMBRERA EL TROJE - OYACOTO
INSTALACIÓN Y BLOQUEO DE MURO ANTES CUBETOS DE LODOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras
Motoniveladoras 4 ; Volquetas
Rodillos lisos 4 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 4 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción en las escombreras EMISURSA-EP OYACOTO


El Troje.

Hidratación de vías de ingreso y de salida

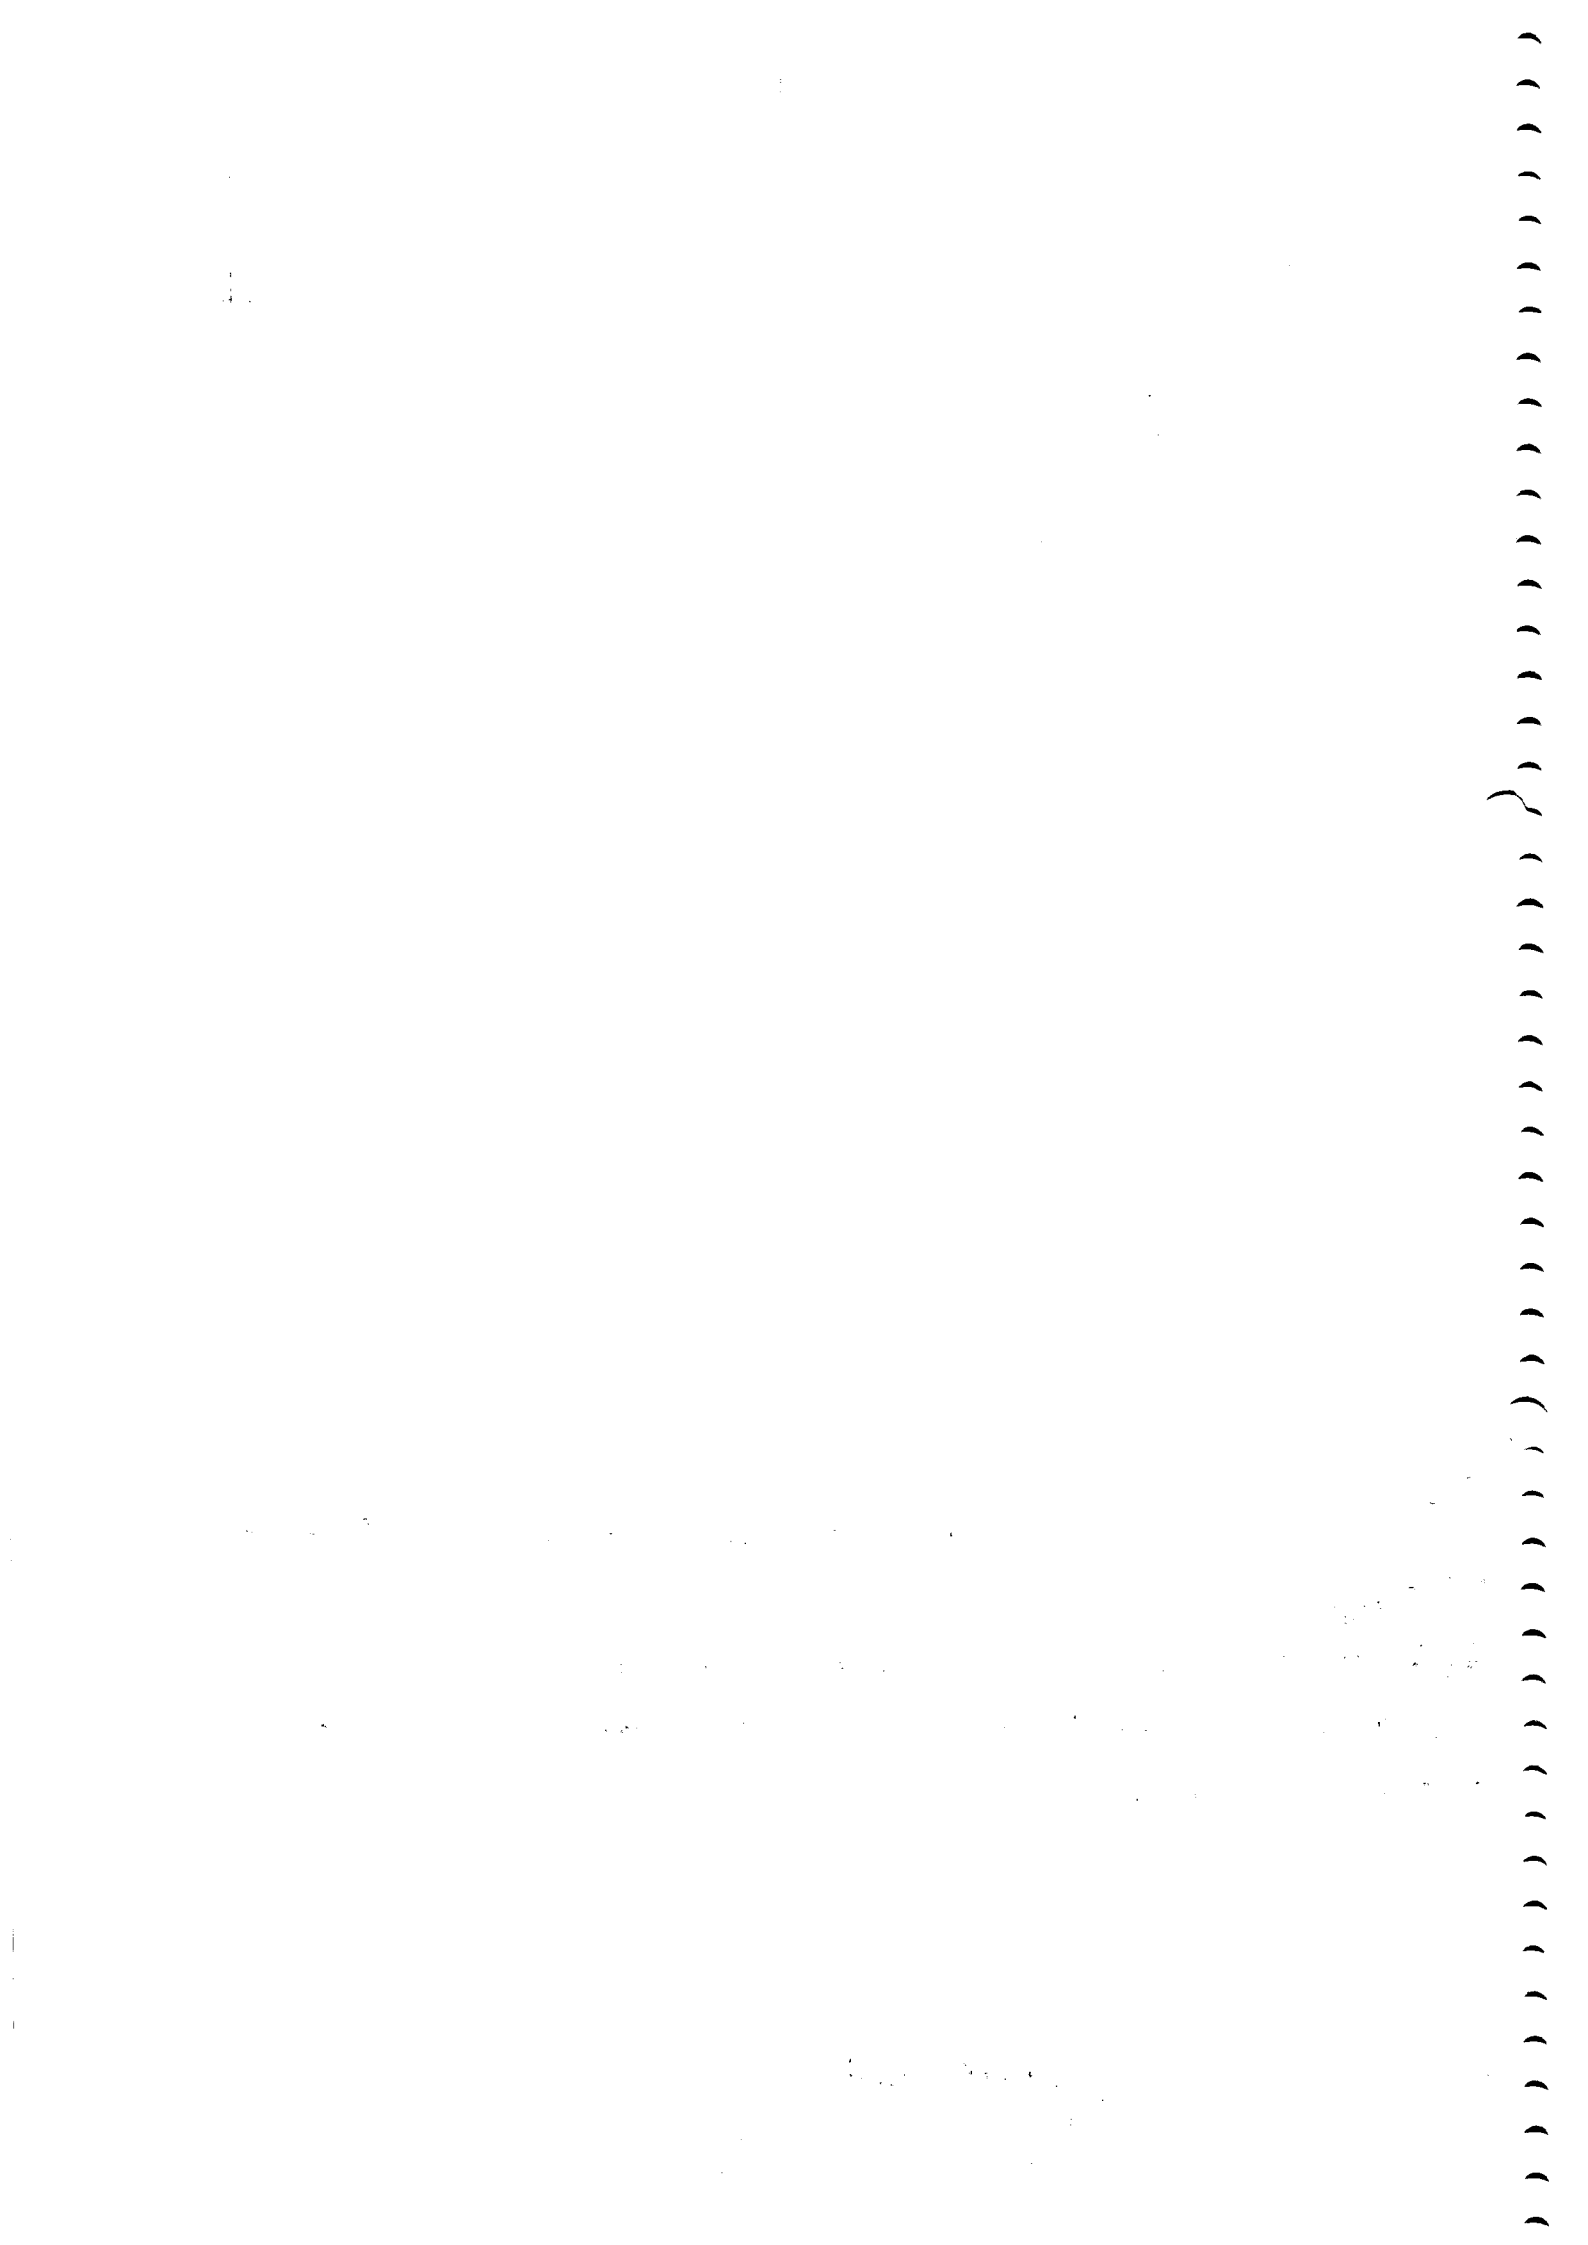
Conformación muro de contención de lodos cubeto

tendido y compactado.


Luis Fernando Escobar
CONTRATISTA


Eng. Martin Maza
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000185

PROYECTO No. FECHA: 27-SEPT/2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TRAJE Y FASE E / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO; ESCOMBRO Y SECOS PATAFRAMB NORTES
- CONSTRUCCIÓN DE BERMAS LISO NORTE
- ENTERRAMIENTO DE VEHICULOS EN ESCOMBRO EL TRAJE Y OYACOTO
- RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: OBREROS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATZAN
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de escombros, lodos y tierra escombrera de El Traje. Recepción de escombros y tierra escombrera de Cyclicado


tendido y compactado de tierras, movimiento, conformación de taludes.

Mejoramiento vial.


Ing. Fernando Rosales
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolas
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000184

PROYECTO No FECHA: 26-SEPT/2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TRUJE Y FIUSE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SACOS, ESCOMBROS Y LODOS PLATAFORMA - RECUBRIMIENTO Y SUR
- RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBROS - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VÍAS EN ESCOMBROS DE EL TRUJE Y OYACOTO
- SEA CONSTRUCCIÓN DE MURO ENTRE CUBETOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 3
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATRAV
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros en escombrera El Truje
Recepción de tierra y escombros en escombrera Oyacoto.
Hidratación de vías de acceso y vías internas.
Construcción de muro contenedor de lodos y sistema de drenaje.


Ing. Fernando Padilla
CONTRATISTA


Ing. Martin Ninos
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000183

PROYECTO No FECHA: 25 SEPT 2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREDA - EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE TIERRA, ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA NORTE / SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE TIERRA, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBREDA OYACOTO
- HERRAMIENTAS DE UNA ESCOMBREDA EL TRONC - OYACOTO
- CONSTRUCCIÓN DE BERMAS LADO NORTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 3
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros: ;
En reparación: ;
Salida de obra: ;

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción de todos, tierra y escombros, en la escombrera
El Tronco, Recepción de tierra y escombros en la escombrera
El Oyacoto.

Mitigación de polvos en vías de acceso.

Construcción de bermas en plataforma Norte, tendido y
compactado.


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


ING. MARTIN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

4.

1. 1998

2. 1999

3.

4. 2000

5. 2001

6. 2002

7. 2003



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000182

PROYECTO No. FECHA: 24-SEPT-2019 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: RECOMBRERAS - EL TRONCO Y FASE - 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: COMSAE - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
MANTENIMIENTO
RECONFORMACION Y ASOCIACION DE PLATAFORMAS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIA 3

EQUIPO:
Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: ;
En reparación: ;
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Mejoramiento vial, reconformación de vías.
Mantenimiento de maquinaria.
Limpieza y recolección de basura.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000181

PROYECTO No. FECHA: 23-SEPT-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONTRATISTA - CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE OBRAS, ESCOMBROS Y SECOS PUTRESCIBLES NOROCCIDENTAL
- RECEPCION DE MATERIAL DE OBRAS, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERAS - OYACOTO
- ELIMINACION DE OBRAS ESCOMBRERAS - EL TROJE - OYACOTO
- CONSTRUCCION DE BERMAS: UNO MULTIPLO PARALELO A LA VÍA SECCION PUEBLA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 3

EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATRAN:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP escombreras
Oyacoto y El Troje.


Mejoramiento vía

Mitigación de polvos en vías internas y de ingreso
Conformación de bermas, fendido y compactado.

ING. FERNANDO ROSARIO
CONTRATISTA

ING. MARTIN NUNEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000180

PROYECTO No. FECHA: 22-SEPT-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LUGAR; ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA NOROCCIDENTAL 7500
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LUGAR; ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VÍAS ESCOMBRERA - EL TROJE - OYACOTO
- RECONFORMACIÓN DE VÍAS INTERNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1; CAMION; CAMIONES
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte ✓
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Disposición final en escombreras El Troje y Oyacoto:

- Operación normal en ambas escombreras
- Hidratación de vías internas
- Reconformación de vías internas
- Mejoramiento de plataformas de disposición


ING. FERNANDO ESCOBAR
CONTRATISTA


Ing. Martin Nieto
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000179

PROYECTO No FECHA: 21-SEPT/2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA, ESCOMBROS Y SECOS DUTARANDA NORTE Y SUR
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA - OYACOTO
MANTENCIÓN DE VÍAS ESCOMBRERA EL TRAJE - OYACOTO
SISTEMA DE PLATAFORMAS
RECONFORMACIÓN DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción y operación normal escombreras Oyacoto
y El Traje.


Mejoramiento de vías internas.

Conformación de plataformas de disposición final.


Ing. FERNANDO PARASCUEL
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000178

PROYECTO No. FECHA: 20-SEPT/2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECS ESCOMBRERA EL TRUJE Y OYACOTO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECS ESCOMBRERA OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VIALS ESCOMBROS EL TRUJE Y OYACOTO
- RECONFORMACIÓN DE VIALS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: SUJOS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de material (lodos, tierra y escombros) en
escombrera El Truje. Recepción lodos, tierra y escombros en
escombrera Oyacoto.


Mitigación de polvos en ambas escombreras.

Mejoramiento vial.

CONTRATISTA

FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000177

PROYECTO No. FECHA: 17-06-2017 DÍA: MARTES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJO Y FASE II - OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJO - OYALOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS RECURSOS SECOS EN PLAZA NORTE Y SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS RECURSOS SECOS EN ESCOMBRERA OYALOTO
- HIDRATACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS - EL TRUJO - OYALOTO
- RECONFORMACIÓN DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ.: 3

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: EUNOR 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras

Motoniveladoras

Rodillos lisos 1; Neumáticos

Camión Cisterna: 1; CAMION

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

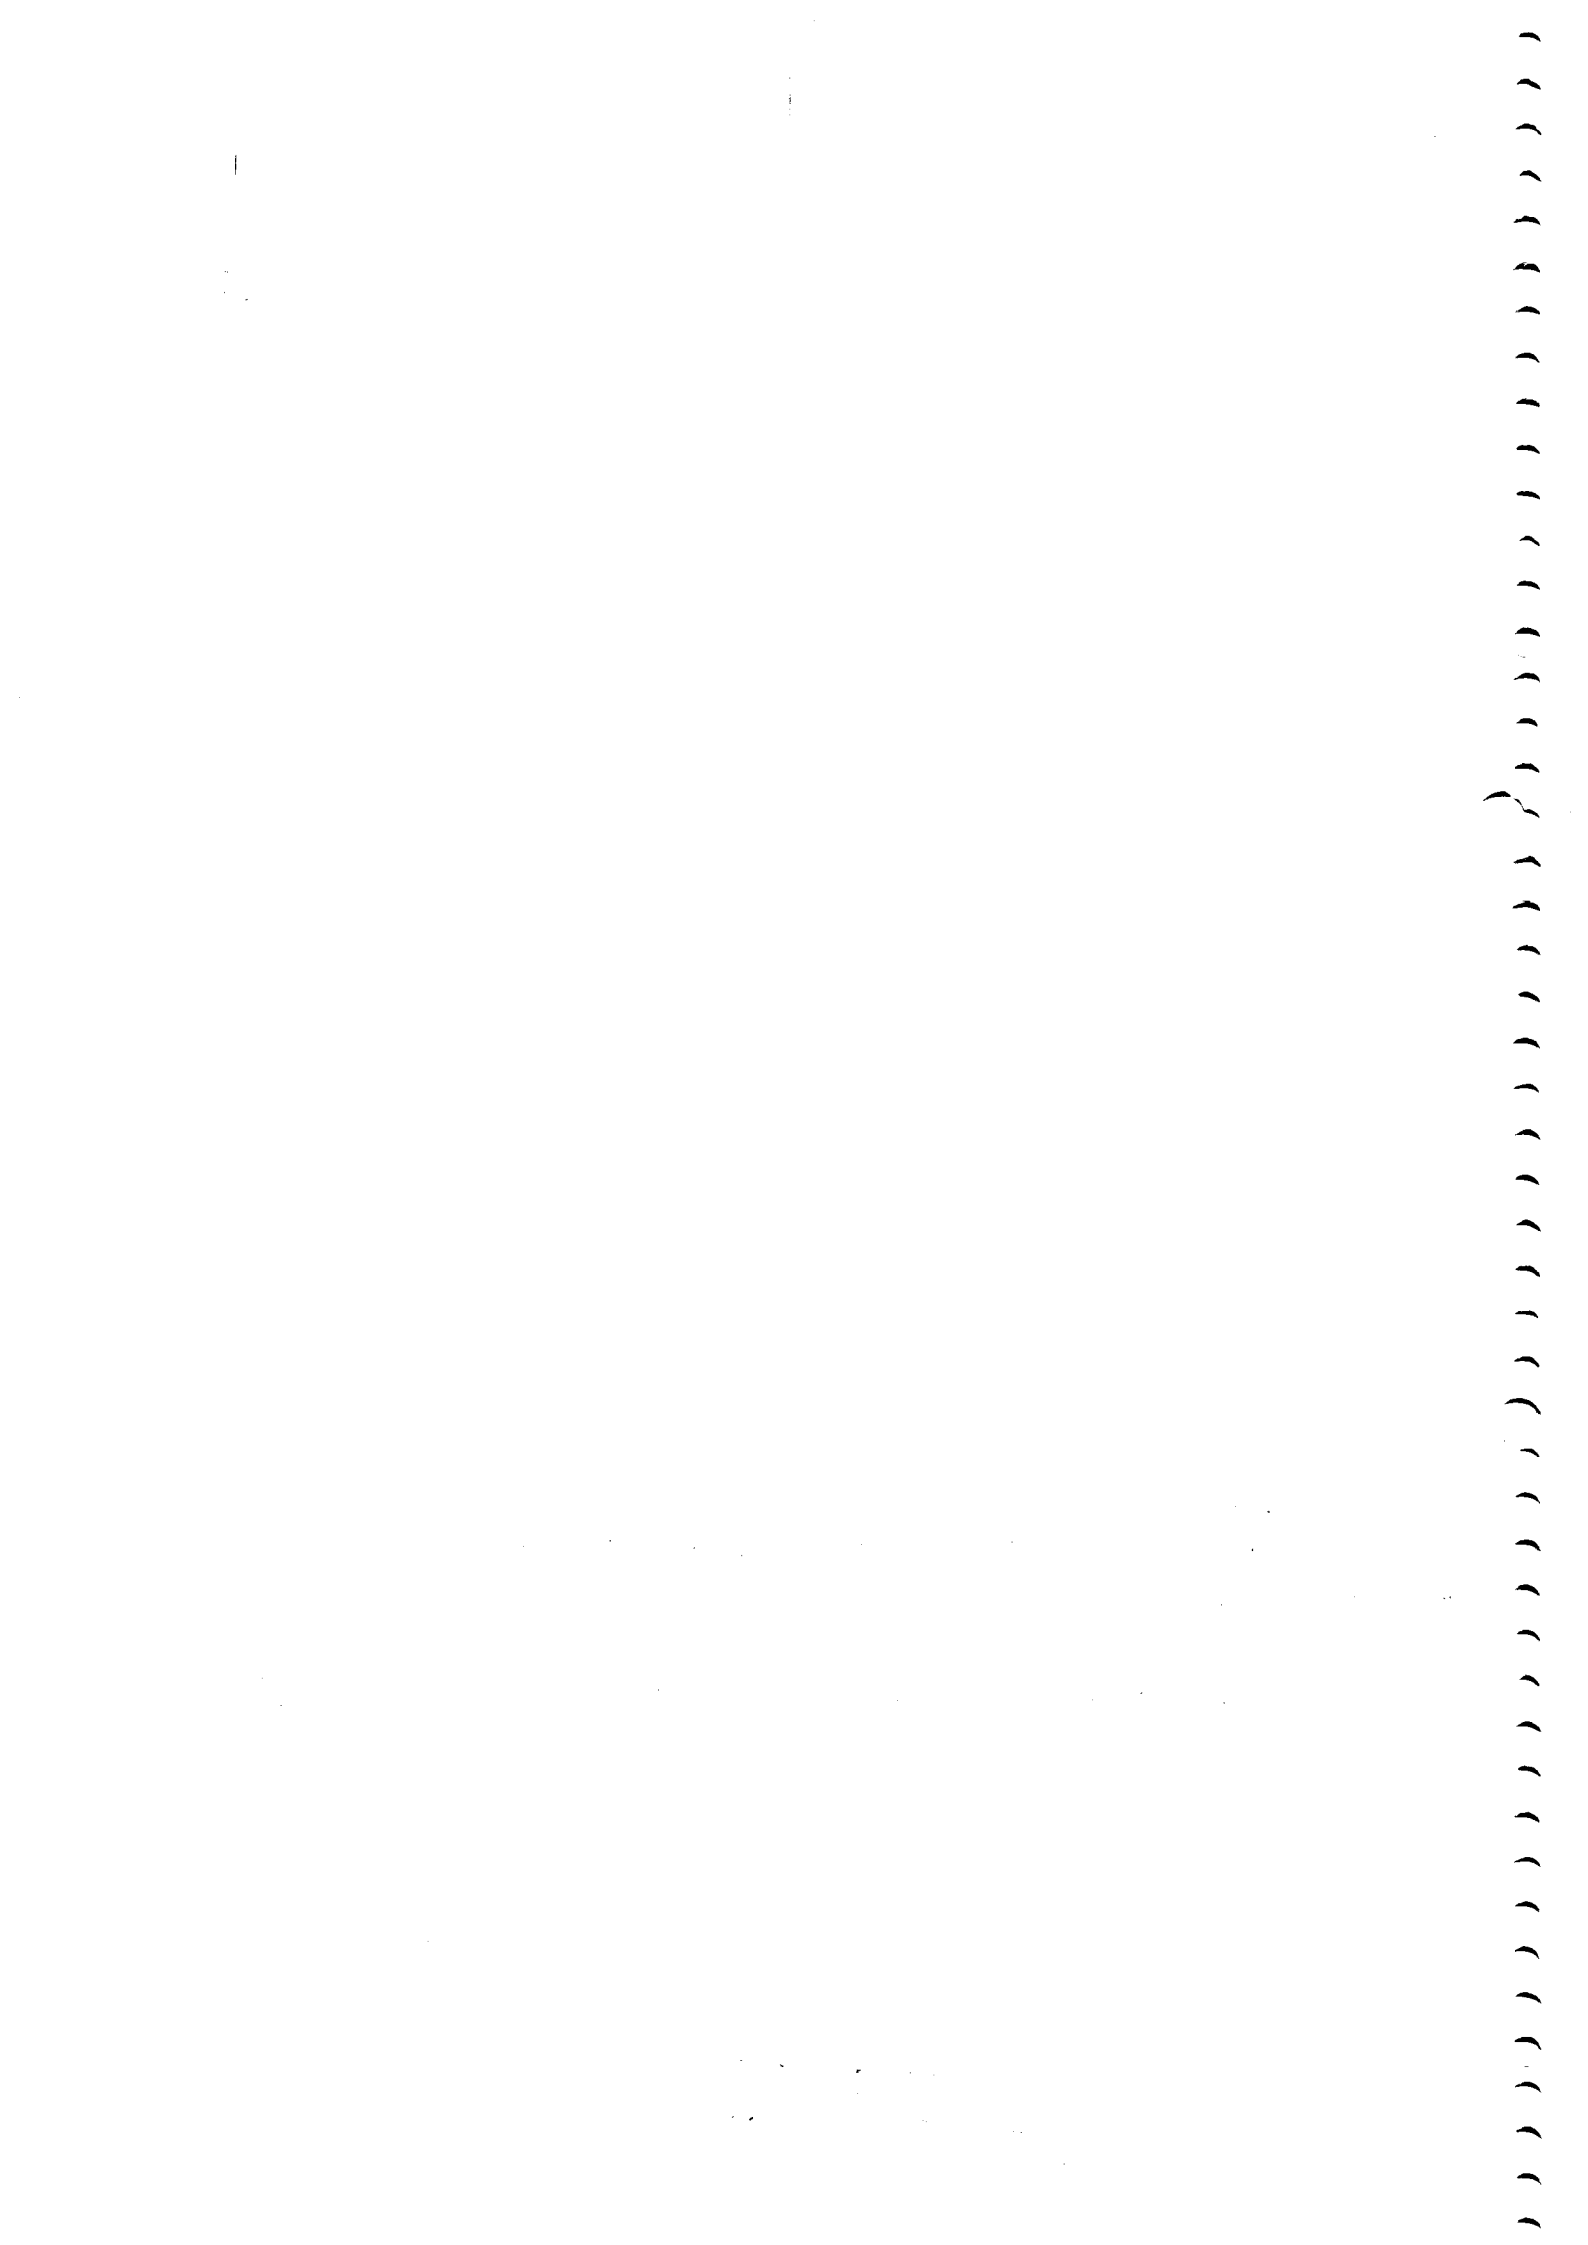
CONTRATO: Recepción de escombros, lodo y tierra normal en las escombreras EMGIRS - EP

Operación normal, hidratación vial y mejoramiento


ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


ING. MARTÍN NÁJERA
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000176

PROYECTO No FECHA: 18-SEPT-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RESECCION DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBROS Y SECCION PARA FASE II OYACOTO
RESECCION DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBROS Y SECCION ESCOMBRO - OYACOTO
RESECCION DE LOSA EN ESCOMBROS - OYACOTO
RESECCION DE LOSA
ARREGLO DE PUERTAS EN CUBETA DE LOSA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIA 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; RETRANSMISOR; ANTENA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Confirmación de muro al rededor de cubeta
de losa escombrera el Troje, tendido y compactado
de material para construcción de bermas.
Mejoramiento vial Oyacoto.

ING. FERNANDO BARRERA
CONTRATISTA

Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000175

PROYECTO No. FECHA: 17-SEP-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TUNDO 4 FASE II / OYUNCO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TUNDO - OYUNCO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RESERVA DE USAS Y PLATAFORMAS
MANTENIMIENTO DE ESTADOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 6

AYUD. MAQ.: 6

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 2

OTROS: GUARDIA 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras ; Excavadoras ;

Motoniveladoras ; Volquetas

Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna 1 ;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado 4 Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

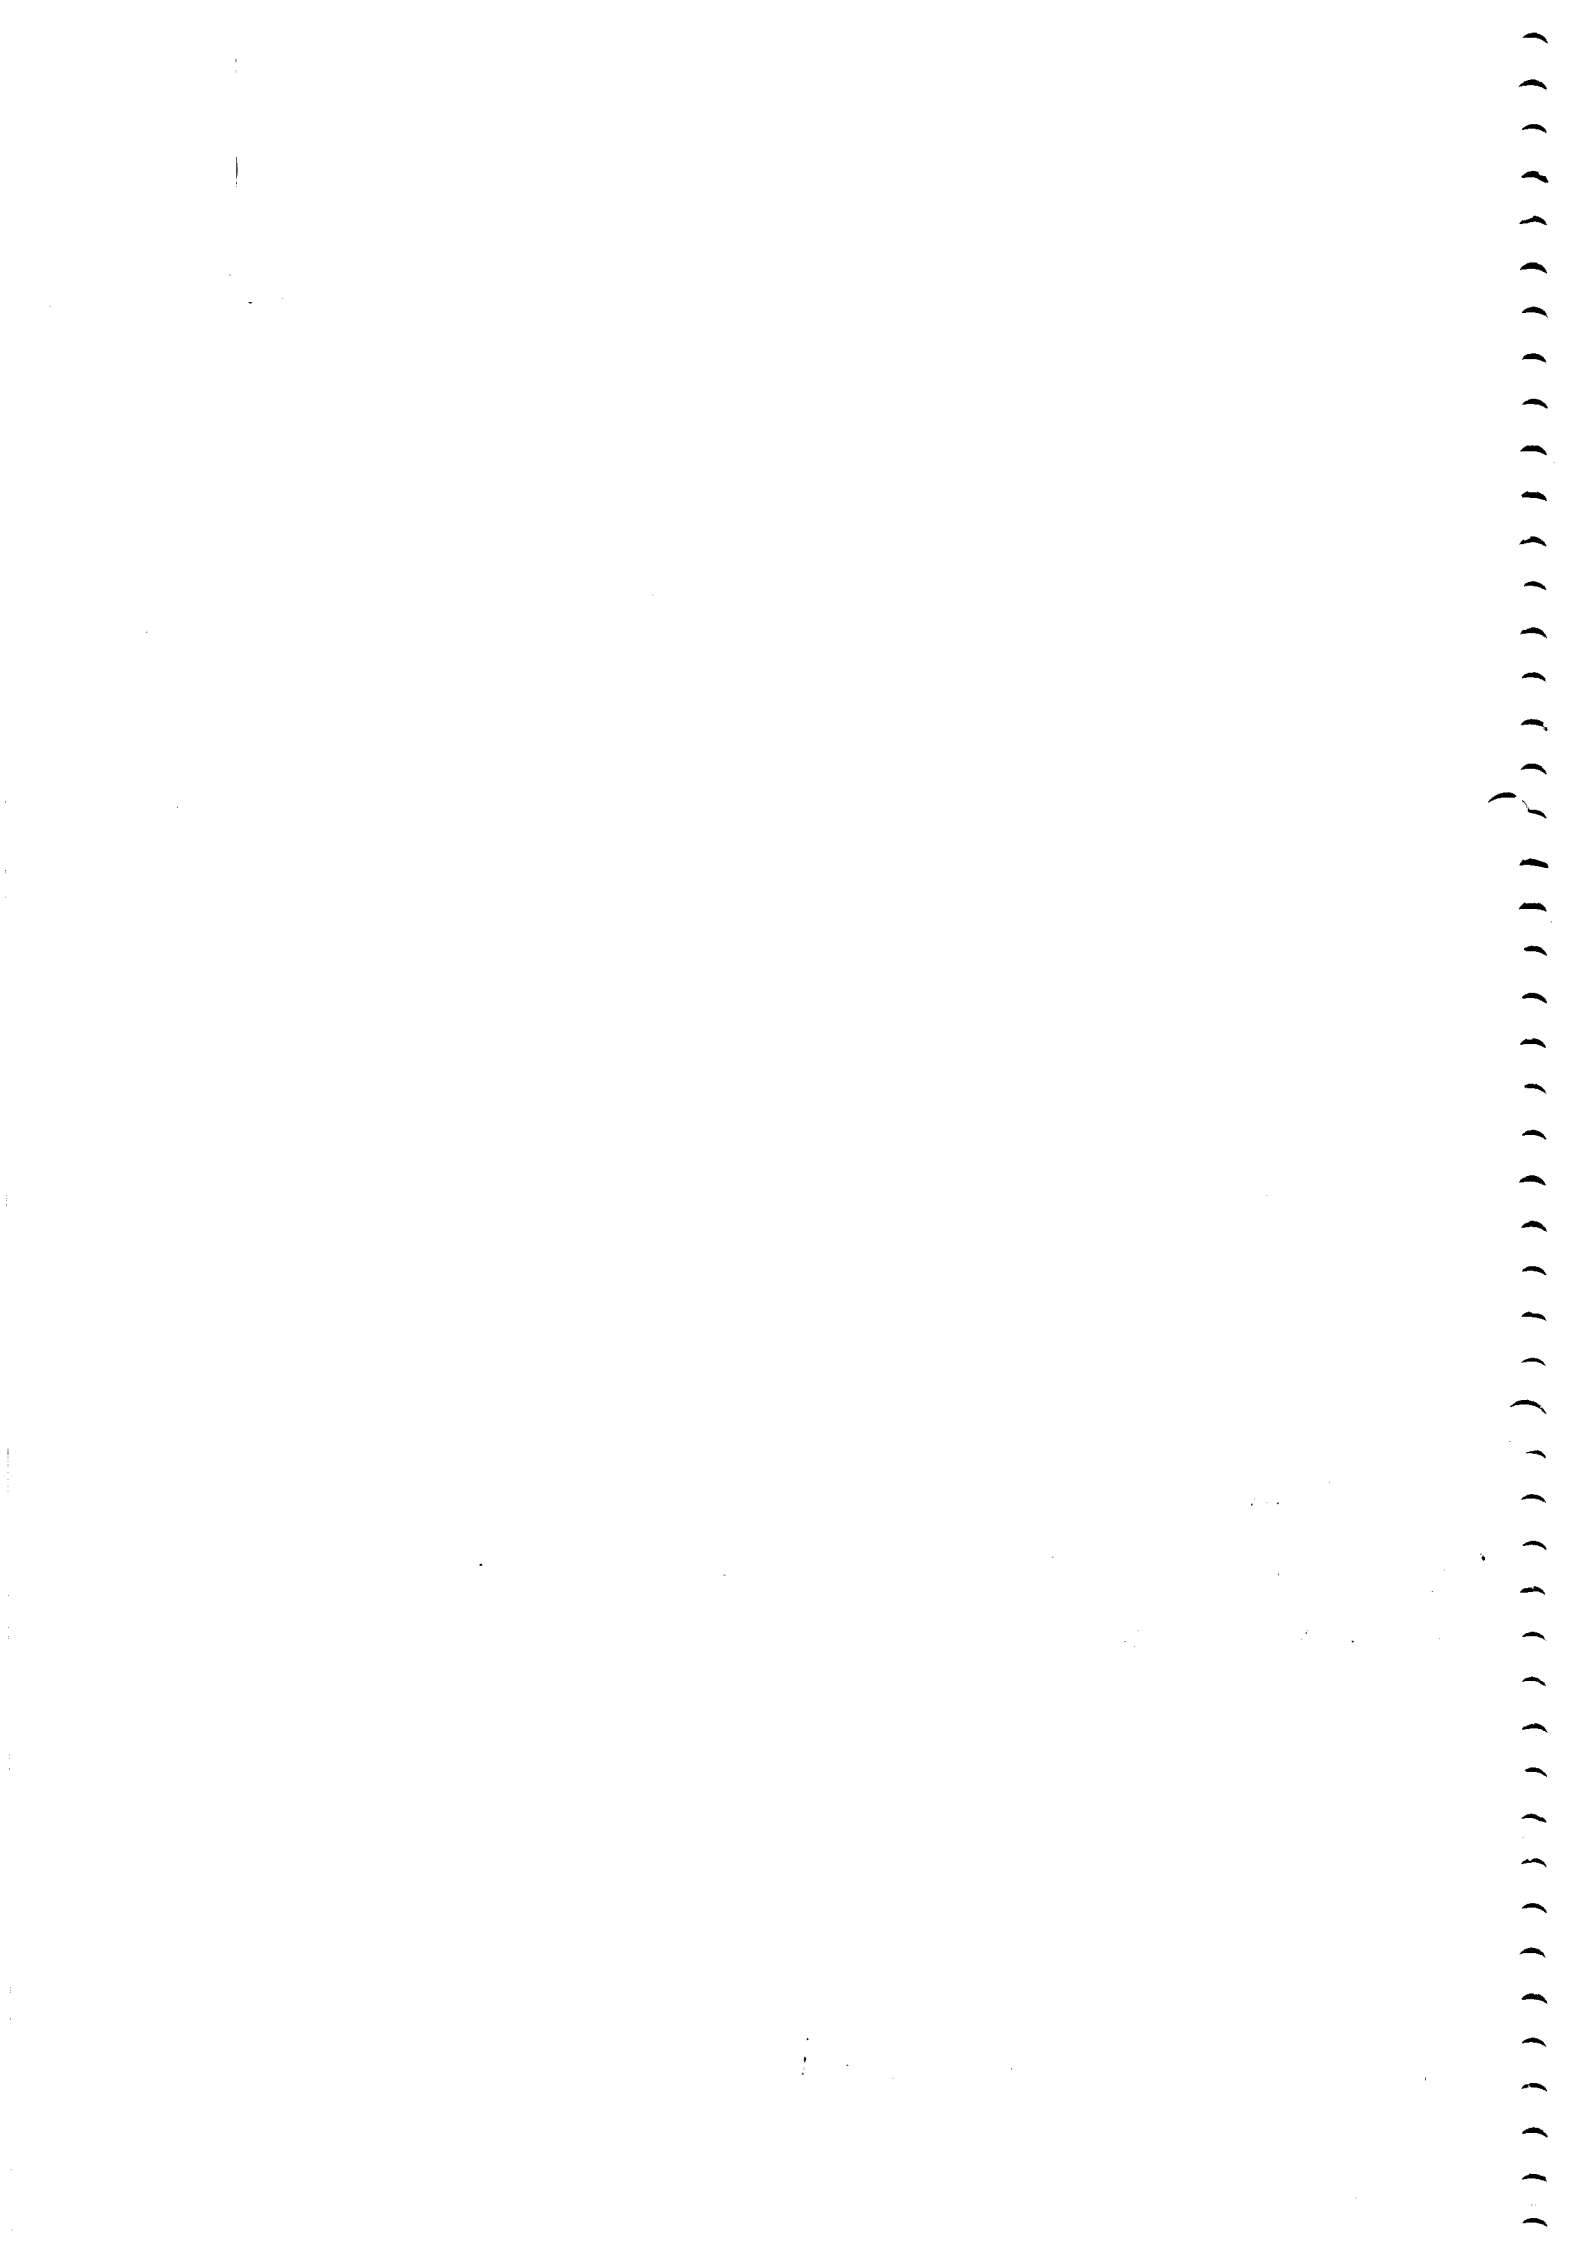
FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

Mejoramiento vial, limpieza de cunetas y plataformas
Mantenimiento de maquinaria.


ING. FERNANDO VELASCO
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000174

PROYECTO No: FECHA: 16-08-2017 DÍA: SAGUO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SERVICIO PLATAFORMA VIAL Y SUIL
- OPERACIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SERVICIO ESCOMBRERA OYACOTO
- MITIGACIÓN DE LOS ESCOMBROS OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN DE VIALS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 5

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; PLATAFORMA VIAL; OYACOTO
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros escombrera el Traje.


Recepción escombros y tierra escombrera OYACOTO.

Operación normal en ambas escombreras


Mitigación de polvos

Mejoramiento plataformas viales


JOSÉ FERNANDO RIVERA
CONTRATISTA


Eduardo Martín López
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000173

PROYECTO No. FECHA: 13-SEPT-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LADRILLOS, ESCOMBROS Y SECOS EN PUERTAS DE EL TRUJE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LADRILLOS, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBREO - OYACOTO
RECONSTRUCCION DE OBRAS:
HIDRANTACION DE OBRAS EN ESCOMBREOS Y OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 3
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1; RETROEXCAVADOR / CATAPULTA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción de escombros, lodos y tierra escombren
El Truje.

Recepción de escombros y tierra en escombros Oyacoto
operación normal.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000172

PROYECTO No. FECHA: 14-SEPT/2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FISO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SUELOS EN PLANTACIÓN NOROCCIDENTAL DE LA NOCHE
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SUELOS EN ESCOMBRERA OYACOTO
REDUCCION DE USOS ESCOMBRERA EL TRAJE Y OYACOTO
CONSTRUCCION DE MURAS EXTERIORES EN CUBIERTA DE LOSAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; PERSONAL MAQ. CAPACITADO
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

Fiscalizador
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Recepción de bdos, tierra y escombros en la
escombrera El Traje.
Recepción de escombros y tierra en escombrero de Oyacoto
operación normal


PABLO FERNANDO ROSALES
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000171

PROYECTO No. FECHA: 13-SEP-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SACS PLASTICA ROJOS / SUR
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SACS ESCOMBROS - OYACOTO
MEJORA DE VÍAS EN ESCOMBROS EL TRONJE / OYACOTO
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 30
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 7 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; BOTAS EXCAVADORAS ; CAÑON
Otros:


CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	✓				
TARDE:	✓				
NOCHE:	✓				

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

Fiscalizador
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Recepción de material (escombros, tierra y lodos) escombre-
ras EMGIRS-EP (OYACOTO Y EL TRONJE).
Operación normal en ambas escombreras.
Mitigación de polvos en ambas escombreras.
Mejoramiento vial en las escombreras.


ING. FERRER, IMPERIAL
CONTRATISTA


ING. MARTIN NUÑEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000170

PROYECTO No. FECHA: 12-SEPT-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE Y EL TUNJE / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ESCOMBRERAS - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA NORTE Y SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBROS Y SACOS EN ESCOMBRERA OYACOTO
- MANTENIMIENTO DE OBRAS ESCOMBRERAS EL TRUJE Y OYACOTO
- COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASE BA OBRAS PLATAFORMA / PLATAFORMAS

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1 ; Volquetas
TOPÓGRAFOS: 1	Rodillos lisos 1 ; Neumáticos
OPERADORES: 13	Pata de cabra 1
AYUD. MAQ.: 2	Camión Cisterna: 1 ;
CHOFERES: 2	Otros:
MECÁNICOS: 2	En reparación:
OTROS: GUARDIAS 3	Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	✓				
TARDE:	✓				
NOCHE:	✓				


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

Fiscalizador
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición de escombros, tierra y lodos en escombreras
EMGIRS-EP, operación normal 24hrs escombrera El Truje
en Oyacoto 10hrs operativa la escombrera.
Mitigación de polvos en ambas escombreras
Colocación de subbase dentro de la escombrera El Truje
Mejoramiento de las plataformas Norte y Sur.


Francisco Kuevas
CONTRATISTA


Eng. Martin Nuñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. _____

LIBRO DE OBRA

000000169

PROYECTO No. _____ FECHA: 11-SEP-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II (OBRAS)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OBRAS
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS: Lodos y Secos PLANTILLA HUAYTA Y S...
- ELIMINACIÓN DE VERTEDORAS EL TROJE Y OBRAS
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS: Lodos y Secos ESCOMBRERA - OBRAS
- COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASIS VÍA DE ACCESO PRINCIPAL

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 3 (S. M. P. L. E. A.)

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras _____;
Motoniveladoras 1; Volquetas _____;
Rodillos lisos 1; Neumáticos _____; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; RESTAURACIONES; CANTON
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter. _____	Lluvia deb. conti. _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter. _____	Lluvia deb. conti. _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter. _____	Lluvia deb. conti. _____	Lluvia fuerte _____


OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

Fiscalizador
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Recepción de lodos, escombros y tierra escombreras
EMGIRS-EP, operación normal, mitigación de lodos
- Mejoramiento vial escombrera El Troje.


INÉS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


Eugenio MARTÍN MORA
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000168

PROYECTO No. FECHA: 15-SEPT-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS Y FIBRO II Y OYUNTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJO-DYNACTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS Y PLATAFORMAS, LUBRIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS: 2

OPERADORES: 6

AYUD. MAQ.: 2

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: SURTIDOS 3

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado .. Nublado .. Lluvia deb. inter .. Lluvia deb. conti .. Lluvia fuerte ..

TARDE: Despejado .. Nublado .. Lluvia deb. inter .. Lluvia deb. conti .. Lluvia fuerte ..

NOCHE: Despejado .. Nublado .. Lluvia deb. inter .. Lluvia deb. conti .. Lluvia fuerte ..

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


Fiscalizador:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Reconformación de vías, limpieza y mejoramiento de plataformas


ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


ING. MARTÍN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000167

PROYECTO No. FECHA: 7-2007-2007 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA DE TUNJO Y FASE 3 Y 4 OYACOTA

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TUNJO-OYACOTA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES: ESCOMBROS Y RESIDUOS, PLATAFORMA SUR ALTA Y NORTE
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DE OBRAS: ESCOMBROS Y RESIDUOS ESCOMBRERA OYACOTA
FUNDACIONES DE UNA ESCOMBRA OYACOTA - Y B. TUNJO
FUNDACION DE MATERIALES DE SUB-BASE UNA PLATAFORMA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 4; Excavadoras
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1; RECOLECTORAS; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de contrato. Continúan trabajos de mejoramiento vial dentro de la escombrera, colocación de sub-base preparativos para época invernal.


Disposición en plataforma sur alta y norte de escombros y botes. Tierra seca se dispone en la vía del colector con el fin de tomar altura de disposición.

Disposición final escombros de OYACOTA al pie de quebrada disposición por volteo.


ING. FERNANDO LOZANO
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolas
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000166

PROYECTO No.

FECHA: 8-SEPT-2017

DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRUJE Y FISA II - QUITO

CONTRATISTA: CONSORTIO - EL TRUJE - QUITO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OBRA, ESCOMBROS Y SIEGAS PUNTUALES, NORTE Y SUR ALTA
- RECEPCIÓN
SE COCINA MATERIAL DE SUB-BASE DE UNA PAVIMENTACIÓN SOBRE PAVIMENTACIÓN Y COLECCIÓN
HIZO UNO DE VES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras

Motoniveladoras; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Mejoramiento vial, colocación de
Piedra cocola a lo largo de las vías de acceso (paralela a
la Av Simón Bolívar) Disposición en la plataforma sur alta y
norte de escombros y lodas, tierra en plataforma sobre el
colector

Trabajos regulares escombrera Oyacoto, disposición por sitio.
Mitigación de polvo uso de tanquero escombrera El Truje Oyacoto


J. FERNANDO BAEZ
CONTRATISTA


Ing. Martín Méndez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000165

PROYECTO No. FECHA: 7-SEPT-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJO Y FINO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SECCIONES PARTICIPANTES EN LA OYACOTO Y FINO II
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ESCOMBRERAS, SECCIONES Y LÍNEAS ESCOMBRERAS - OYACOTO
MANTENIMIENTO DE VÍAS
ARREGLO DE VÍAS EN MANEJO DE CUBIERTOS DE LOSA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: 5 (FERRER) 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADORA; C.M. OY
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición final de escombro y
todos en la plataforma Maite y Sur alta. Disposición de
tierra en la vía del colector.
Recolección y limpieza de basura dentro de la escombrera El Trujo
Disposición de todos, tierra y escombro en la quipada
dentro de la escombrera de Oyacoto.
Mitigación de polvo en las dos escombreras


ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000164

PROYECTO No. FECHA: 6-SEPTIEMBRE/2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TUJO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS PREFABRICADOS 5012 ASES Y HORMIGÓN
- HERRAMIENTAS DE USO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBROS - OYACOTO
- CONSTRUCCIÓN DE HUMP Y BERTAS EN CUBIERTO DE LOS COS.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: EMBAZAS 3


EQUIPO:
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; RESTO EXCAVADORA 1 UM. 22
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Recepción de lotes, escombros plataforma norte y sur Alta, Disposición de tierra seca en la zona del colector para coger nivel a la altura de pozos de revisión del colector. Escombrera El Tujo
Escombrera Oyacoto mitigación de polvo resuspendido al en el acceso a la escombrera disposición por gravedad dentro la quebrada.


I. S. FERRERO P. RIVERA
CONTRATISTA


Ing. Martin Nieves
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000163

PROYECTO No. FECHA: 5-SEPT-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TREJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TREJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS PUNTA SUR ALTA Y NOROCCIDENTALES DE OYACOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBRERA OYACOTO
CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BERMAS EN COBERTO DE LOS DOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; RETROCAMION; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Disposición de material (escombras, tierra y los dos) plataforma sur alta y baja. Tierra seca en la vía del colector. Confirmación de bermas relación H: 1,5 y V: 1m escombrera El Treje.


Escombrera de Oyacoto mejoramiento vial disposición en quebrada tendido de material

Mitigación de polvo en las dos escombreras

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ING. MARTÍN JIMÉNEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000162

PROYECTO No. FECHA: 4-SEPT-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TIGRE Y FIEB D / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TIGRE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS - Lodos y secos PUTREFACTOS SUR VÍA ATE
HORIZONTAL DE VENTAS
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS - Lodos y secos ESCOMBRELA OYACOTO
CONSTRUCCION DE MURO Y BERMILL EN APLICACION DE CUBETO DE Lodos

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA, CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición final de lodos en la
plataforma Norte y descarga de tierra y escombros en la vía del
colector para conformar la plataforma escombrera El Tigre. (diurna
y nocturna la operación).


Escombrera de Oyacoto disposición final de tierra, escombros y lodos
por volteo.

Mitigación de polvo en las dos escombreras


Cobertura de sarán (telas de color verde) protección

Operación de tractores dentro del cubeto, movimiento de tierras


Ing. Eusebio Paredi
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000161

PROYECTO No. FECHA: 3- SEPT -2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE 4 FASES II Y OLANCO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OLANCO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE VASOS Y PLATAFORMAS
MEJORAMIENTO DE BARRIOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1; RETROCAMIÓN C.M. 2M
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Trabajos de mantenimiento escombrera
El Troje, mejoramiento de vías de acceso, limpieza de basura
Confirmación de vías hacia las plataformas


Mitigación de polvo, uso de fanguero de agua.

Colocación de sardín (telar color verde) a lo largo de la


Av. Simón Bolívar sobre sardín colocado.

Colocación tubaría de descarga de aguas paso vía de cuneta


ING. FERNANDO PÉREZ
CONTRATISTA


Eng. Martín Nixer
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000160

PROYECTO No. FECHA: 2 SEPT 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREDA EL TROTE 4 FASE U Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBRES PLATAFORMA SUR BATA Y HORA
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBRES EN OYACOTO
HIDRATACION DE VIAS
CONSERVACION DE MURO Y BARRA EN CUBIERTO DE Lodos

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA ; CAJON
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

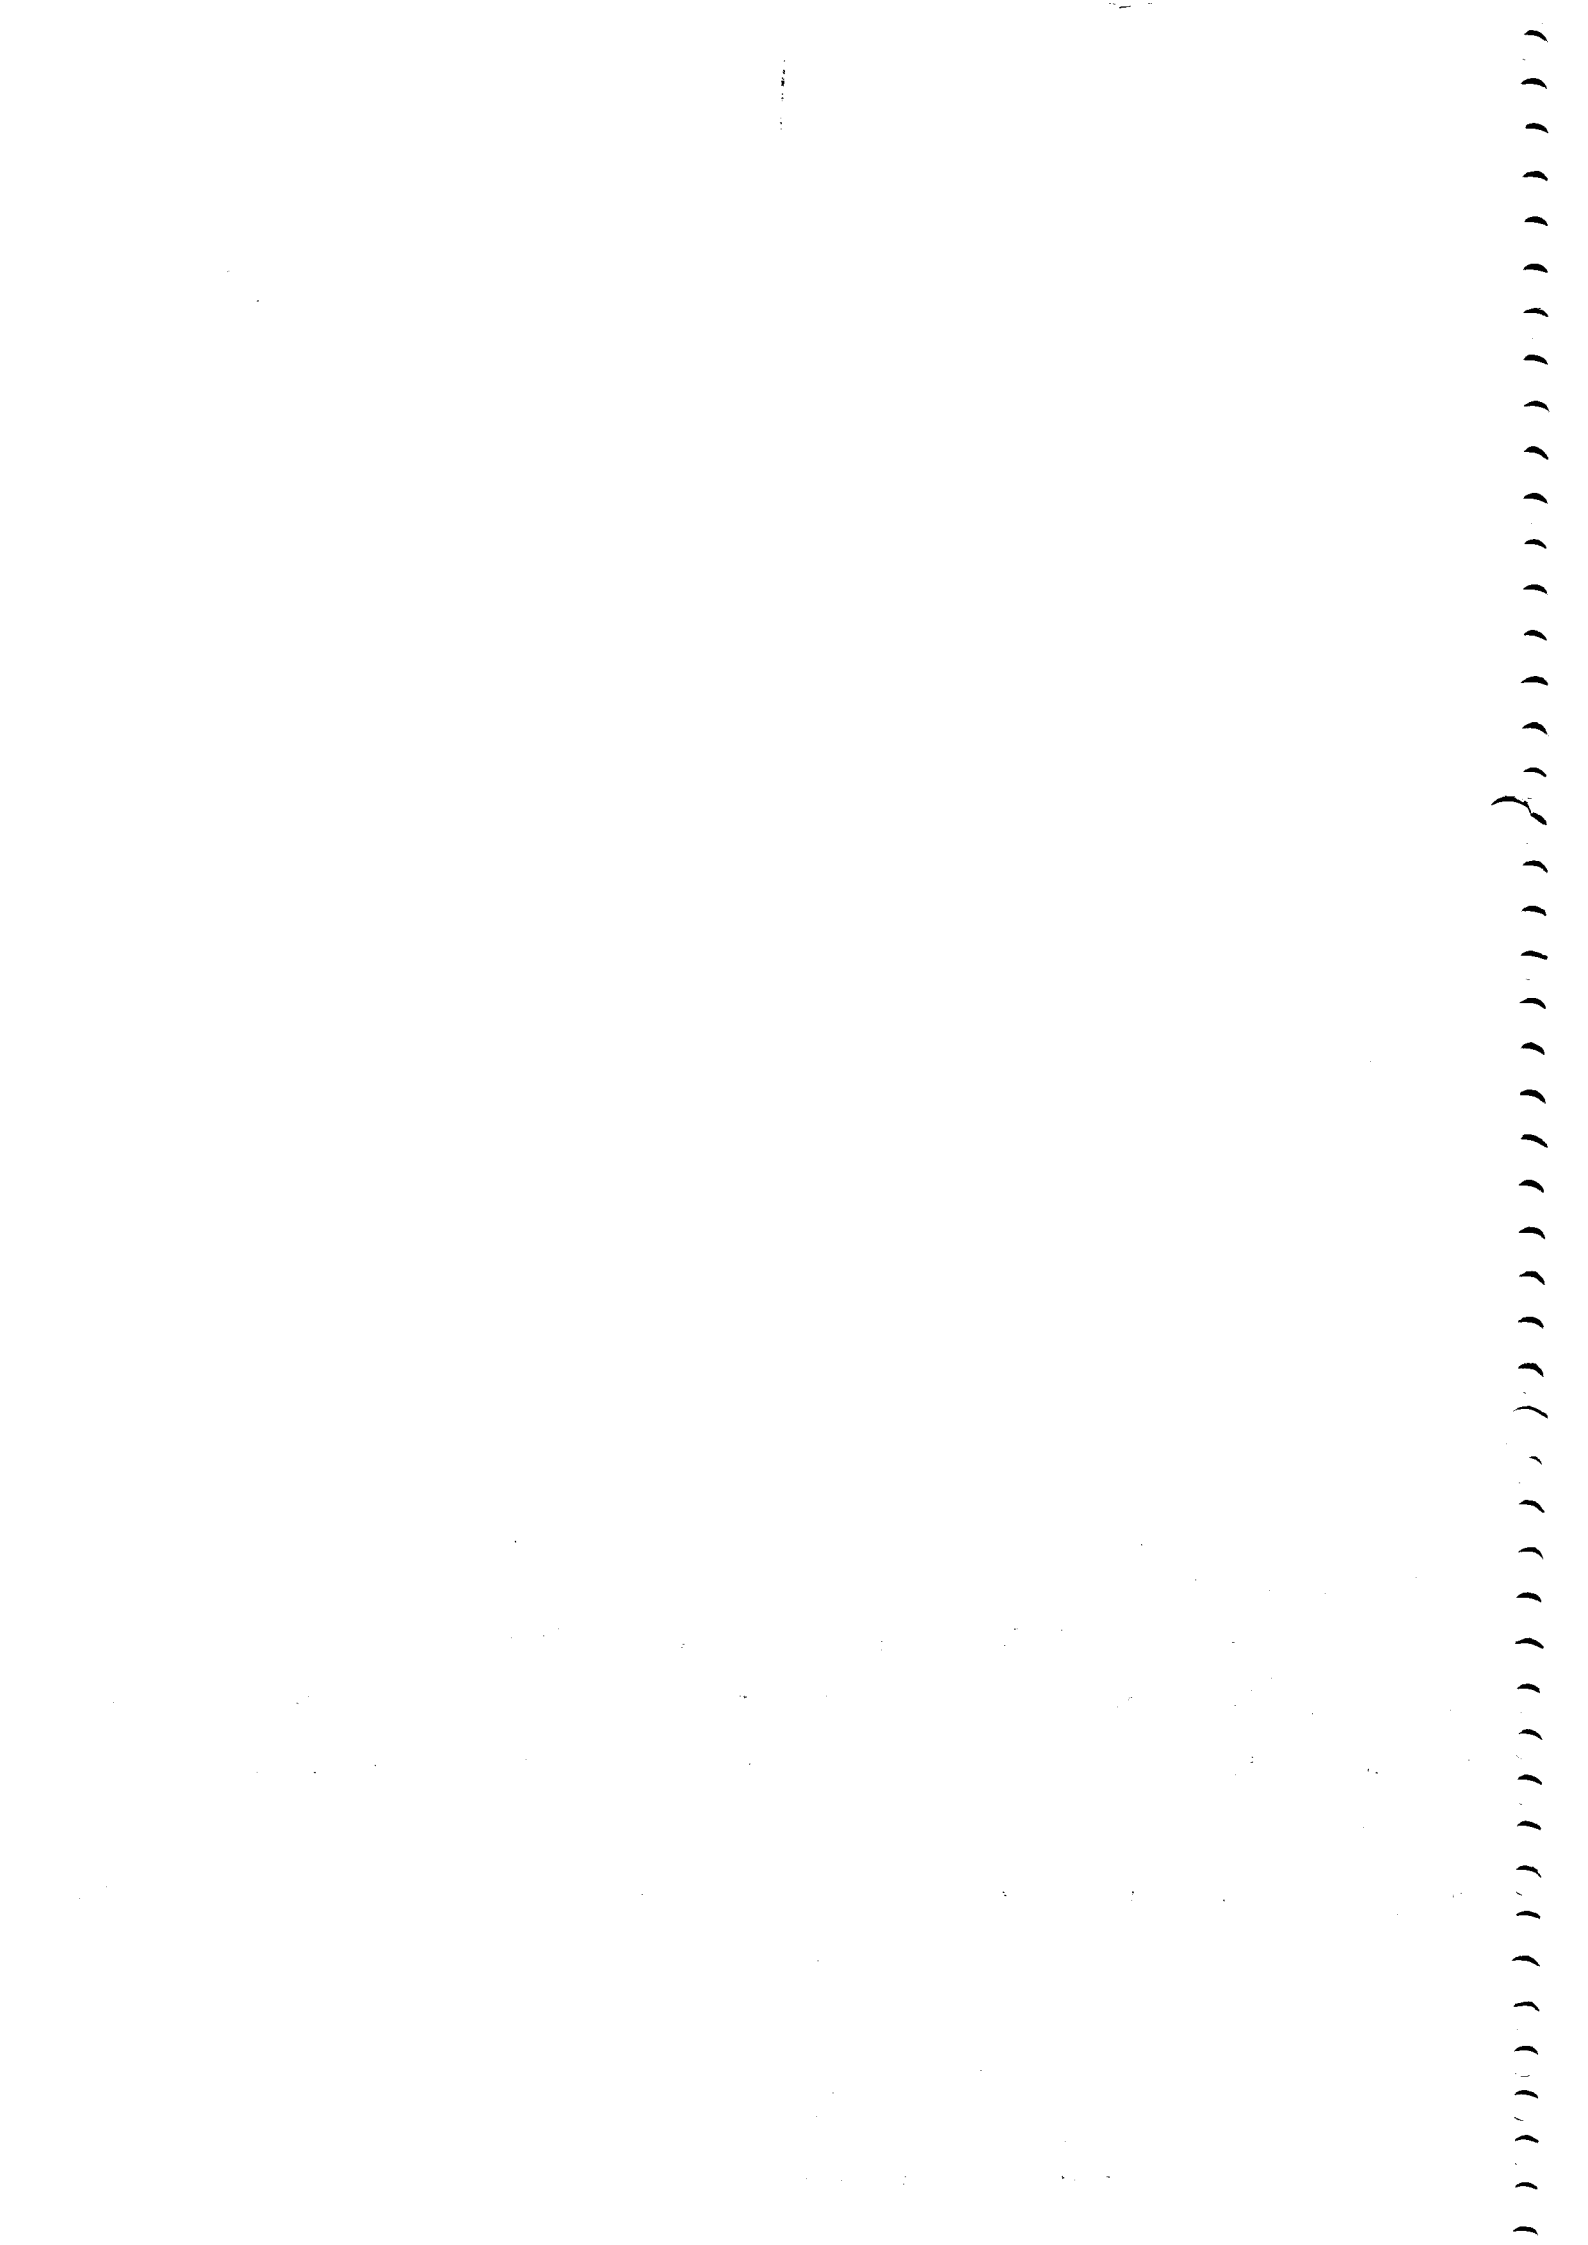
ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición final en plataforma
Noite y Sur bajo, vía del colector confirmación de plataformas
Operación dentro del cubeto remoción de materia y confirmación
de muros al rededor. Operación (24 hrs) en la escombrera el Trote
Disposición final escombrera Oyacoto, mejoramiento de vías
de acceso.
Mitigación de polvo y limpieza de basura dentro de las escombreras


ING. FERNANDO PÉREZ
CONTRATISTA


ING. MARITZA MUÑOZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000159

PROYECTO No. FECHA: 15/11/2016 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos, SUELOS EN PLATAFORMA SUR-BAJA Y NORTE
HEBRILLACION DE OBRAS ESCOMBRERA EL TRAJE - OYACOTO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos, SUELOS ESCOMBRERA OYACOTO
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CUBIERTO DE Lodos

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; RETROCAMION; CAMION
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de tierra, lodos y escombros en la plataforma Sur-baja y plataforma Norte; además, conformación plataforma en la vía del colector escombrera El Traje. (Diurno y Nocturno)
Disposición Final de tierra lodos y escombros en escombrera de Oyacoto
Conformación y mantenimiento vial tramos de acceso a Oyacoto.
Mitigación de polvos
Conformación de vermas al rededor del cubeto de lodos
construcción y colocación de tubería para descarga de agua

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ING. MARTIN NUNEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
