

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000188

PROYECTO No. .... FECHA: 30-SEPT/2017 DÍA: SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE SACS, LOMAS Y ESCOMBRAS EN PUTAFERRA NORTE
- RECEPCION DE MATERIAL DE SACS Y ESCOMBRAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- ELEVACION DE MURO PERIMETRAL DE CUBETOS PARTE SUR BATA
- FORTIFICACION DE USAS EN ESCOMBRERA EL TRAJE OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: .....  
AYUD. MAQ.: .....  
CHOFERES: .....  
MECÁNICOS: .....  
OTROS: SCMOERS

1  
1  
1  
1  
2  
2  
3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ..... ; Pata de cabra .....  
Camión Cisterna: 1 ; CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

Recepcion de material en las escombreras

FMGIRS-EP OYACOTO y El Troje.

Mejoramiento vial


Elevacion de muro perimetral de cubetos

Mitigacion de polvos.

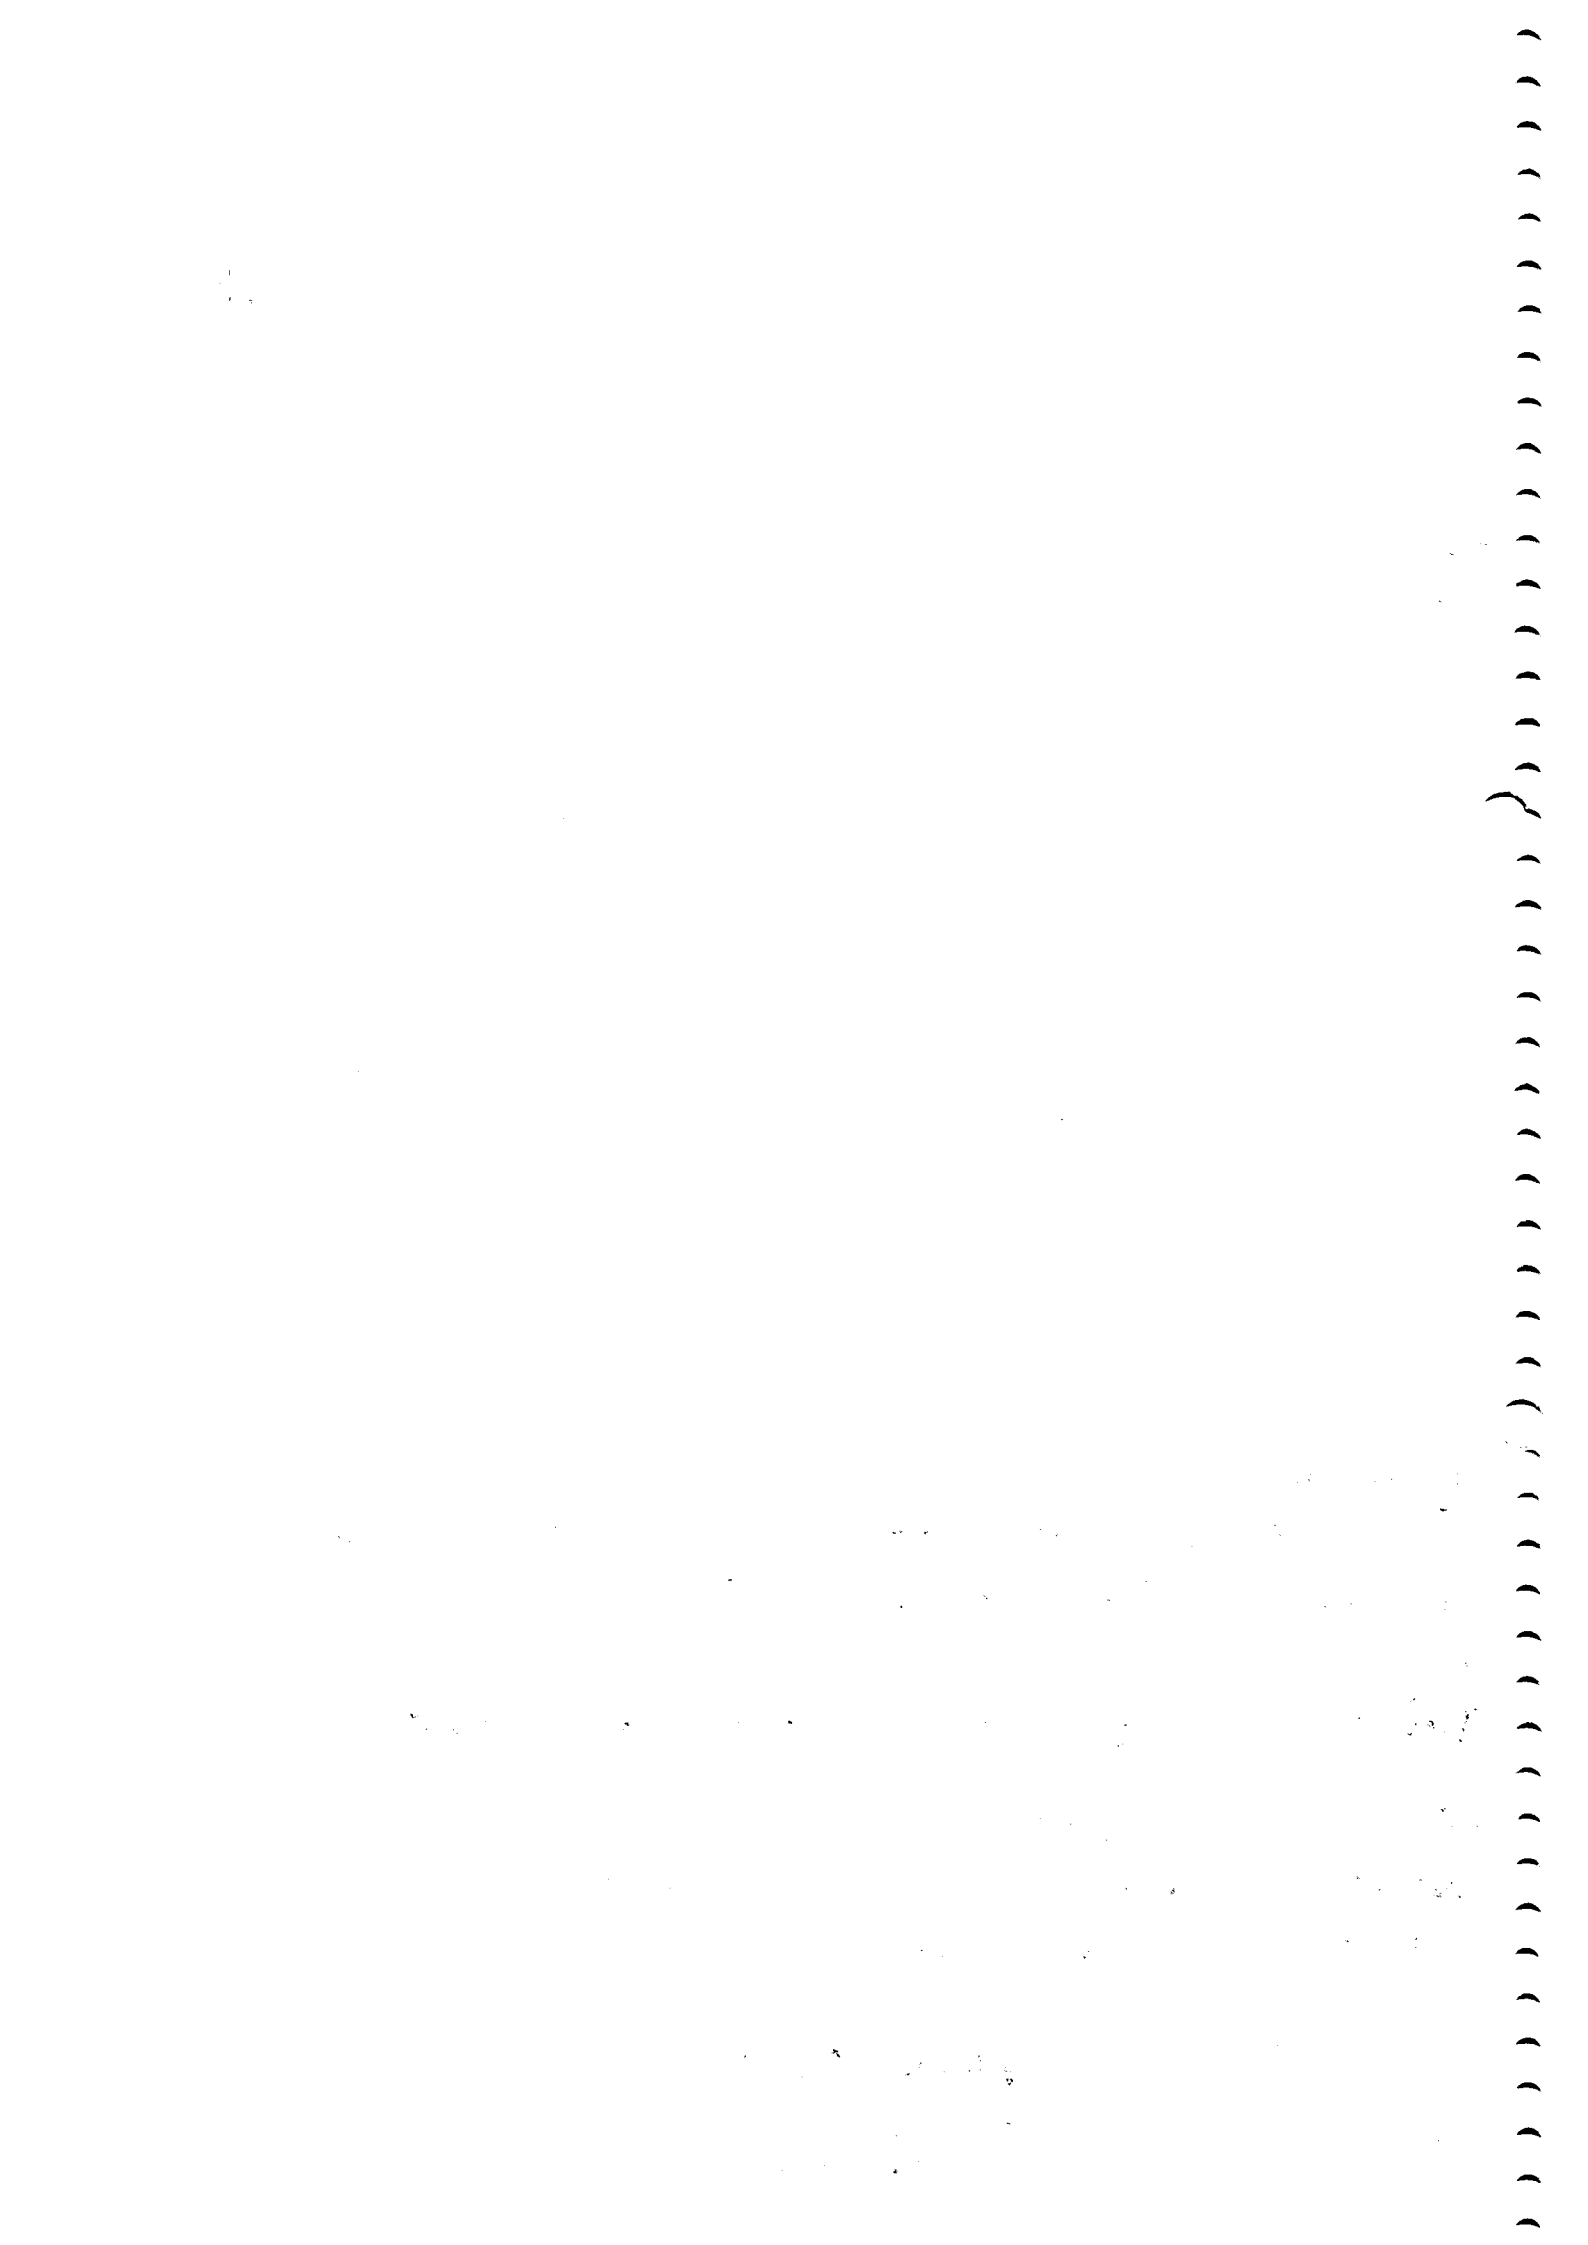
Excavacion para drenaje de cubeto.

Conformacion de zujos

  
Drs FERRAN PORCOTZ  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nolas  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000187

PROYECTO No. .... FECHA: 29-501/2017 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBRA Y SEROS PLATAFORMA NORTE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRA Y SEROS EN ESCOMBRETA OYACOTO
- REPARACIÓN DE VERTEDOR EN EL TRAJE Y OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN Y COMPLETO DE VERTEDOR.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 13  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 9  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; CARRO ✓  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....


### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

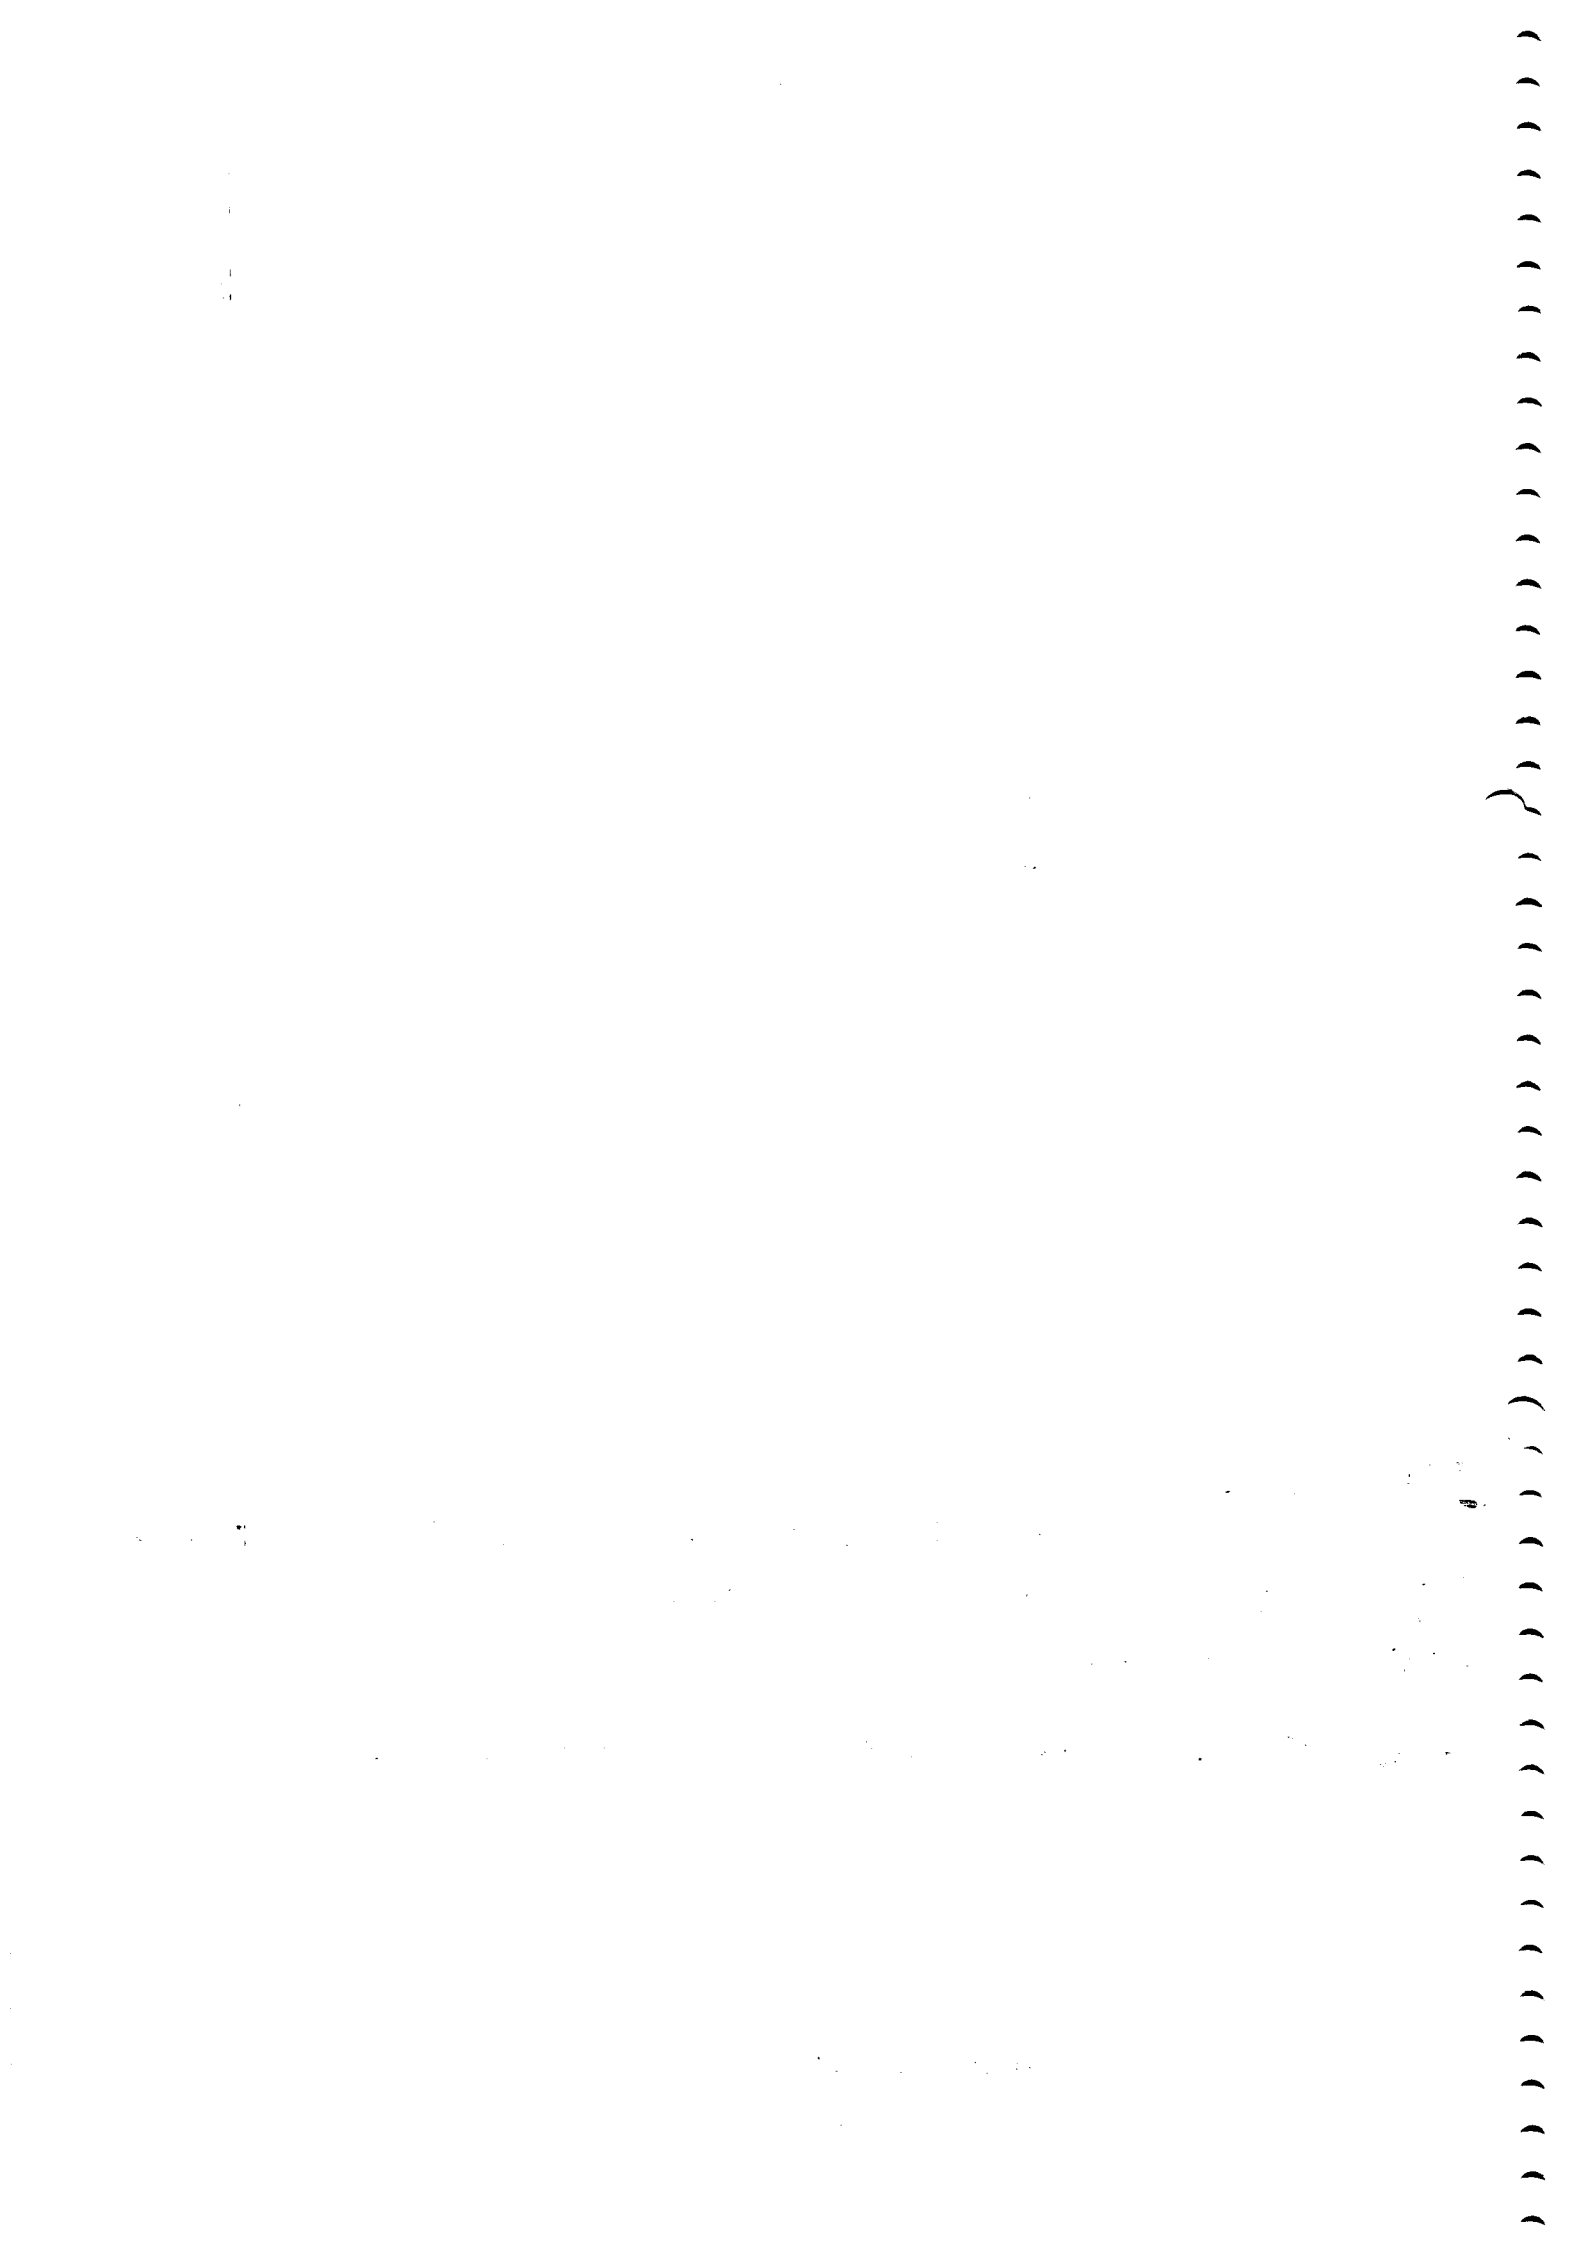
CONTRATISTA: .....

FISCALIZADOR  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Recepción de material escombreras El Traje y Oyacoto.  
Mejoramiento vial interno y Externo.  
Mitigación de polvos.  
Conformación de muro alrededor de cobeto de lodos.

  
ING. Fernando ...  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin ...  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000185

PROYECTO No. .... FECHA 28-5-21/2019 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TROJE Y FASE 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: EMISURSA - EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS Y SECOS PLÁSTICOS MUYE DÍA Y NOCHES  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA OYACOTO  
HIDRATACIÓN DE SUELO EN ESCOMBRERA EL TROJE - OYACOTO  
INSTALACIÓN Y BLOQUEO DE MURO ANTES CUBIERTOS DE LODOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 13  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 4 ; Volquetas .....  
Rodillos lisos 4 ; Neumáticos ..... ; Pata de cabra .....  
Camión Cisterna: 4 ; CAMION .....  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

FISCALIZADOR: .....

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción en las escombreras EMISURSA-EP Oyacoto


El Troje.

Hidratación de vías de ingreso y de salida

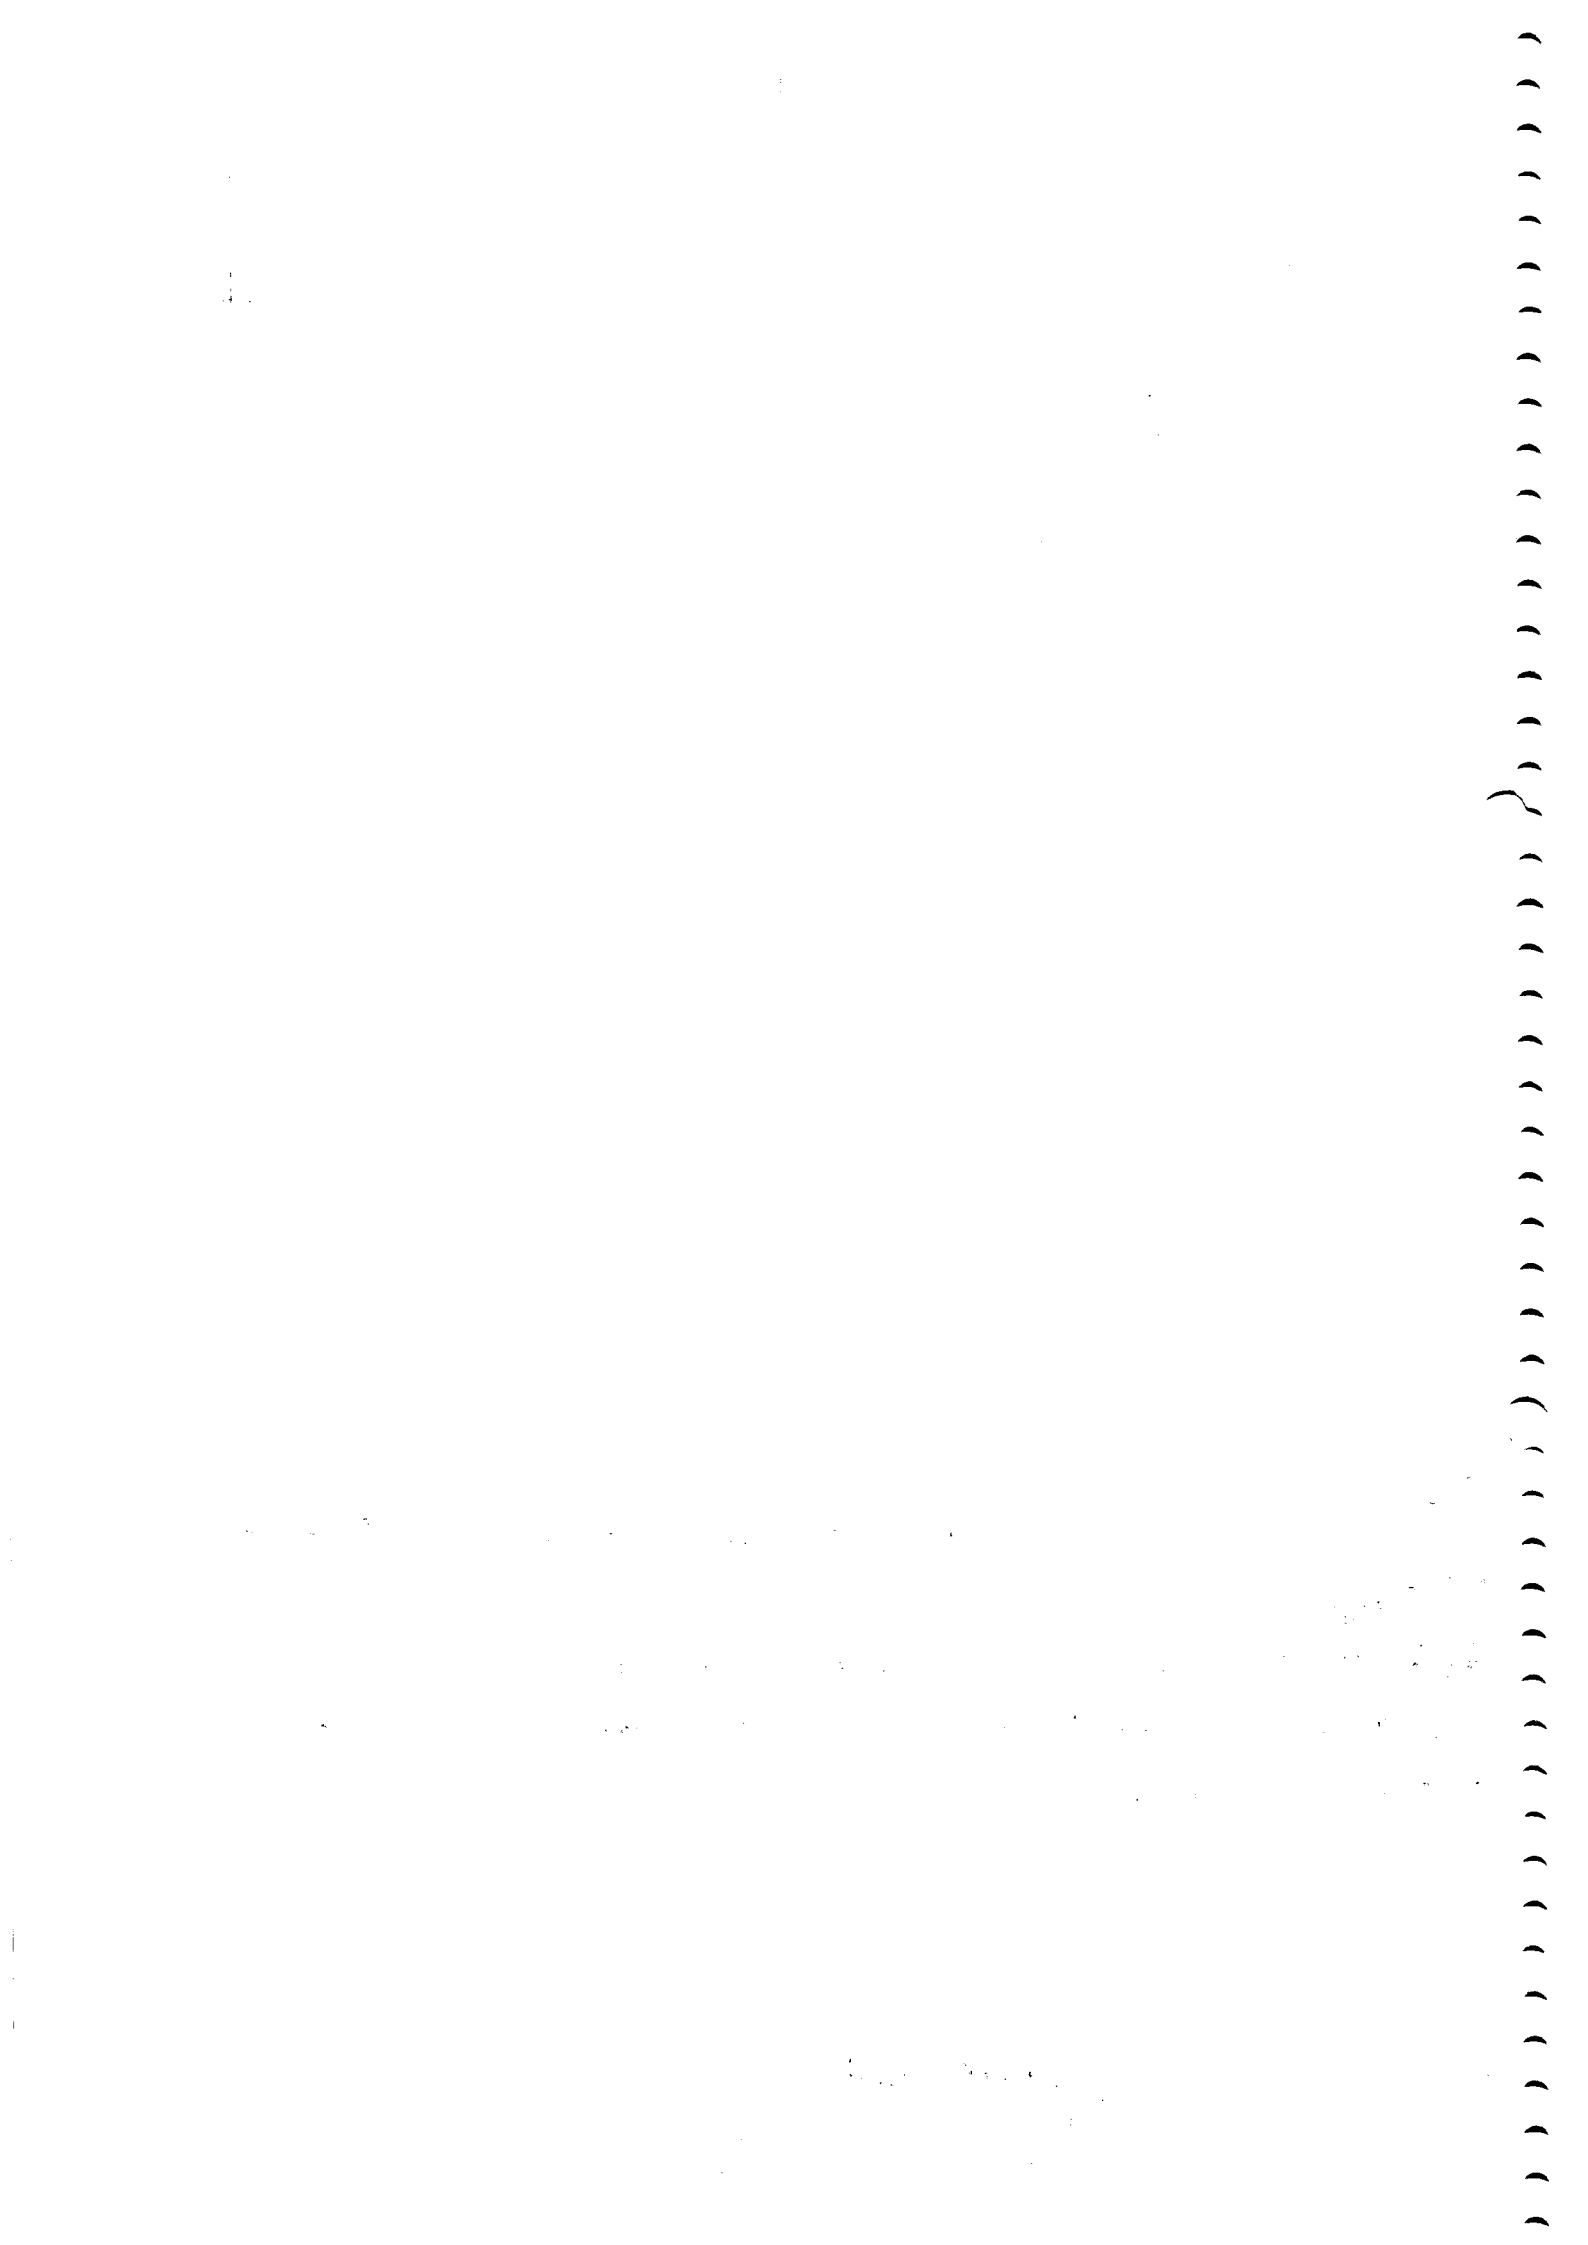
Conformación muro de contención de lodos cubeto

tendido y compactado.

  
LUIS FERNANDO ESCOBAR  
CONTRATISTA

  
Eng. Martin Maza  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000185

PROYECTO No. FECHA: 27-SEPT/2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TRAJE Y FASE E / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO; ESCOMBRO Y SECOS PATAFRAMB NORTES
- CONSTRUCCIÓN DE BERMAS LISO NOROCC
- ENTERRAMIENTO DE VEHICULOS EN ESCOMBRO EL TRAJE Y OYACOTO
- RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 13  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: OBREROS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; CATZAN  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte  
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte  
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### FISCALIZADOR


### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de escombros, lodos y tierra escombrera de El Traje. Recepción de escombros y tierra escombrera de Cyclicado tendido y compactado de tierras, movimiento, conformación de taludes.  
Mejoramiento vial.

  
Ing. Fernando Rosales  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nolas  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000184

PROYECTO No ..... FECHA: 26-SEPT/2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TRUJE Y FIUSE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SACOS, ESCOMBROS Y LODOS PLATAFORMA - RECUBRIMIENTO Y SUR
- RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBROS - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VÍAS EN ESCOMBROS DE EL TRUJE Y OYACOTO
- SEA CONSTRUCCIÓN DE MURO ENTRE CUBETOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 3  
OPERADORES: 13  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; CATERS  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:

### FISCALIZADOR


### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros en escombrera El Truje  
Recepción de tierra y escombros en escombrera Oyacoto.  
Hidratación de vías de acceso y vías internas.  
Construcción de nuevo contenedor de lodos y sistema de drenaje.

  
Ing. Fernando Padilla  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Ninos  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000183

PROYECTO No ..... FECHA: 25 SEPT 2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREDA - EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE TIERRA, ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA NORTE / SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE TIERRA, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBREDA OYACOTO
- HERRAMIENTAS DE UNA ESCOMBREDA EL TRONC - OYACOTO
- CONSTRUCCIÓN DE BERMAS LADO NORTE

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 3  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; CAMION  
Otros: ;  
En reparación: ;  
Salida de obra: ;

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de todos, tierra y escombros en la escombrera  
El Tronc, Recepción de tierra y escombros en la escombrera  
El Oyacoto.

Mitigación de polvos en vías de acceso.

Construcción de bermas en plataforma Norte, tendido y  
compactado.

  
SR. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
ENG. MARTÍN NOVOA  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

4.

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000182

PROYECTO No. FECHA: 24-SEPT-2019 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: RECOMBRERAS - EL TRONCO Y FASE - 2 Y QUITO

CONTRATISTA: CONSAFEO - EL TRONCO - QUITO  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
MANTENIMIENTO  
RECONFORMACIÓN Y ASOCIACIÓN DE PLATAFORMAS

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 12  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIA 3


**EQUIPO:**  
Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras ;  
Motoniveladoras ; Volquetas  
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra ;  
Camión Cisterna: 1 ;  
Otros: ;  
En reparación: ;  
Salida de obra:


**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte   
TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte   
NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Mejoramiento vial, reconformación de vías.  
Mantenimiento de maquinaria.  
Limpieza y recolección de basura.

  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000181

PROYECTO No. .... FECHA: 23-SEPT-2017 DÍA: SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONTRATISTA - CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE OBRAS, ESCOMBROS Y SECAES PUTRESCIBLES NOROCCIDENTAL
- RECEPCION DE MATERIAL DE OBRAS, ESCOMBROS Y SECAES ESCOMBRERAS - OYACOTO
- ELIMINACION DE OBRAS ESCOMBRERAS - EL TRUJE - OYACOTO
- CONSTRUCCION DE BERMAS: UNO MULTIPLO PARALELO A LA VÍA SECCION PLENUM

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 12  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 3

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; CATRÓN:  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte   
TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte   
NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP escombreras  
Oyacoto y El Truje.


Mejoramiento vía

Mitigación de polvos en vías internas y de ingreso  
Conformación de bermas, fendido y compactado.

ING. FERNANDO ROSARIO  
CONTRATISTA

ING. MARTIN NUNEZ  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000180

PROYECTO No. .... FECHA: 22-SEPT-2017 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LUGAR; ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA NOROCCIDENTAL 7500
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LUGAR; ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VÍAS ESCOMBRERA - EL TROJE - OYACOTO
- RECONFORMACIÓN DE VÍAS INTERNAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1; CAMION; CAMIONES  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### FISCALIZADOR

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Disposición final en escombreras El Troje y Oyacoto:

- Operación normal en ambas escombreras
- Hidratación de vías internas.
- Reconformación de vías internas.
- Mejoramiento de plataformas de disposición.

  
ING. FERNANDO ESCOBAR  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nieto  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000179

PROYECTO No ..... FECHA: 21-SEPT/2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA, ESCOMBROS Y SECOS DUTARANDA NORTE Y SUR  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA - OYACOTO  
MANTENCIÓN DE VÍAS ESCOMBRERA EL TRAJE - OYACOTO  
SISTEMA DE PLATAFORMAS  
RECONFORMACIÓN DE VÍAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras .....  
Motoniveladoras ..... ; Volquetas .....  
Rodillos lisos ..... ; Neumáticos ..... ; Pata de cabra .....  
Camión Cisterna: 1 ; CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción y operación normal escombreras Oyacoto  
y El Traje.


Mejoramiento de vías internas.

Conformación de plataformas de disposición final.

  
Ing. Fernando Parascot  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000178

PROYECTO No. .... FECHA: 20-SEPT/2017 DÍA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECS ESCOMBRERA EL TRUJE Y OYACOTO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECS ESCOMBRERA OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VIALS ESCOMBROS EL TRUJE Y OYACOTO
- RECONFORMACIÓN DE VIALS.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: SUAVES 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras .....  
Motoniveladoras ..... ; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ..... ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

### FISCALIZADOR


### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de material ( lodos, tierra y escombros) en  
escombrera El Truje. Recepción lodos, tierra y escombros en  
escombrera Oyacoto.  
Mitigación de polvos en ambas escombreras.  
Mejoramiento vial.

CONTRATISTA

FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000177

PROYECTO No. .... FECHA: 17-06-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJO Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJO - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS, RESUMAS Y SACOS EN PLAZA NORTE Y SUR ACTA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS, RESUMAS Y SACOS EN ESCOMBRERA OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS - EL TRUJO - OYACOTO
- RECONFORMACIÓN DE VÍAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: EUNOR 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter. .... Lluvia deb. conti. .... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter. .... Lluvia deb. conti. .... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter. .... Lluvia deb. conti. .... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....


### ADMINISTRADOR DEL

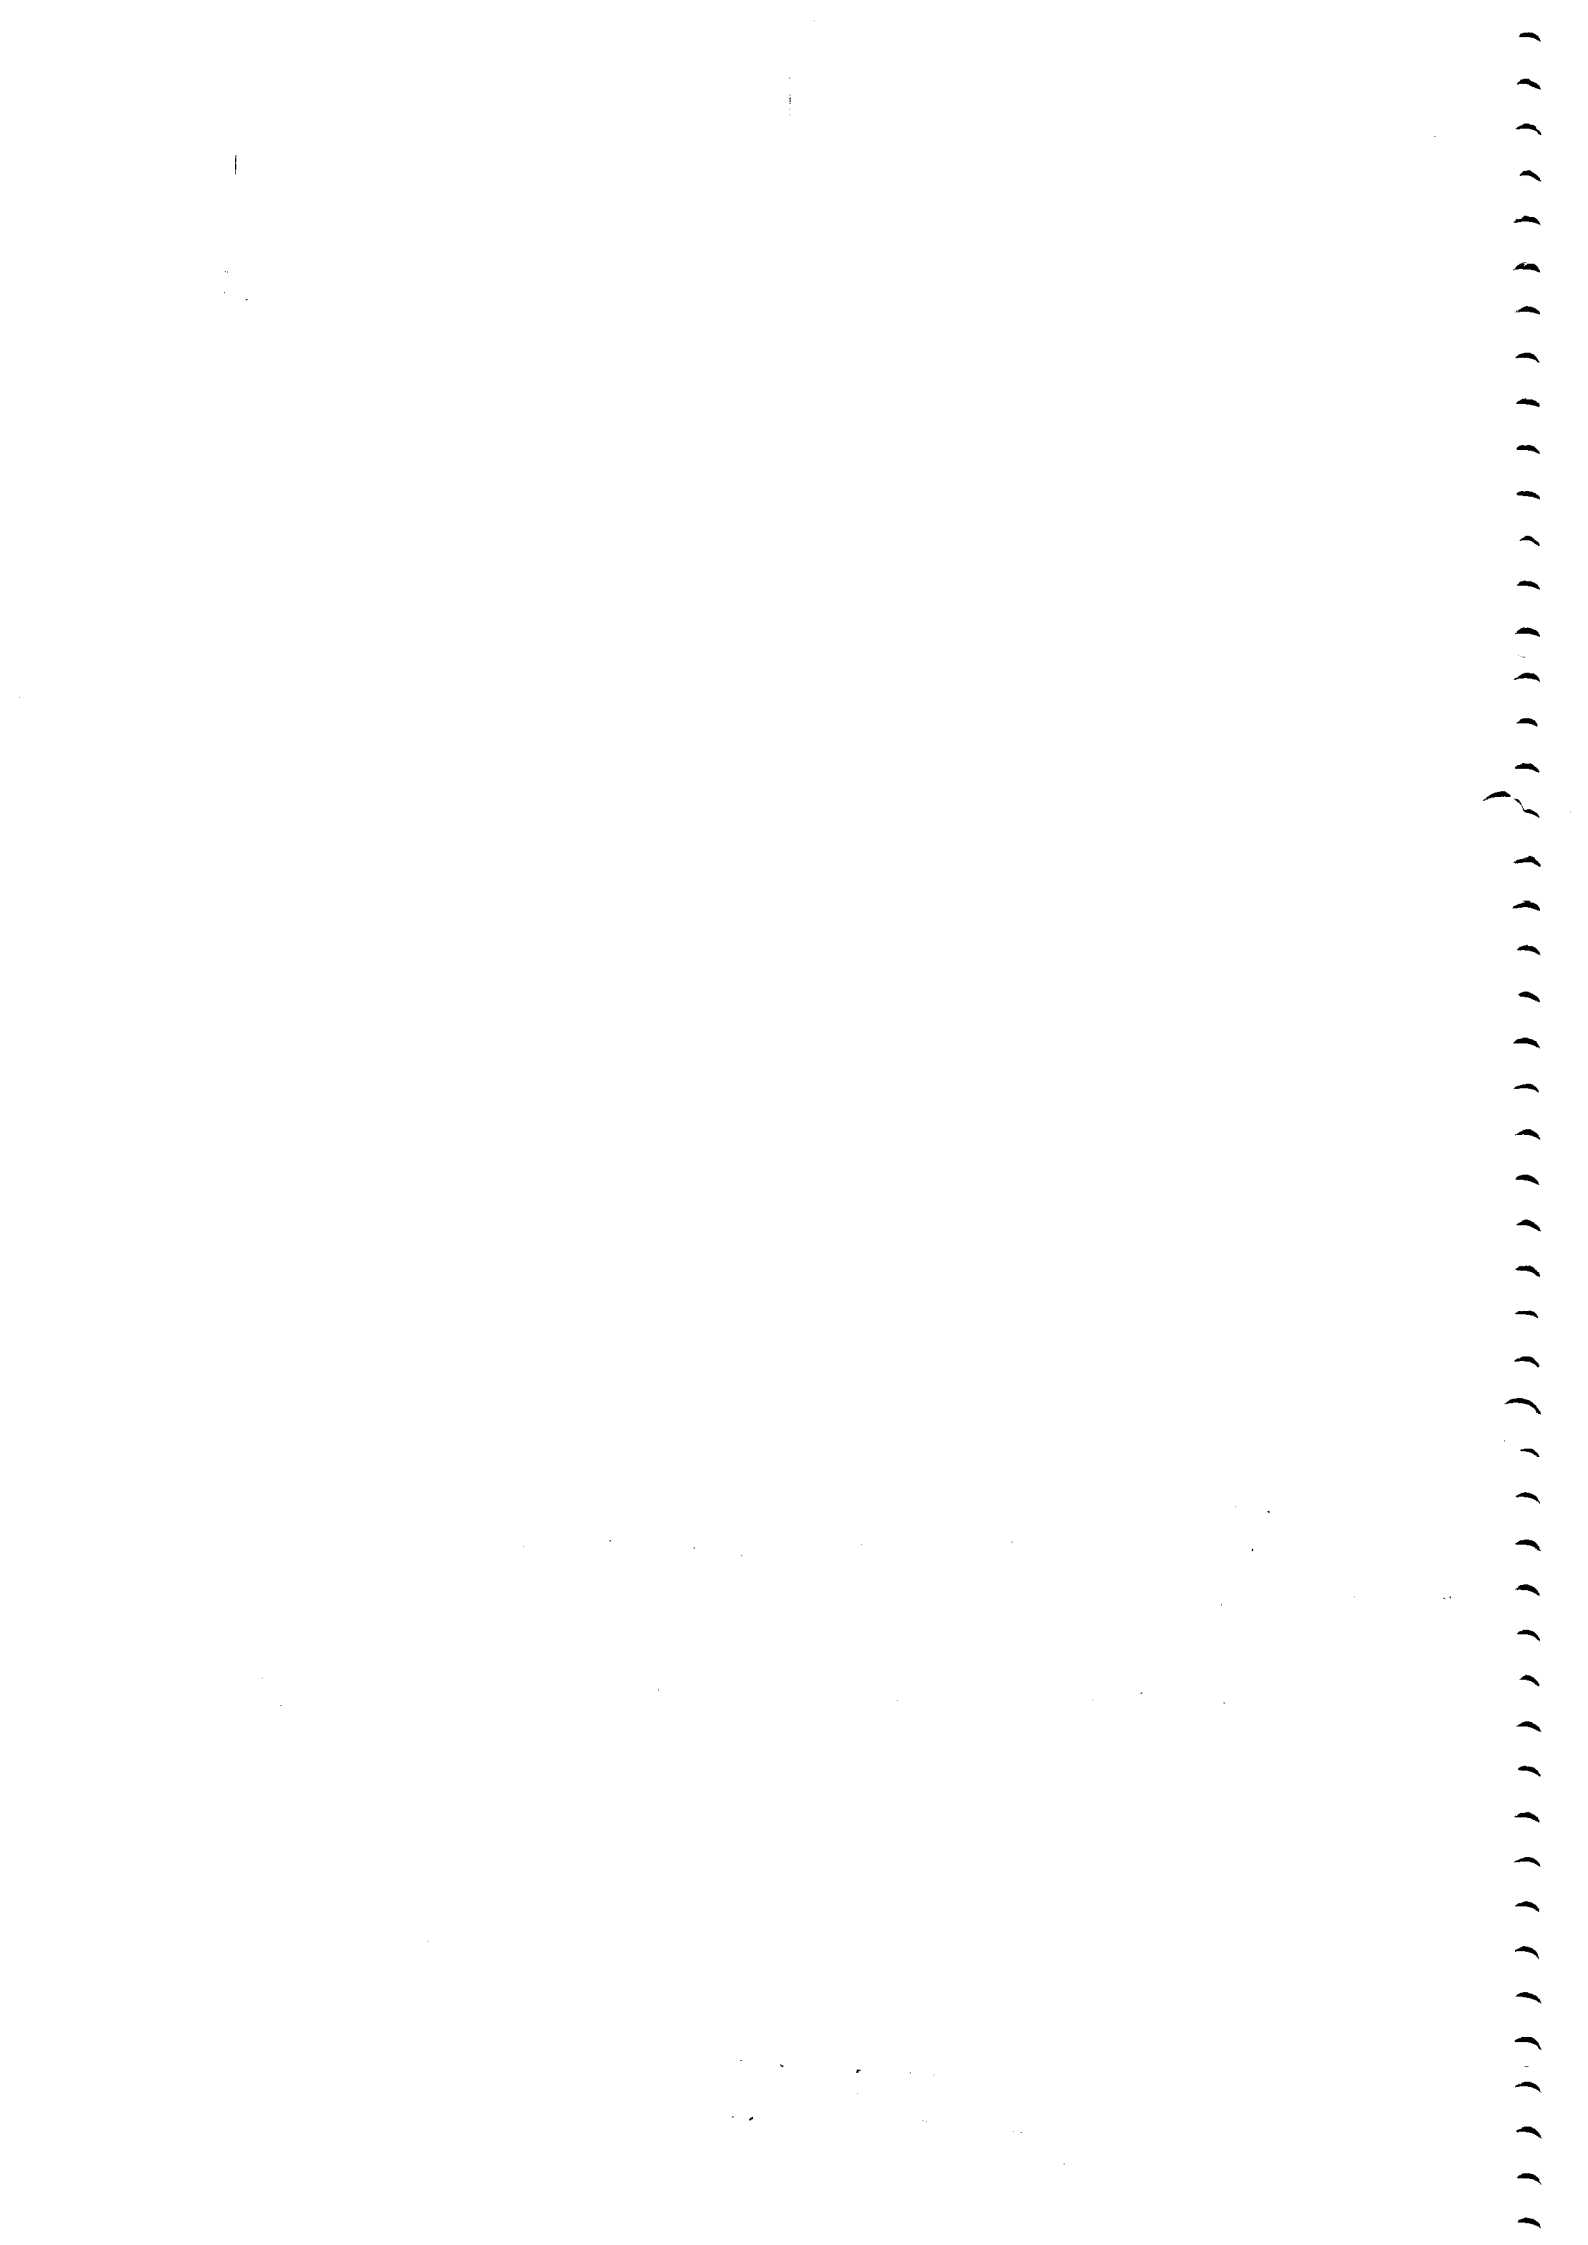
CONTRATO: Recepción de escombros, los y tierra normal  
en las escombreras EMGIRS - EP

Operación normal, hidratación vial y mejoramiento

  
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
ING. MARTÍN NÁJERA  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000176

PROYECTO No ..... FECHA: 18-SEPT-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RESECCION DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBROS Y SECCION PARA FASE II OYACOTO  
RESECCION DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBROS Y SECCION ESCOMBRO - OYACOTO  
RESECCION DE LOSA EN ESCOMBRO - OYACOTO  
RESECCION DE LOSA  
ARREGLO DE PUERTAS EN CUBETA DE LOSA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 17  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIA 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RETRANSMISOR; ANTENA  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Confirmación de muro al rededor de cubeto de losa escombrera el Troje, tendido y compactado de material para construcción de bermas.

Mejoramiento vial Oyacoto.

  
ING. FERNANDO ROCA  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Núñez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000175

PROYECTO No. .... FECHA: 17-SEP-2017 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TUNDO 4 FASE II / OYUNCO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TUNDO - OYUNCO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RESERVA DE USAS Y PLATAFORMAS  
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 6

AYUD. MAQ.: 6

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 2

OTROS: GUARDIA 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras ; Excavadoras ;

Motoniveladoras ; Volquetas

Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna 1 ;

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado 4 Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

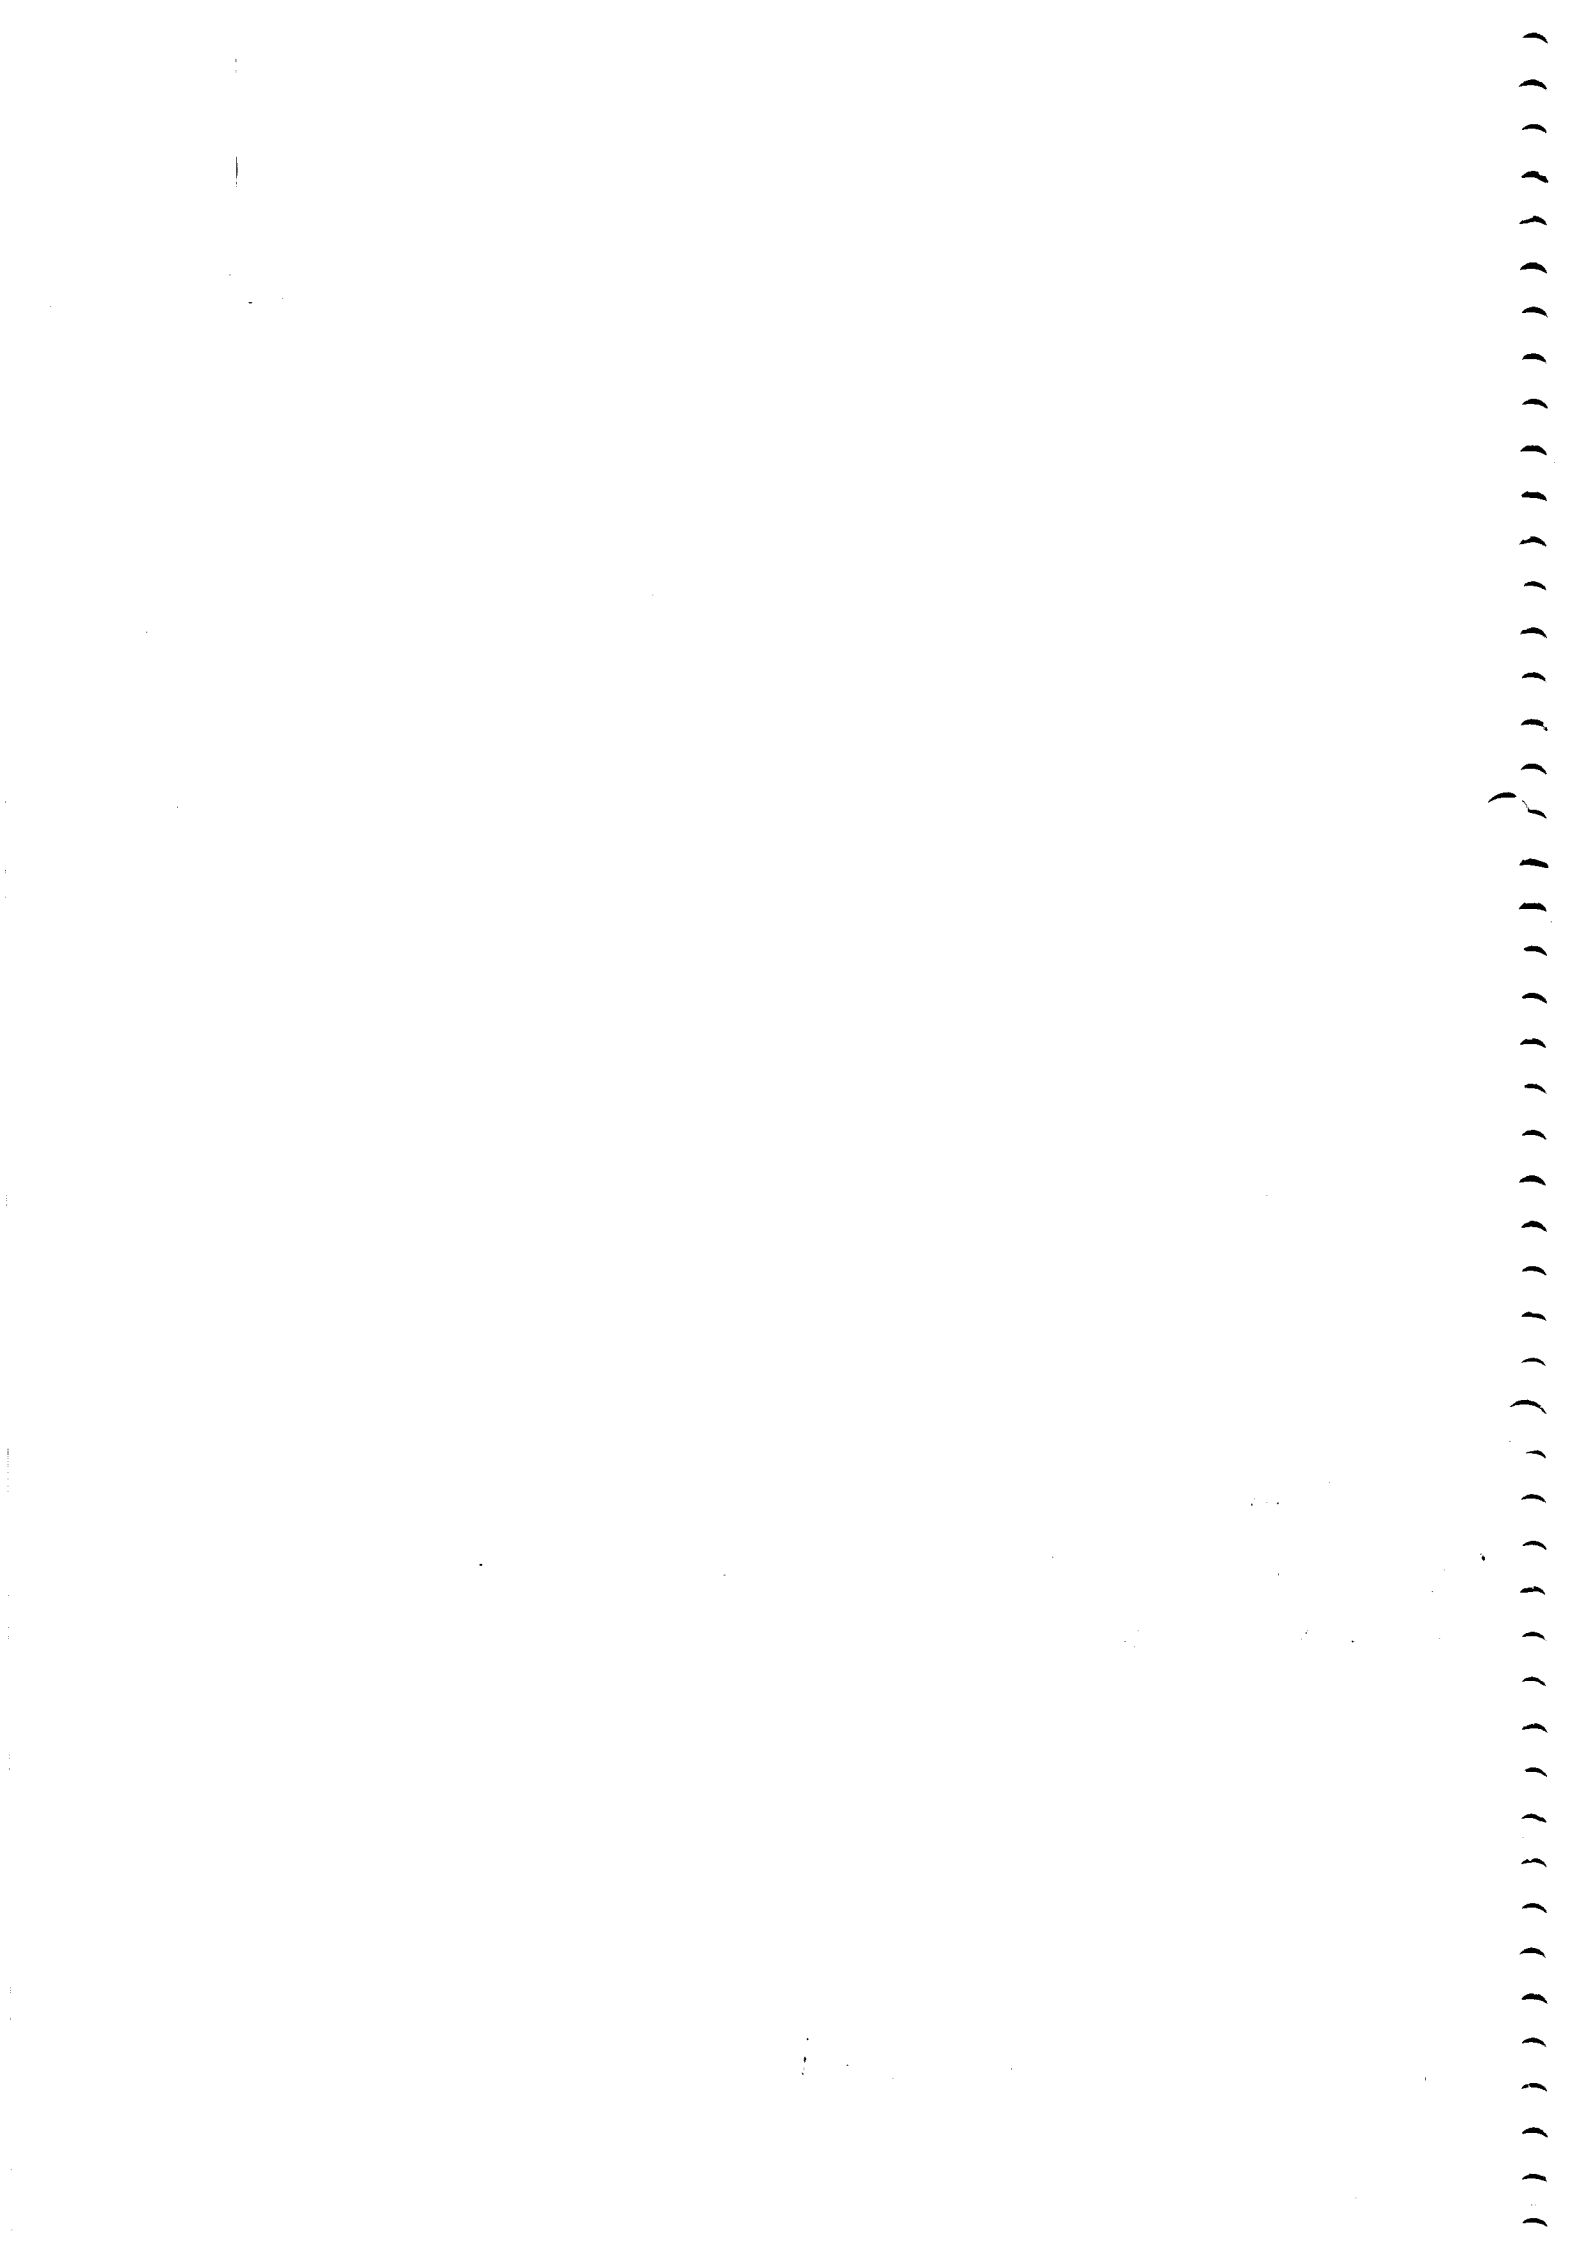
FISCALIZADOR  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

Mejoramiento vial, limpieza de cunetas y plataformas  
Mantenimiento de maquinaria.

  
ING. FERNANDO VELASCO  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000174

PROYECTO No ..... FECHA: 16-08-2017 DÍA: SAGUO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SERVICIO PLATAFORMA VIAL Y SUIL
- OPERACIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SERVICIO ESCOMBRERA OYACOTO
- MITIGACIÓN DE LOS ESCOMBROS OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN DE VIALS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 5

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; PLATAFORMA VIAL; OYACOTO ✓  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros escombrera el Traje.


Recepción escombros y tierra escombrera OYACOTO.

Operación normal en ambas escombreras


Mitigación de polvos

Mejoramiento plataformas viales

  
JOSÉ FERNANDO ROSALES  
CONTRATISTA

  
JOSÉ MARTÍN LÓPEZ  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000173

PROYECTO No. .... FECHA: 13-SEPT-2017 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LADRILLOS, ESCOMBROS Y SECOS EN PUNTAS DE EL TROJE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE LADRILLOS, ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBREO - OYACOTO  
RECONSTRUCCION DE OBRAS:  
HIDRANTACION DE OBRAS EN ESCOMBREOS Y OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 3  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1; RETROEXCAVADOR / CATAPULTA  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Recepción de escombros, lodos y tierra escombren  
El Troje.

Recepción de escombros y tierra en escombros Oyacoto  
operación normal.

  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000172

PROYECTO No. .... FECHA: 14-SEPT/2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FISO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SUELOS EN PLANTACIÓN NOROCCIDENTAL DE LA NOCHE  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SUELOS EN ESCOMBRERA OYACOTO  
REDUCCION DE USOS ESCOMBRERA EL TRAJE Y OYACOTO  
CONSTRUCCION DE MUROS EXTERIORES EN CUBIERTA DE LOSAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; PERSONAL MAQ. CAPACITADO  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:


### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

Fiscalizador  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Recepción de bdos, tierra y escombros en la  
escombrera El Traje.  
Recepción de escombros y tierra en escombrero de Oyacoto  
operación normal

  
PABLO FERNANDO ROSALES  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Núñez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000171

PROYECTO No. .... FECHA: 13-SEP-2017 DÍA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SUCOS PLANTAS NOROCCIDENTALES / SUR  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SUCOS ESCOMBRERA - OYACOTO  
MEJORAMIENTO DE VÍAS EN ESCOMBROS EL TRAJE / OYACOTO  
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 30  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 7 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; BOTAS EXCAVADORAS ; CAÑONAS  
Otros: .....


### CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	✓				
TARDE:	✓				
NOCHE:	✓				


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

Fiscalizador  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Recepción de material (escombros, tierra y lodos) escombre-  
ras EMGIRS-EP (OYACOTO Y EL TRAJE).  
Operación normal en ambas escombreras.  
Mitigación de polvos en ambas escombreras.  
Mejoramiento vial en las escombreras.

  
ING. FERRER, FERRER  
CONTRATISTA

  
ING. MARTIN NUÑEZ  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000170

PROYECTO No. .... FECHA: 12-SEPT-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE Y EL TUNJE / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ESCOMBRERAS - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA NORTE Y SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBROS Y SACOS EN ESCOMBRERA OYACOTO
- MANTENIMIENTO DE OBRAS ESCOMBRERAS EL TRUJE Y OYACOTO
- COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASE BAJO OBRAS PLATAFORMA / PLATAFORMAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 13  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; ~~RETRACTORES 2~~  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti <input type="checkbox"/>	Lluvia fuerte <input type="checkbox"/>
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti <input type="checkbox"/>	Lluvia fuerte <input type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti <input type="checkbox"/>	Lluvia fuerte <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

Fiscalizador  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Disposición de escombros, tierra y lodos en escombreras  
EMGIRS-EP, operación normal 24hrs escombrera El Truje  
en Oyacoto 10hrs operativa la escombrera.  
Mitigación de polvos en ambas escombreras  
Colocación de subbase dentro de la escombrera El Truje  
Mejoramiento de las plataformas Norte y Sur.

  
Francisco Kuevas  
CONTRATISTA

  
Eng. Martín Nuñez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000169

PROYECTO No. FECHA: 11-SEP-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II (OYARCOTO)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYARCOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Lodos y SECOS PLANTARIL HUAYTA Y S...
- LIBERACIÓN DE VERTEDORAS EL TROJE Y OYARCOTO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Lodos y SECOS ESCOMBRERA - OYARCOTO
- COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASIS VÍA DE ACCESO PRINCIPAL

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 3 *EMPLEA*

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras :  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; *RESTO: EXCAVADOR ; CATAPULTA*  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

Fiscalizador  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Recepción de lodos, escombros y tierra escombreras  
EMGURS-EP, operación normal, mitigación de lodos

- Mejoramiento vial escombrera El Troje.

  
INÉS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
Eugenio MARTÍN MORA  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000168

PROYECTO No. .... FECHA: 15-SEPT-2017 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS Y FIBRO II Y OYUNTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJO-DYNACTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS Y PLATAFORMAS, LUBRIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: .....

TOPOGRAFOS: 2

OPERADORES: 6

AYUD. MAQ.: 2

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: SURTIDOS 3

### EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;

Motoniveladoras 1; Volquetas .....

Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1;

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

TARDE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

NOCHE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

Fiscalizador:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Reconformación de vías, limpieza y mejoramiento de plataformas

  
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
ING. MARTÍN NÚÑEZ  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000167

PROYECTO No. .... FECHA: 7-2007-2007 DÍA: SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA DE TUNJO Y FASE 3 Y 4 OYACOTA

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TUNJO-OYACOTA  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES: ESCOMBROS Y RESIDUOS, PLATAFORMA SUR ALTA Y NOCHE  
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DE OBRAS: ESCOMBROS Y RESIDUOS ESCOMBRERA OYACOTA  
FUNDACIONES DE UNA ESCOMBRA OYACOTA - Y B.C. TUNJO  
FUNDACION DE MATERIALES DE SUB-BASE UNA PLATAFORMA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAN 3

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 4; Excavadoras .....  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RECOLECTORAS; CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ..... Nublado  Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ..... Nublado  Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de contrato. Continúan trabajos de mejoramiento vial dentro de la escombrera, colocación de sub-base preparativos para época invernal.


Disposición en plataforma sur alta y noche de escombros y bodos. Tierra seca se dispone en la vía del colector con el fin de tomar altura de disposición.

Disposición final escombros de OYACOTA al pie de quebrada disposición por volteo.

  
ING. FERNANDO LOZANO  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nolas  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000166

PROYECTO No.

FECHA: 8-SEPT-2017

DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRUJE Y FISA II - QUITO

CONTRATISTA: CONSORTIO - EL TRUJE - QUITO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OBRAS, ESCOMBROS Y SUELOS PUTRESCIBLES, HORTA Y SURTIENDO  
- RECEPCIÓN  
SE CUBREN MATERIAL DE SUB-BASE DE UNA PAVIMENTACIÓN SOBRE PAVIMENTACIÓN Y COLECCIÓN  
HIZO UNO DE VES

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

### EQUIPO:

Tractores .....; Cargadoras .....; Excavadoras .....

Motoniveladoras .....; Volquetas .....

Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra .....

Camión Cisterna: .....

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Mejoramiento vial, colocación de  
Piedra caca a lo largo de las vías de acceso (paralela a  
la Av Simón Bolívar) Disposición en la plataforma sur alta y  
norte de escombros y lodas, tierra en plataforma sobre el  
colector

Trabajos regulares escombrera Oyacoto, disposición por medio.  
Mitigación de polvo uso de tanquero escombrera El Truje Oyacoto

  
J. FERNANDO BAEZ  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000165

PROYECTO No. .... FECHA: 7-SEPT-2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJO Y FINO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS REALIZADOS EN LA OBRA Y HORAS  
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ESCOMBRERAS, SERVICIOS Y LÍNEA ESCOMBRERA - OYACOTO  
MANTENIMIENTO DE VÍAS  
ARREGLO DE VÍAS EN MANEJO DE CUBIERTOS DE LOSA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: 5 (FERRER) 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA ; C.M. 02  
Otros: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición final de escombro y  
todos en la plataforma Maite y Sur alta. Disposición de  
tierra en la vía del colector.  
Recolección y limpieza de basura dentro de la escombrera El Trujo  
Disposición de todos, tierra y escombro en la quiebrada  
dentro de la escombrera de Oyacoto.  
Mitigación de polvo en las dos escombreras

  
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Nájera  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000164

PROYECTO No. .... FECHA: 6-SEPTIEMBRE/2017 DÍA: Martes  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TUJO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TUJO - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**  
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS PREFABRICADOS 50x120 ACES Y HORMIGÓN  
- RECONSTRUCCIÓN DE VAS  
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBROS - OYACOTO  
- CONSTRUCCIÓN DE HUMP Y BERTAS EN CUBIERTO DE LOS COS.

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: EMBAZAS 3


**EQUIPO:**  
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RESTO EXCAVADORA 1 UM. 22  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....


**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Recepción de lotes, escombros plásticos en la noche y Sur Alta, Disposición de tierra seca en la boca del colector para coger nivel a la altura de pozos de revisión del colector. Escombrera El Tujo  
Escombrera Oyacoto mitigación de polvo resuspendido al en el acceso a la escombrera disposición por gravedad dentro la quebrada.

  
ING. FERREROS FERRER  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nieves  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000163

PROYECTO No. FECHA: 5-SEPT-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TREJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TREJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS PUNTAOJA SUR ALTA Y NOROCCIDENTALES DE OYACOTO  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBRERA OYACOTO  
CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BERMAS EN COBERTO DE LOS SACOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RETROCAMIÓN; CAMIÓN  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Disposición de material (escombras, tierra y los dos) plataforma sur alta y baja. Tierra seca en la vía del colector. Confirmación de bermas relación H: 1,5 y V: 1m escombrera El Treje.


Escombrera de Oyacoto mejoramiento vial disposición en quebrada tendido de material

Mitigación de polvo en las dos escombreras

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

ING. MARÍA NIEVES  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000162

PROYECTO No. .... FECHA: 4-SEPT-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRIO 4 FIES D / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRIO - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS - Lodos y secos PUTREFACTOS SUR VÍA ATE  
HORIZONTAL DE VENTAS  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS - Lodos y secos ESCOMBRELA OYACOTO  
CONSTRUCCION DE MURO Y BERMAL EN APLICACION DE CUBETO DE Lodos

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: GUARDIA 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras ..... ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ..... ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA, CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición final de lodos en la  
plataforma Norte y descarga de tierra y escombros en la vía del  
colector para conformar la plataforma escombrera El Trego. (diurna  
y nocturna la operación).


Escombrera de Oyacoto disposición final de tierra, escombros y lodos  
por volteo.

Mitigación de polvo en las dos escombreras


Cobertura de sarán (telas de color verde) protección

Operación de tractores dentro del cubeto, movimiento de tierras

  
Ing. Eusebio Paredi  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000161

PROYECTO No. .... FECHA: 3- SEPT -2017 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE 4 FASES II Y OLANCO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OLANCO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE VASOS Y PLATAFORMAS  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 13  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1; RETROCAMIÓN C.M. 2M  
Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Trabajos de mantenimiento escombrera  
El Troje, mejoramiento de vías de acceso, limpieza de basura  
Confirmación de vías hacia las plataformas


Mitigación de polvo, uso de fanguero de agua.

Colocación de sarán (telar color verde) a lo largo de la


Av. Simón Bolívar sobre sarán colocado.

Colocación tubaría de descarga de aguas paso vía de cuneta

  
ING. FERNANDO PÉREZ  
CONTRATISTA

  
Eng. Martín Nixer  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000160

PROYECTO No. .... FECHA: 2 SEPT 2017 DÍA: SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREDA EL TROTE 4 FASE U Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR BATA Y HORA  
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS EN OYACOTO  
HIDRATACION DE VIAS  
CONSERVACION DE MURO Y BARRA EN CUBIERTO DE Lodos

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 2 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;  
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA ; CAJIZ 1  
Otros: ....  
En reparación: ....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

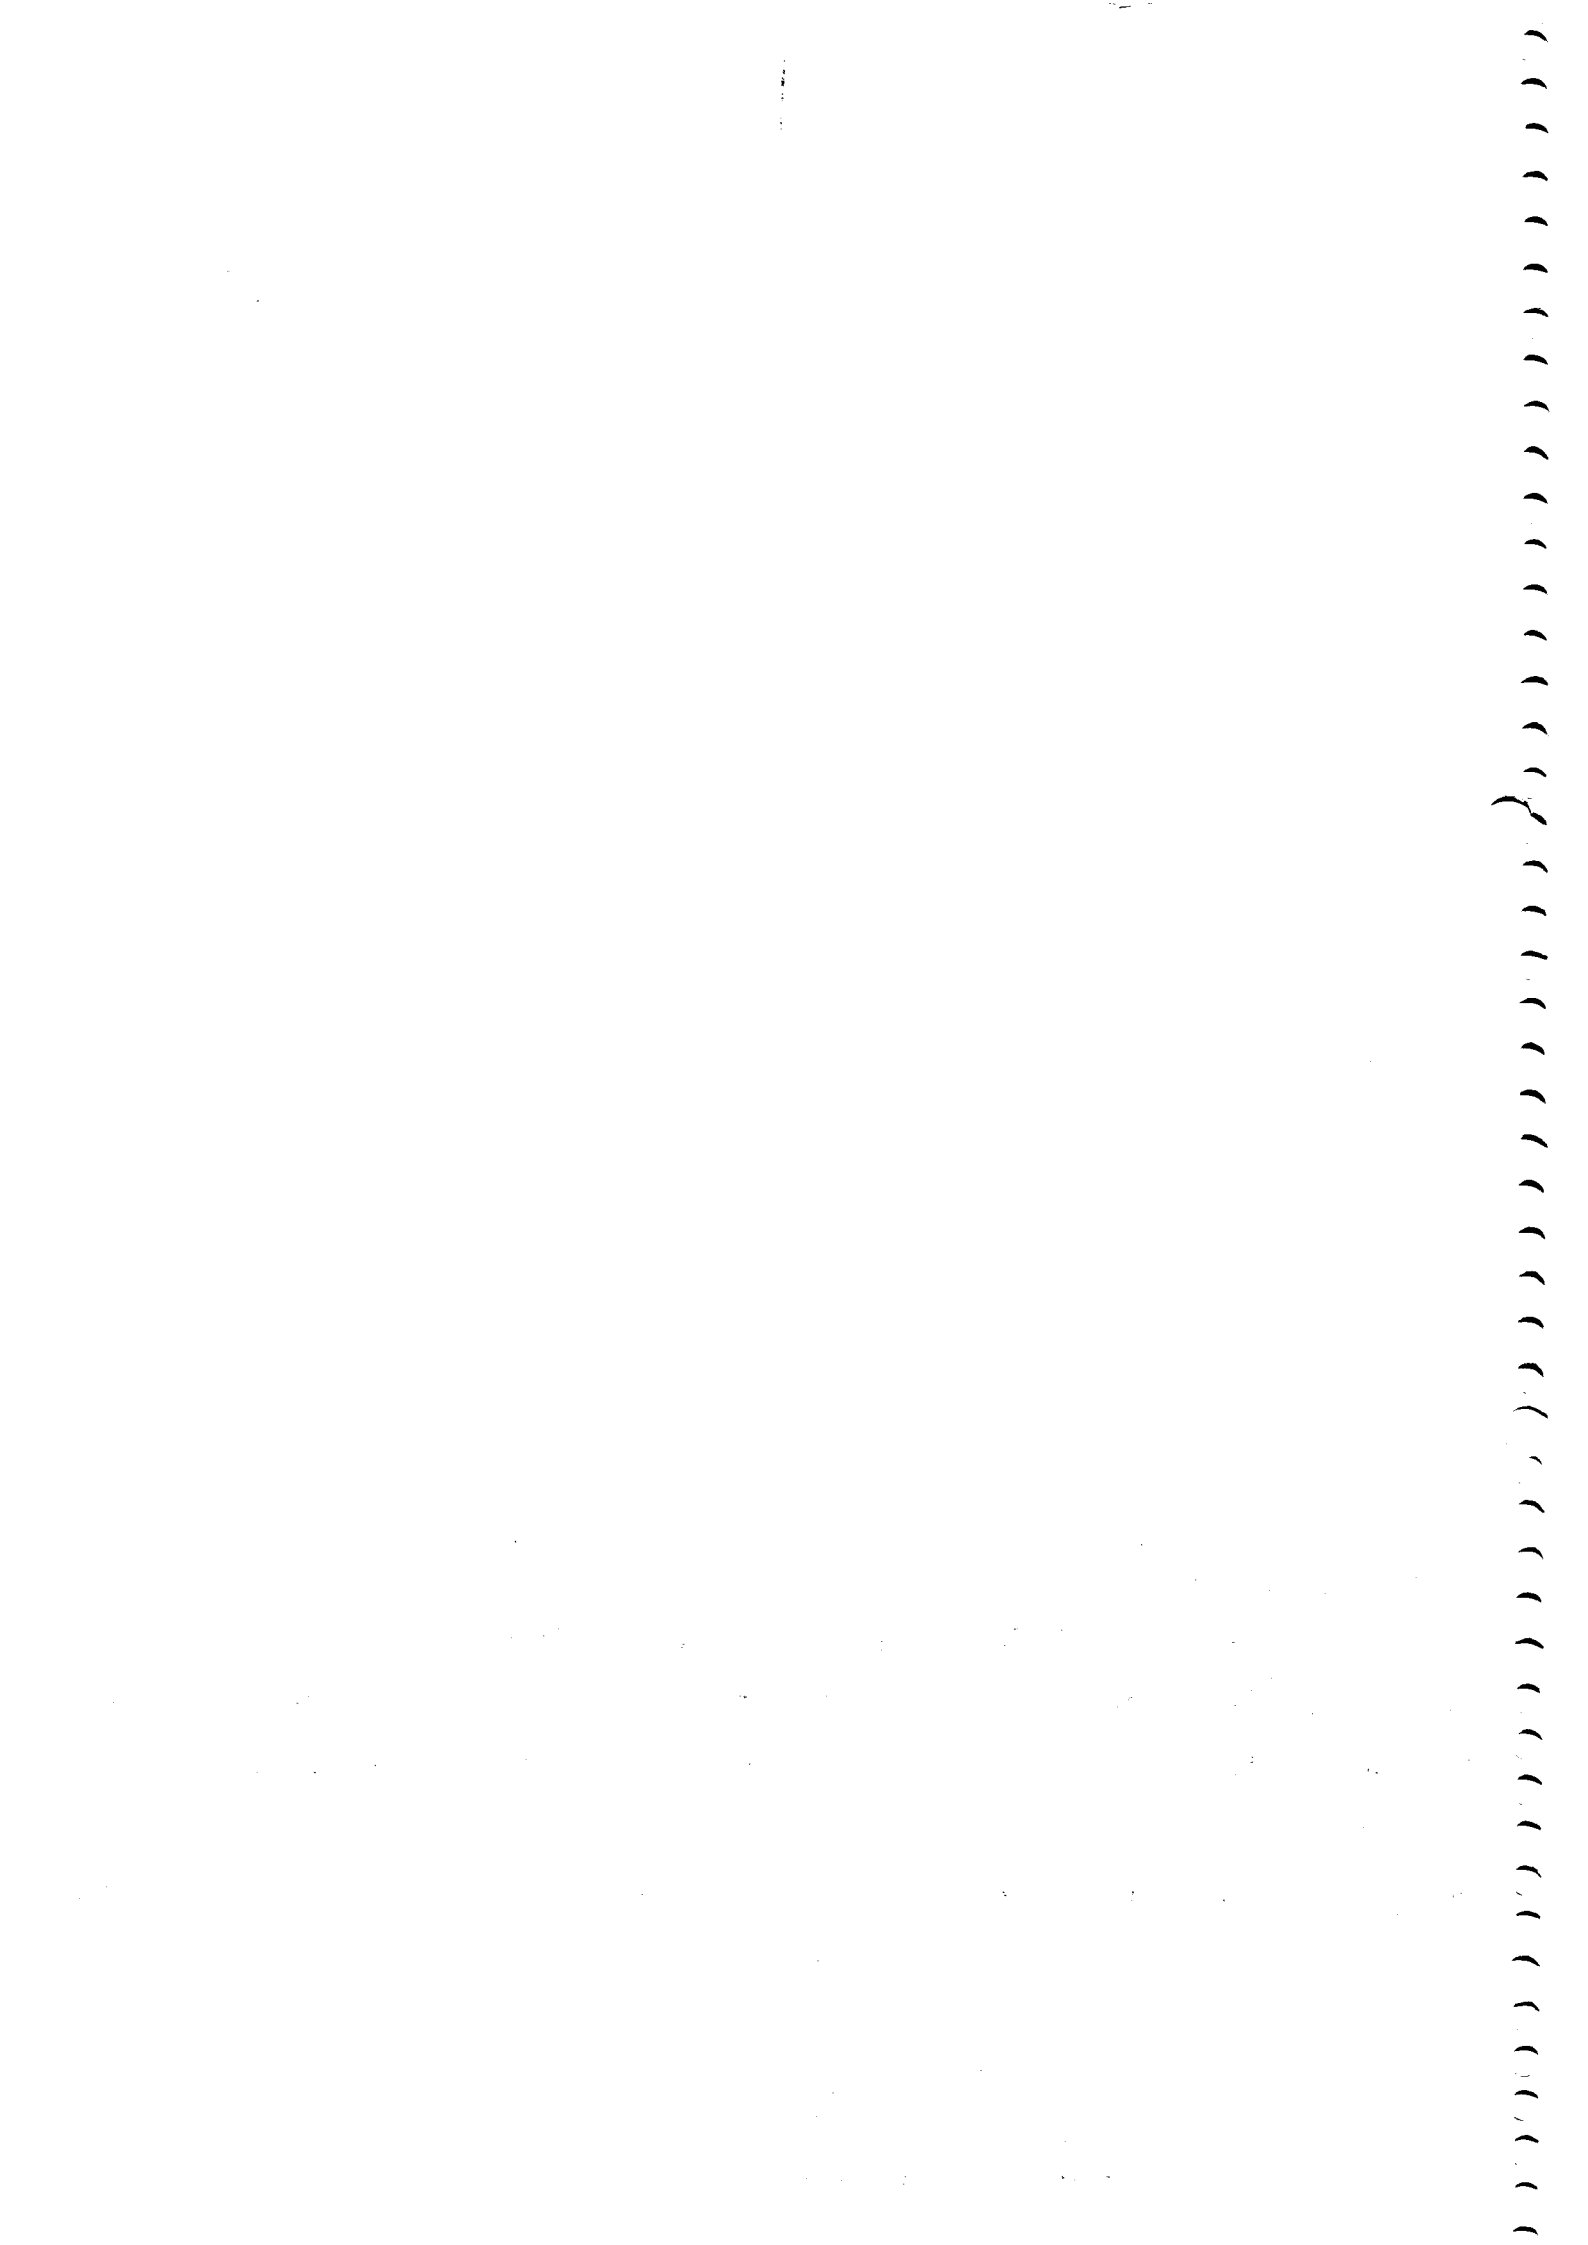
### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición final en plataforma  
Noite y Sur bajo, vía del colector confirmación de plataformas  
Operación dentro del cubeto remoción de materia y confirmación  
de muros al rededor. Operación (24 hrs) en la escombrera el Trote  
Disposición final escombrera Oyacoto, mejoramiento de vías  
de acceso.  
Mitigación de polvo y limpieza de basura dentro de las escombreras

  
ING. FERNANDO PÉREZ  
CONTRATISTA

  
ING. MARITZA MUÑOZ  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000159

PROYECTO No. .... FECHA: 15/11/2016 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos, SUELOS EN PLATAFORMA SUR-BAJA Y NORTE  
HEBRILLACIÓN DE OBRAS ESCOMBRERA EL TRAJE - OYACOTO  
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos, SUELOS ESCOMBRERA OYACOTO  
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CUBIERTO DE Lodos

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1 ; RETROCAMION; CAMION  
Otros: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

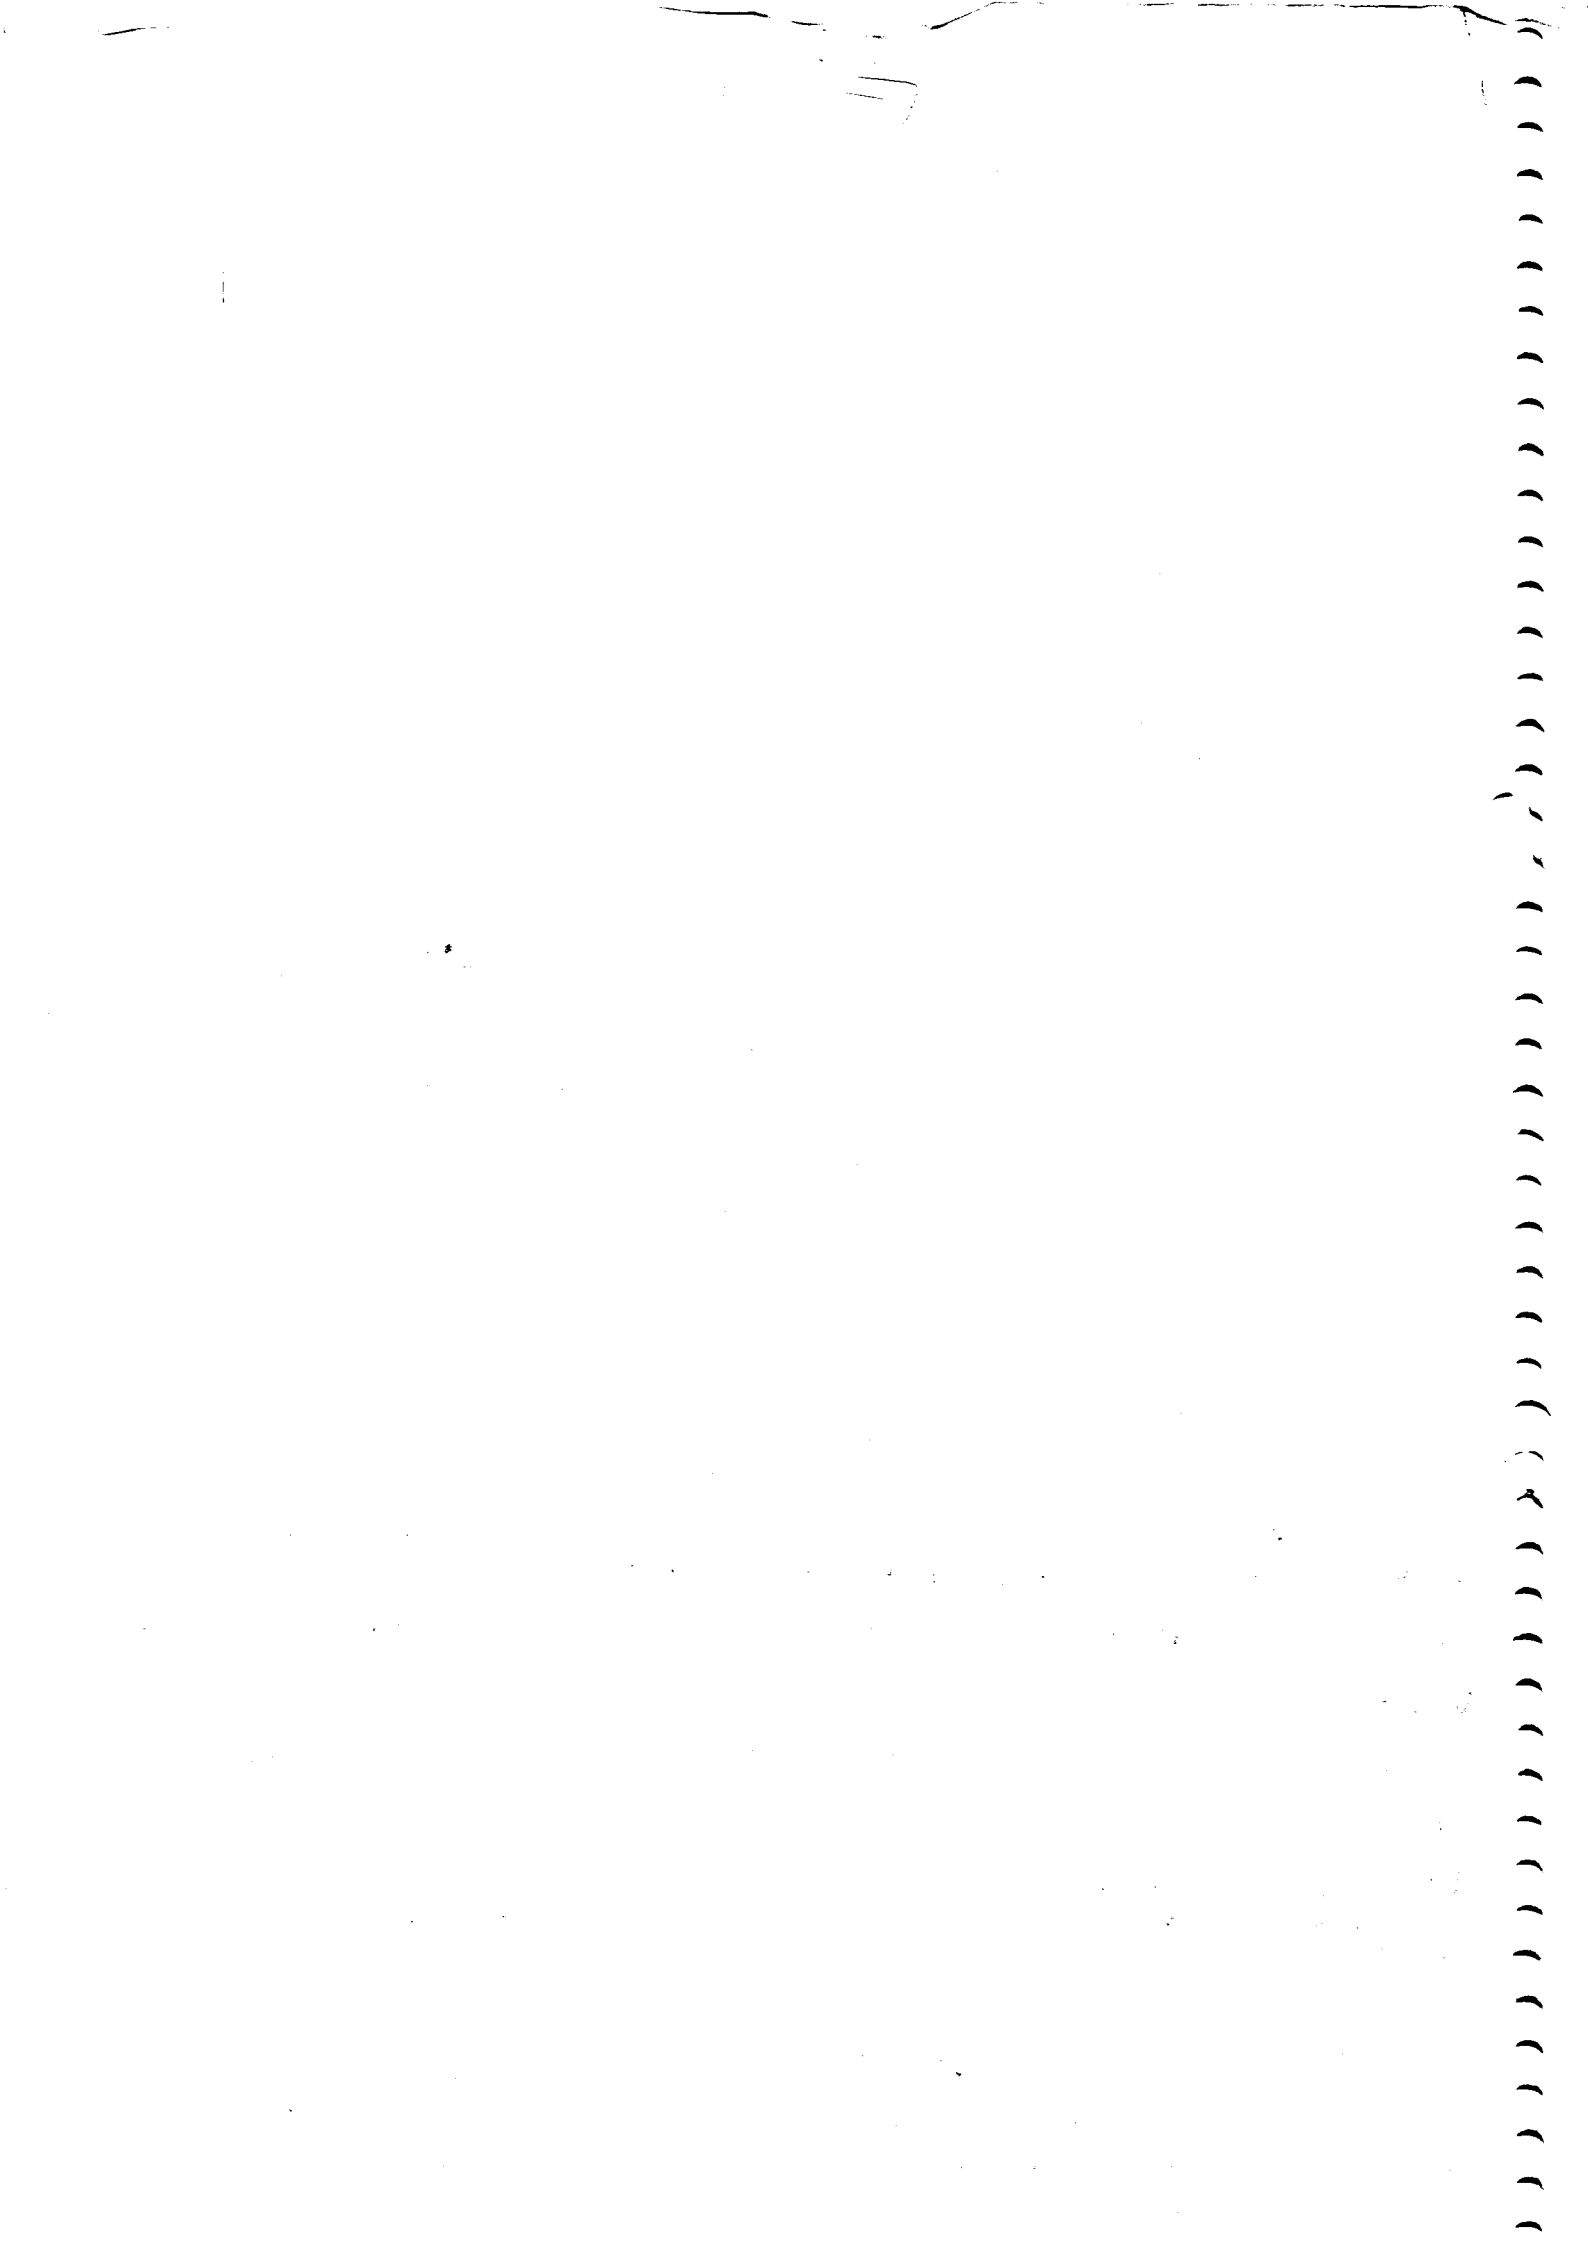
### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de fierro, lodos y escombros en la plataforma Sur-baja y plataforma Norte; además, conformación plataforma en la vía del colector escombrera El Traje. (Diurno y Nocturno)  
Disposición Final de fierro lodos y escombros en escombrera de Oyacoto  
Conformación y mantenimiento vial tramos de acceso a Oyacoto.  
Mitigación de polvos  
Conformación de vermas al rededor del cubeto de lodos  
construcción y colocación de tubería para descarga de agua

ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA


ING. MARTIN NUNEZ  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**ANEXO – 7**

**INFORME TOPOGRAFICO**



PROYECTO: Servicio de operación de Escombreras "ELTroje 4 Fase II y Oyacoto"

CONTRATANTE: Empresa Metropolitana De Gestión Integral de Residuos Solidos

CONTRATISTA: Consorcio El Troje Oyacoto

PLANILLA: No 7

PERIODO: Del 1 al 30 de Septiembre del 2017

## **INFORME TOPOGRAFICO**

---

### **1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

- . Adecuacion de las Zonas de trabajo
- . Ubicación de los puntos
- . Toma de datos en base a la ubicación de prisma

### **2- ELABORACION DEL REPORTE TOPOGRAFICO DURANTE EL PERIODO**

#### **COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

- . Registró de Niveles Iniciales
- . Registro longitudinal, áreas y volúmenes
- . Registro de equipo utilizado
- . Estación Total SOKKIA
- . 2 Prisma

#### **REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE 2**

La topografía realizada en el periodo 1al 30 de Septiembre Del 2017 se detalla a continuación poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin





# ESCOBRERA EL TROJE 4

## PLATAFORMA NORTE EJE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ELTROJE - GYACOTO

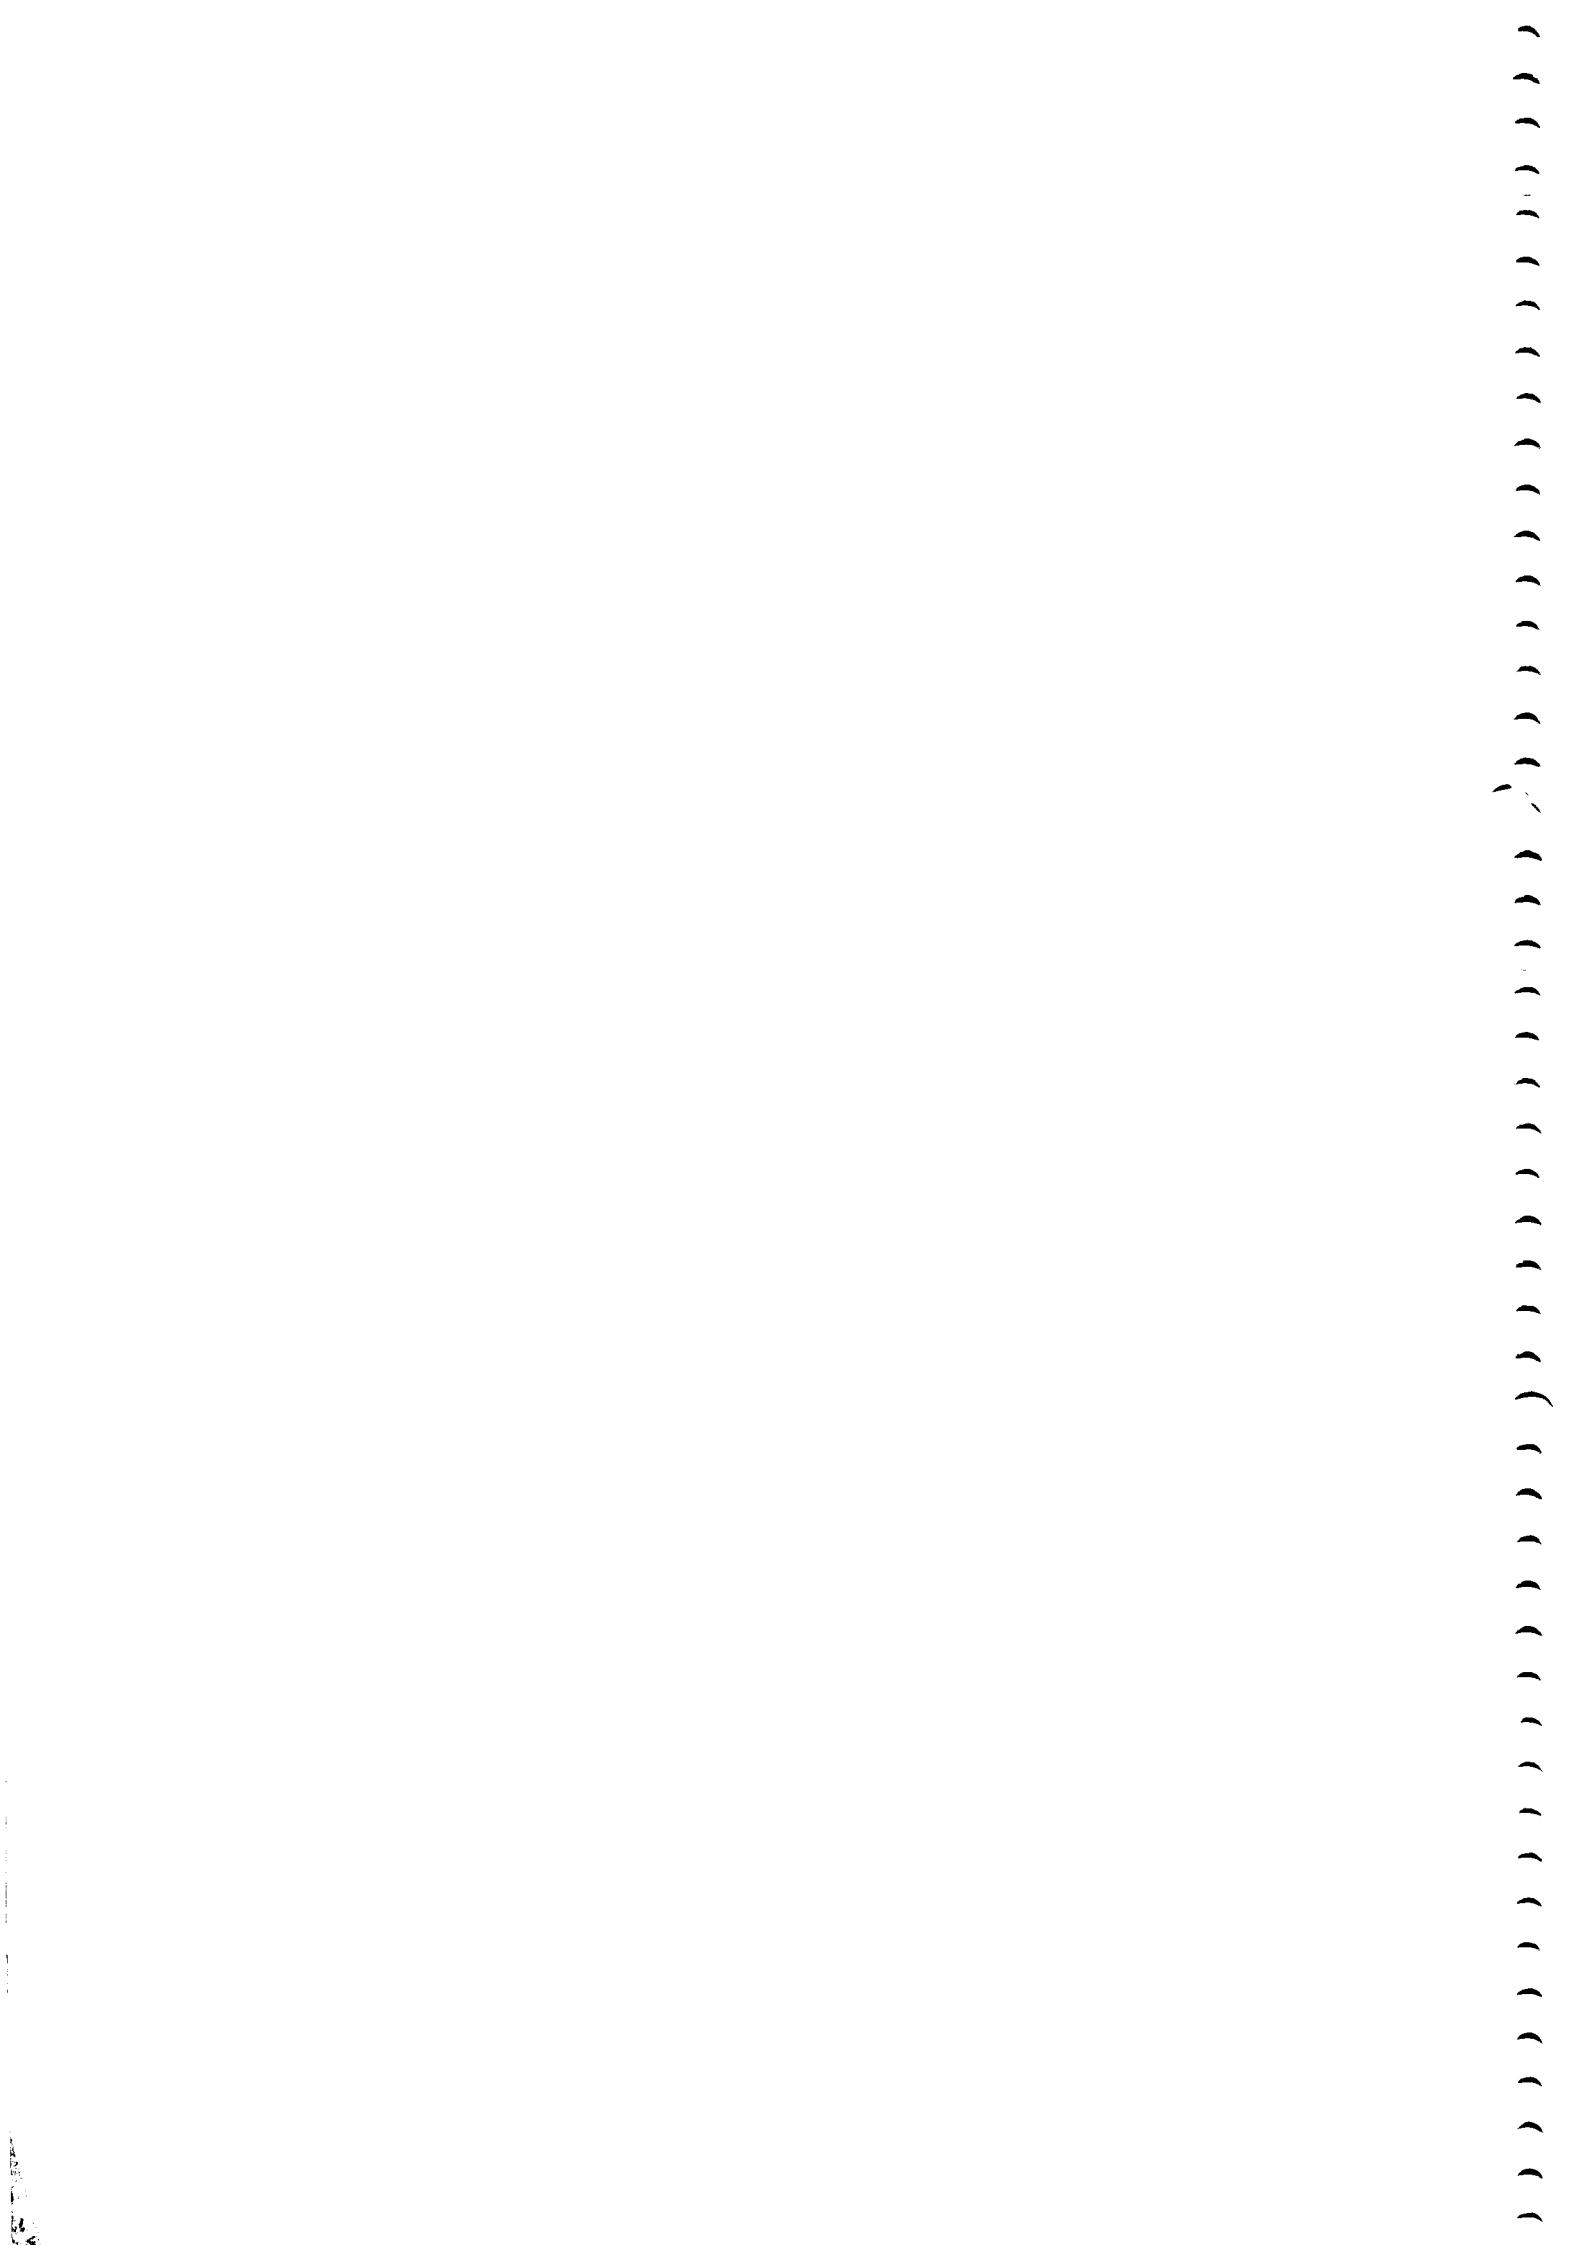
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULADO
0+000,00		111,68			
	40,00		169,60	6.783,80	6783,80
0+040,00		227,51			
	40,00		310,96	12.438,20	19222,00
0+080,00		394,40			
	40,00		792,59	31.703,60	50925,60
0+120,00		1190,78			
	40,00		1307,42	52.296,80	103222,40
0+160,00		1424,06			
	40,00		1039,76	41.590,40	144812,80
0+200,00		655,46			
	40,00		409,98	16.399,00	161211,80
0+240,00		164,49			
	17,00		121,20	2.060,32	163272,12
0+257,00		77,90			

VOLUMEN TOTAL EN M3

163.272,12

NOTA: Adjunto secciones transversales

VOL TOTAL 163.272,12+9.137,60+41.339,40= = 213.749,12 M3



## ESCOMBRERA OYACOTO

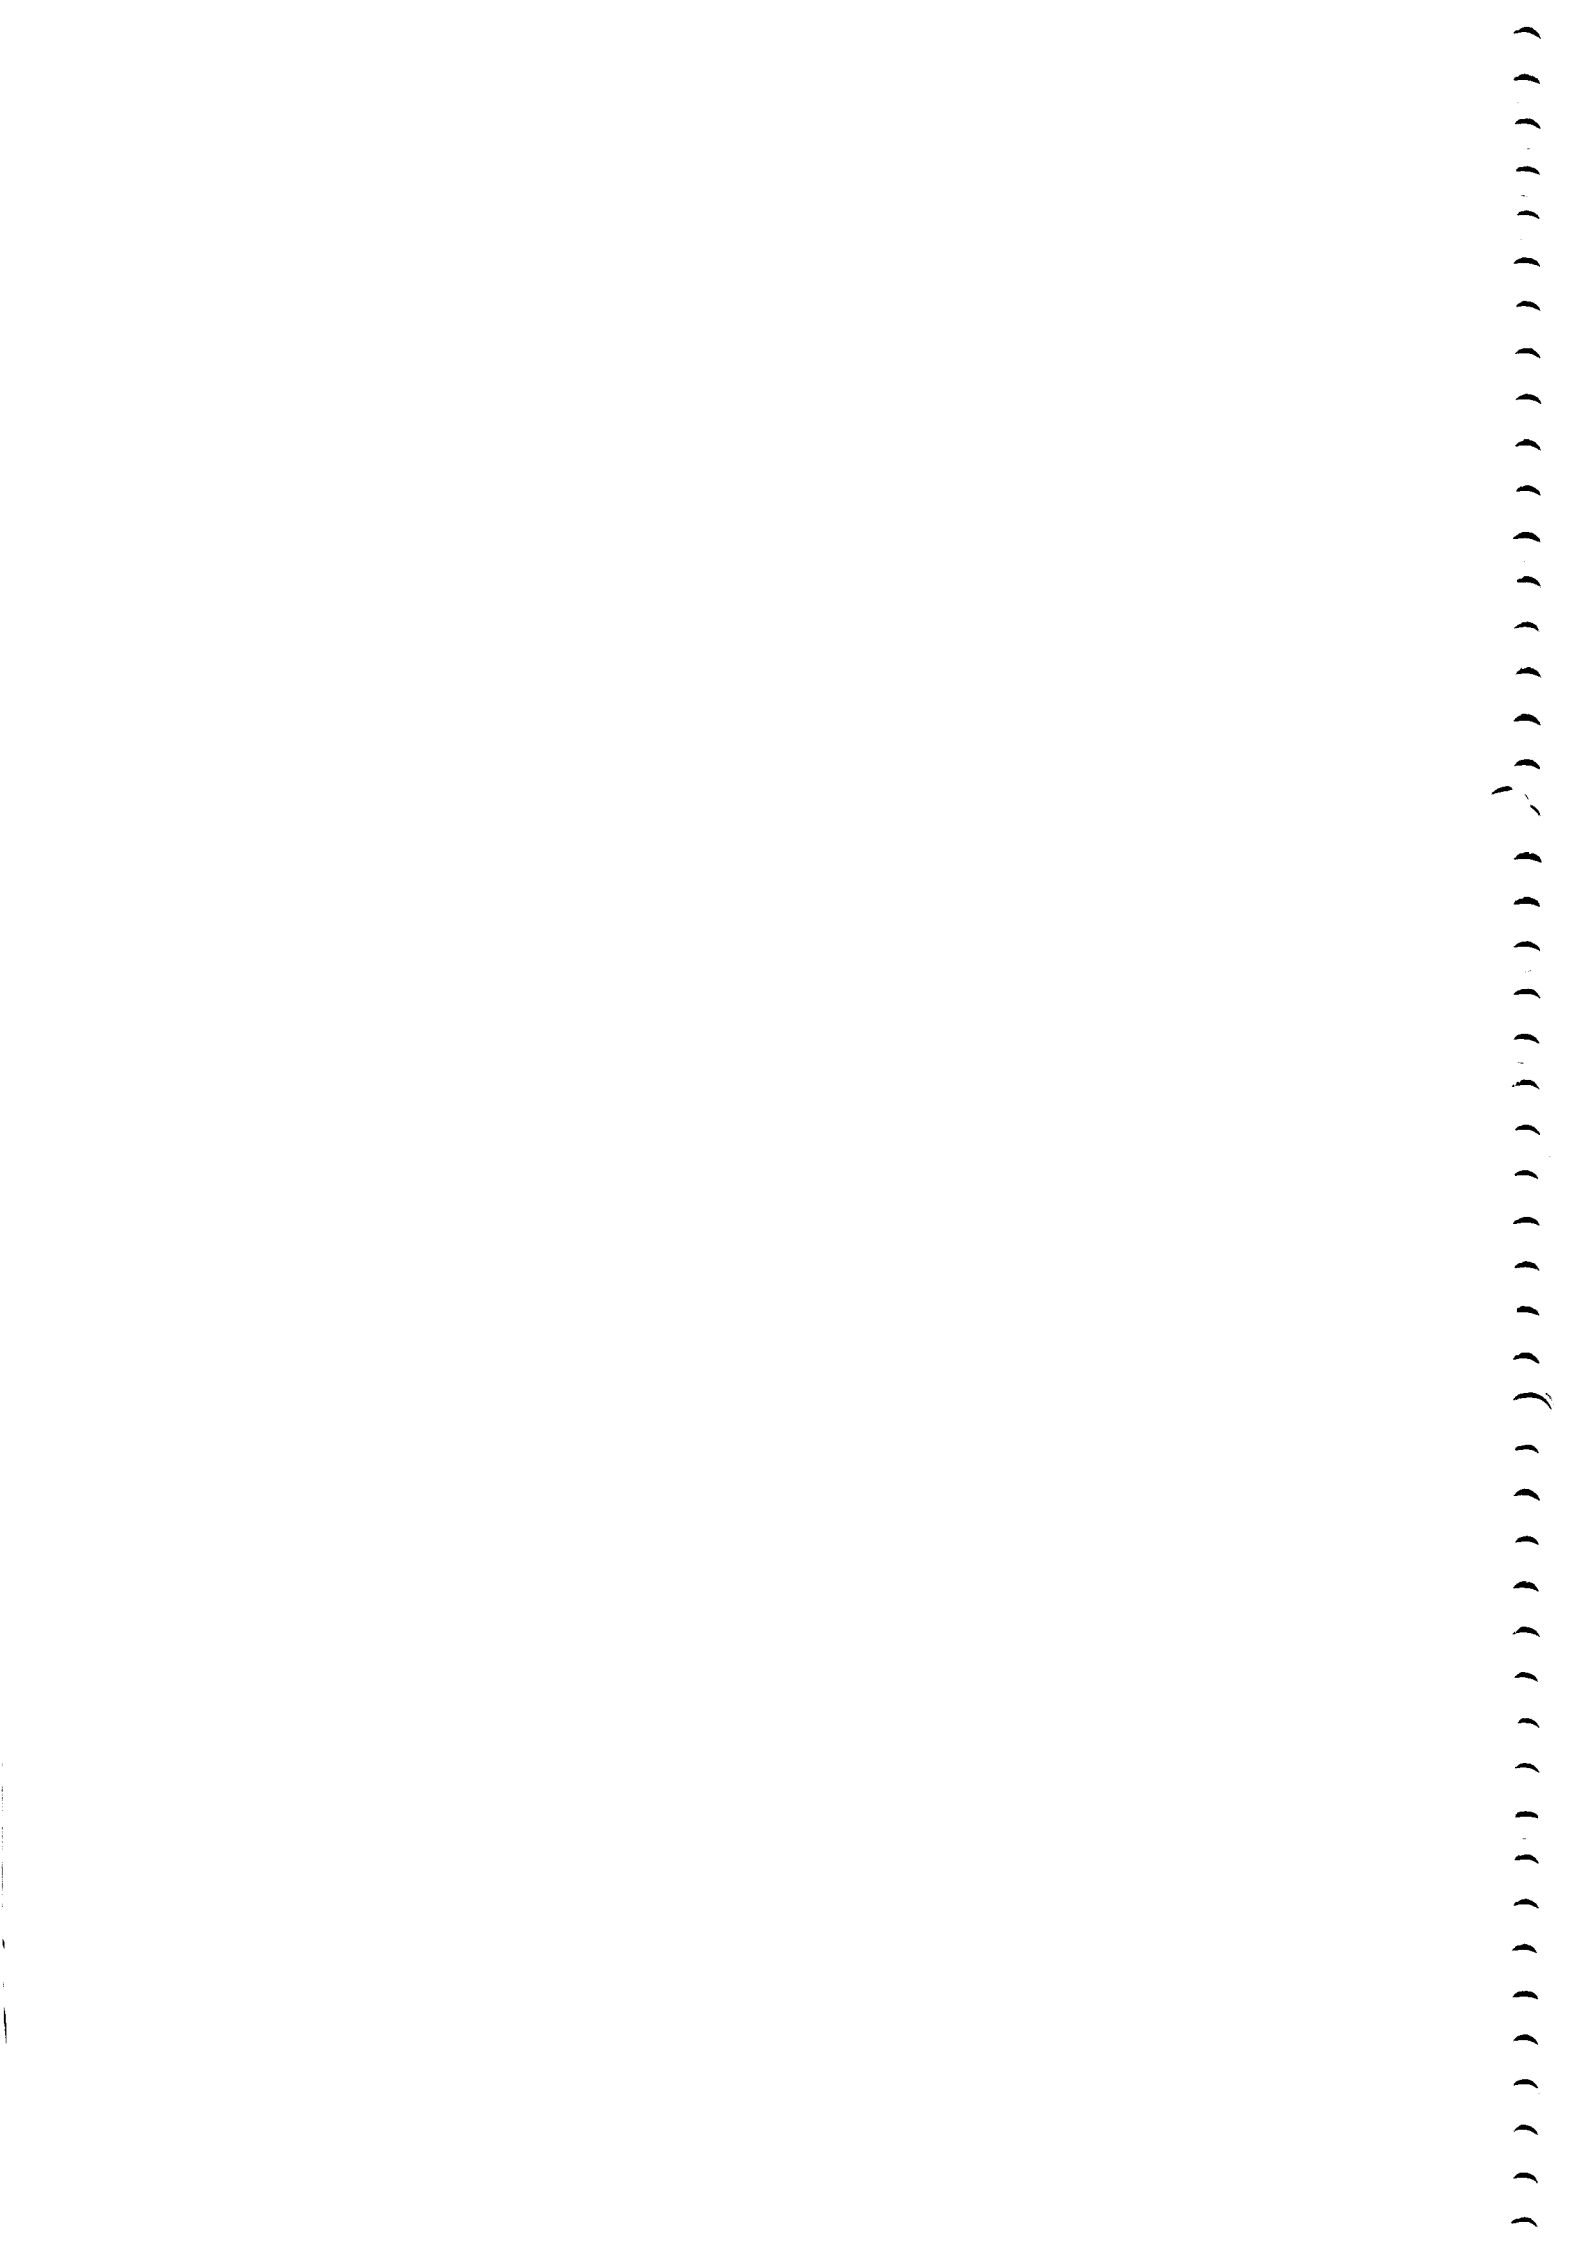
CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO.

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD
0+000,00		35,07			
	40,00		27,49	1.099,60	1099,60
0+040,00		19,91			
	40,00		29,67	1.186,60	2286,20
0+080,00		39,42			
	40,00		56,99	2.279,40	4565,60
0+120,00		74,55			
	40,00		45,78	1.831,20	6396,80
0+160,00		17,01			
	40,00		68,52	2.740,80	9137,60
0+200,00		120,03			

---

**VOLUMEN TOTAL EN M3      9.137,60**

**NOTA:** Adjunto secciones transversales



## ESCOMBRERA EL TROJE 4

### PLATAFORMA NORTE EJE 2

CONTRATISTA: CONSORCIO ELTROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN. m3	VOLUMEN ACUMULAD O
0+000,00		88,33			
	40,00		224,84	8.993,40	8993,40
0+040,00		361,34			
	40,00		231,52	9.260,80	18254,20
0+080,00		101,70			
	40,00		81,37	3.254,60	21508,80
0+120,00		61,03			
	40,00		495,77	19.830,60	41339,40
0+160,00		930,50			

**VOLUMEN TOTAL EN M3**

**41.339,40**

NOTA: Adjunto secciones transversales



Durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre el levantamiento topográfico en las escombreras del troje 4 y oyacoto nos ha dado un volumen dispuesto tendido y compactado en campo igual a 213.749,12 m<sup>3</sup>, los cuales han sido una mezcla de diferentes tipos de materiales. Se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de estos materiales en la Escombrera del troje 4 fase II y Oyacoto es aproximadamente de 25,00 % del volumen total de esta manera se realiza la siguiente comparación

Volumen Registrado en Topografía =213.749,12 m<sup>3</sup>

Volumen planillado =271.145,10 m<sup>3</sup>

Volumen Relativo factor compactación =Volumen registrado en topografía\*25,0%


100

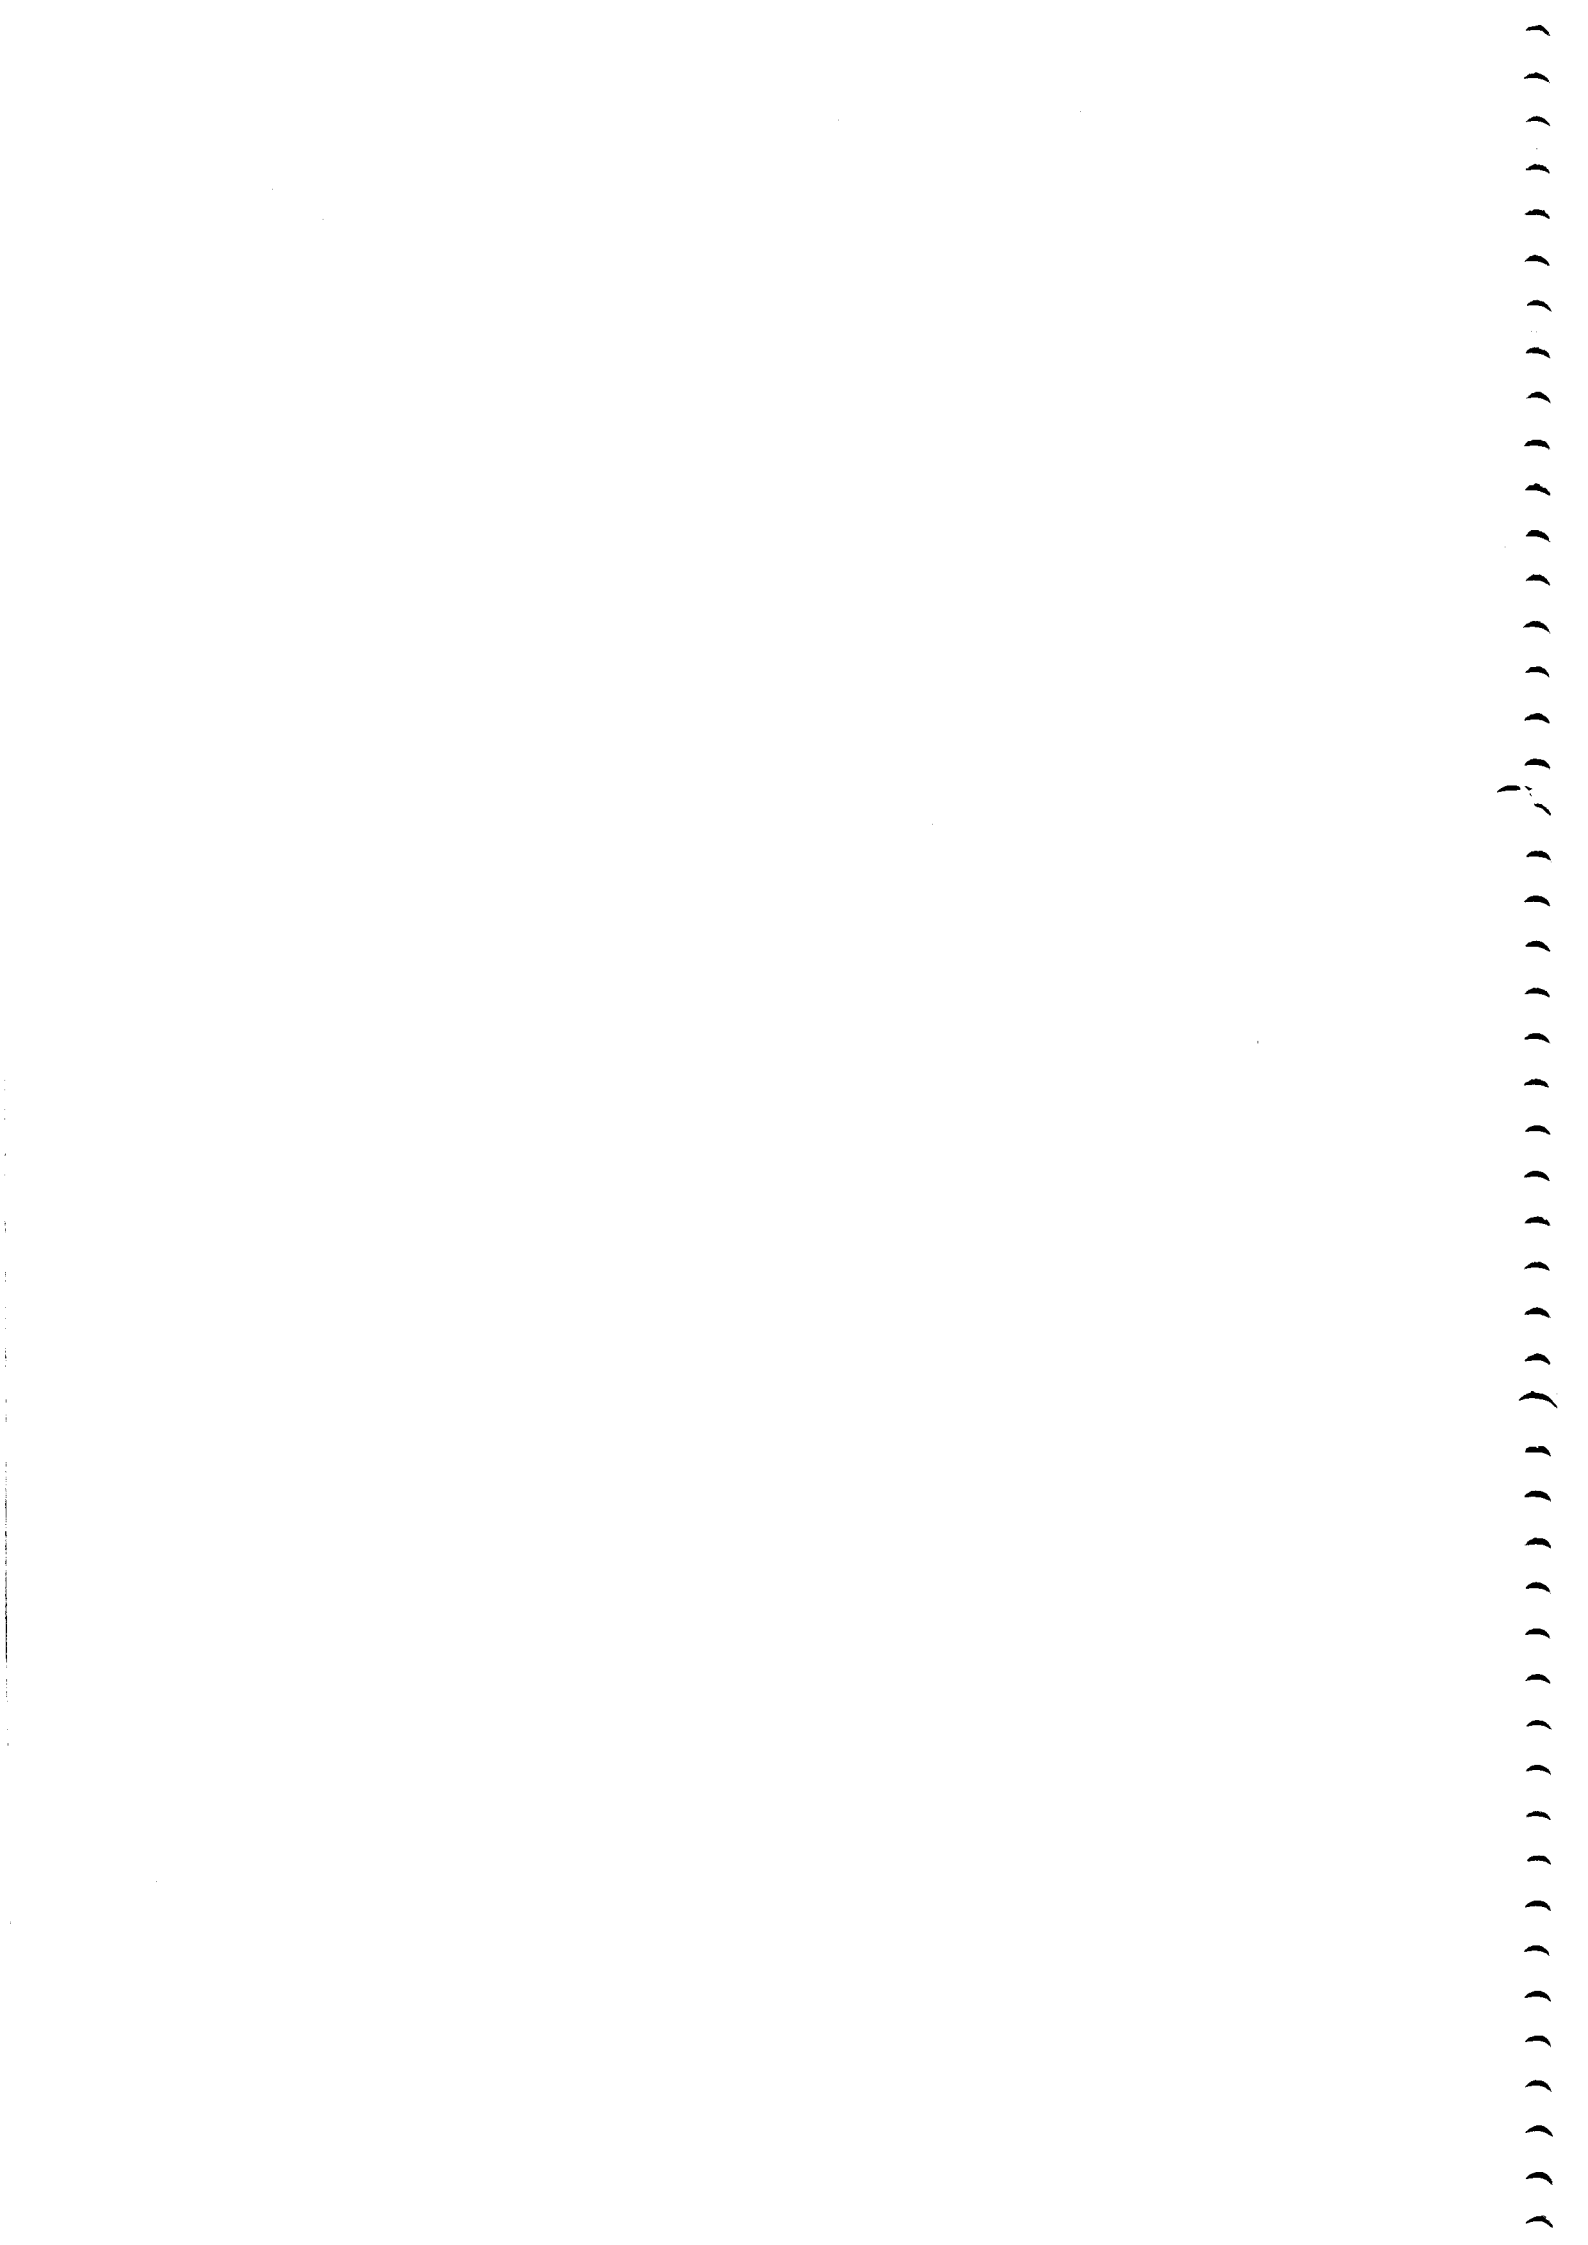
Volumen Relativo al factor de compactación =53.437,28 m<sup>3</sup>

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO=Vol. Real. Fact.Comp. +Vol Real. Top

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =267.186,40 QUE ES APROXIMADO AL VOLUMEN PLANILLADO

EN LAS ESCOMBRERA DEL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO

  
Ing. Fernando Tovar  
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO





## PLANOS ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

