

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000066

PROYECTO No. FECHA: 31 MAYO - 2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL Lodos, ESCOMBROS, Y SUELOS. PLATAFORMA SUR ALTA Y BATA. (STI)
RECEPCIÓN DE MATERIAL Lodos, SUELOS, Y SUELOS PLATAFORMA SUR Y TRATA (MOCIN)
LIMPIEZA DE VÍAS
FIZIONOMIA DE VÍAS
NO SE RECIBE CON NOMINACIÓN DE ESCOMBROS OYACATO UNA CERRADA POR LAS CONDICIONES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; MEXZ CARGAS ; BBTPOI - OYACATO
CITZOL
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA: ~~Recepción de escombros, tierra~~

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de escombros, tierra y lodos en plataforma Sur del traje. (Día)
- Conformación de diques (muros de contención) alrededor del cubeto ubicado en el lindero Sur de la escombrera.
- Recepción de lodos, en la plataforma en frente del cubeto y re conformación de la misma.
- Colocación de postes de luz eléctrica.
- Limpieza de la vía Av. Simón Bolívar.
- Mantenimiento de las vías de acceso.
- Mitigación de polvo en las escombreras de El Traje y Oyacato
- Disposición de escombros, tierra y lodos escombrera de Oyacato


FERNANDO BENÍTEZ
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000065

PROYECTO No. FECHA: 30 de Mayo 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAGE FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAGE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRERAS; Lodos y suelos en plataforma sur
occidental parte alta y baja
RECEPCIÓN DE MATERIAL SFCO Y Lodos AGUADOS PLATEFORMA SUR Y TRAGE (NOCHES)
NO SE RECIBEN EN ESCOMBRERA OYACOTO VÍA CERCA POR LAS CONDICIONES
CÓMO EN LOS TUBOS PARA DEPOSITO SOBRE VÍA TRAGE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ; 2 3 TRACTORES / 1 MANOVARADO
Otros: CAMION
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: - Conformación de muros de contención alrededor del cubeto
- Recepción de material de (escombros, tierra y lodos) en la plataforma
sur del trage; además, en la plataforma en frente del cubeto
se dispone.

- Limpieza de la Av. Simón Bolívar
- Mitigación de polvo en accesos a las escombreras El Trage y Oyacoto
- Movimiento de alumbrado eléctrico.
- Recepción de lodos, tierra y escombros en la escombrera de Oyacoto

INGO FERRNAND FERRNAND
CONTRATISTA

FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000064

PROYECTO No: FECHA: 27-MAYO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EN TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE LOSOS PLATAFORMA SUR PARTE APTA Y
RECEPCIÓN DE MATERIAL Y DE ESCOMBROS Y LOSOS DE TROJE 4 Y PLATAFORMA SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 15
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra;
Camión Cisterna: 1; REPARACIONES
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado >	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado >	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado >	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Confirmación de muros de contención al rededor del cubete
ubicado en la lindero sur del troje 4
- Disposición de escombros en la plataforma sur del troje durante el día;
además, en la plataforma ambiente del colector. (lodos, escombros y tierra)
- Mitigación de polvo en escombreras el Troje y Oyacoto
- Confirmación de vías paralela a la Av. Simón Bolívar
- Recepción de escombros, tierra y lodos escombrera del Oyacoto


ING. FERNANDO ROSALES
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000063

PROYECTO No. FECHA: 23 MAYO 2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS EL TRAMO 4 - FASE 2 Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSOREZO DE TRAJA - OYACUÑO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS SUR DEL TRAMO 4 Y
PUNTEO DE LOS MUROS Y ADJUNCIÓN DE MUROS DE CUBETO
LATERAL DE LAS VÍAS SEGUN BOQUEAN

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos .. ; Pata de cabra ..
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:
TARDE:
NOCHE:

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Mantenimiento de vías de acceso a las plataformas
- Conformación de muros de contención alrededor del cubeto
ubicado en el lindero sur de la escombrera el tramo 4
- Peinado de talud para la nueva vía de acceso paralela a
la Av. Simón Bolívar.
- Ampliación de plataforma en frente del cubeto
- Limpieza de Av. Simón Bolívar.
- Tendido y compactado de sub base en vías de acceso.



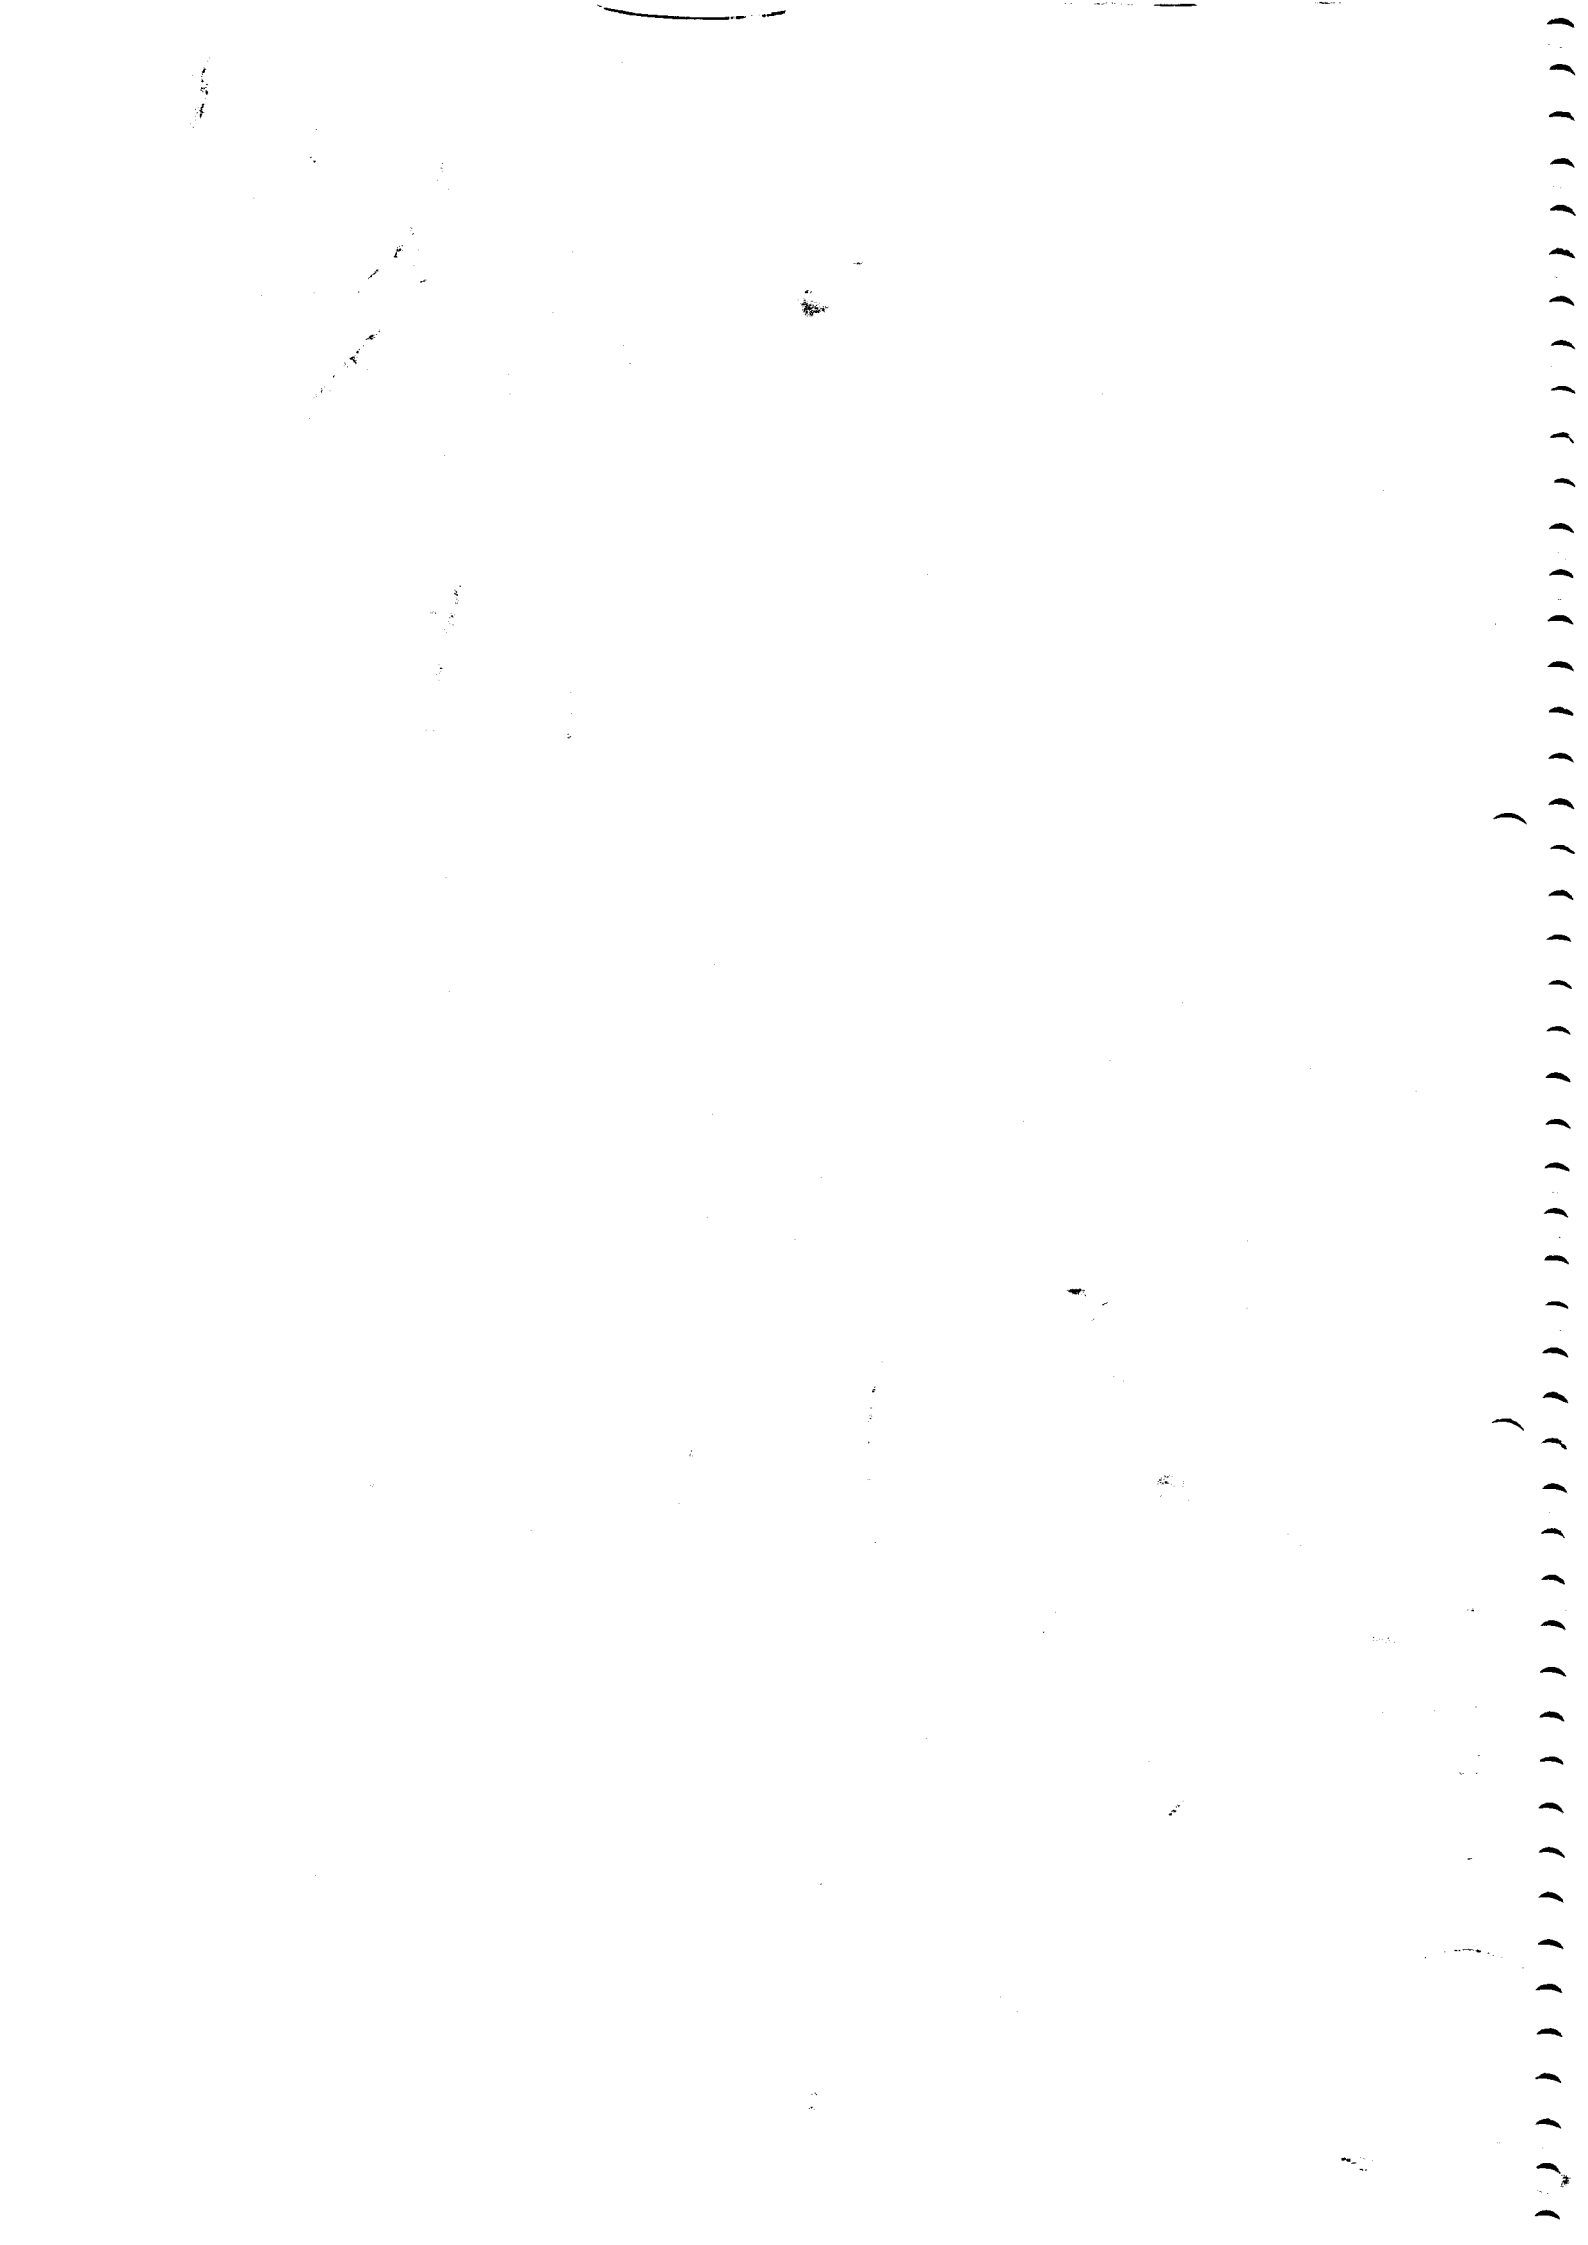
ING. ERWINO RIVERA
CONTRATISTA



FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000061

PROYECTO No. FECHA 26-MAYO-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CASABLANCA - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBRERA ESCOMBRERA OYACOTO
HIDRATACIÓN DE VÍA EN TRONCO Y OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBRERAS SUR DEL TRONCO Y 1

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: SUP. SEMIPLAZA TRS. 1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RESENERVACION - INTERCOMUNICACION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Confirmación de la vía paralela a la Av. Simón Bolívar
tendido, compactado, de sub-base

- Traslado de luz eléctrica.
- Recepción de escombros, tierra y bodos en la plataforma Sur del trazo 4
- Disposición de material (lodos) en el cubeto ubicado en el lindero Sur de la escombrera parte baja del trazo 03.
- Mitigación de polvo con la hidratación de vía.
- Recepción de bodos, escombros y material en escombrera Oyacoto
- Limpieza de vía Av. Simón Bolívar.


ING. FERNANDO PASCUAL
CONTRATISTA


129
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000060

PROYECTO No. FECHA: 25 DE MAYO DEL AÑO 2014 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS DEL OYACOTO
EMPRESA DE UTA
MANTENIMIENTO DE UTA EL TRONCO Y OYACOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR PARTE BAJA
DEL Y NOCTURNO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: SEÑALIZADOR TRONCAL

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; RETENEDORAS
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:
TARDE:
NOCHE:


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Conformación de la plataforma vial paralela a la Av. Simón Bolívar.
- Movimiento de postes de luz eléctrica existentes dentro la escombrera del troje.
- Recepción de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur del troje durante el día.
- Disposición de material (lodos) en el cubeto ubicado en el lateral sur de la escombrera, durante la noche.
- Limpieza de la vía (Av. Simón Bolívar).
- Recepción de escombros, tierra y lodos en la escombrera Oyacota
- Mitigación de polvos con hidratación de las vías de acceso.


ZTC FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


130
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000059

PROYECTO No

FECHA: 24-MAYO-2017 DÍA: Martes 15

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO
RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBROS EN TROJE Y OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR DE TROJE 4 Y TROJE 4 DEL YACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 17

AYUD. MAQ.: 7

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas -

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra

Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Conformación vía acceso paralela a la AV. Simón Bolívar.
Colocación de sub-base, tendido y compactado del material.


- Recepción de escombros y tierra en la plataforma sur del troje 4 durante el día.

- Disposición de lodos en el cubeta ~~en~~ plataforma del troje ubicada en el lindero sur del troje 4, parte inferior del troje 3.


- Limpieza de la AV. SIMÓN BOLÍVAR.

- Mitigación de polvos en las escombreras del troje y Oyacoto con el uso de tanquero.

- Recepción de escombros y lodos durante el día en la escombrera Oyacoto



ING. FERREROS ZAMORANO
CONTRATISTA



FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000058

PROYECTO No. FECHA: 23-Mar-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRONCO 4 FASIS 4 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
HIZOYERÍA DE VÍAS INTERIAS EN TRONCO 4 Y OYACOTO
HIZOYERÍA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA TRONCO 4 Y TRONCO 4 (SUR)
DEL Y RECARGA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; BOMBA
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Conformación de nueva vía de acceso a la escombrera
paralela a la AV SIMÓN BOLÍVAR
- Movimiento de postes de luz eléctrica existentes
- Disposición de escombros y tierra sobre la plataforma sur. (Día
- Recepción de bodos en el cubeto ubicado en el lindero sur
de la plataforma del troje 4 (moche)
- Limpieza de la vía AV SIMÓN BOLÍVAR.
- Recepción de materiales, escombros, tierra y lodos en la escombrera
de Oyacoto. Mitigación de polvo con el uso de tanquero.


FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000057

PROYECTO No. FECHA: 22-MAYO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTA

CONTRATISTA: CONSORCIO - UTMUS OYACOTA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS OYACOTA
PREPARACIÓN DE LOTES Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL DEL TROJE 4
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE Lodos EN PLATAFORMA DEL TROJE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; PLATAFORMA SUR
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Disposición de material en la plataforma sur durante el día. Operación normal conformación de nueva vía de acceso paralela a la Av. ~~El~~ Simon Bolivar
- Durante la noche recepción de lodos en el cubeto ubicado en el lindero sur de la escombrera troje 4 fase II.
- Recepción de escombros y lodos en la escombrera de Oyacota
- Mitigación de polvos con el uso de tanquero.
- Limpieza de la Av. ~~El~~ Alberto Simon Bolivar uso de motoniveladora.


Sr. FERNANDO RODAS
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000056

PROYECTO No FECHA: 21-11-2017 DÍA: Domingo
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRINTE 4 FASE II Y OYABATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRINTE - OYABATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
LIMPIEZA DE YES
MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores: 4 ; Cargadoras: 4 ; Excavadoras: 3 ;
Motoniveladoras: 2 ; Volquetas: ..
Rodillos lisos: 1 ; Neumáticos: .. ; Pata de cabra: ..
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

TRABAJO, DE MANTENIMIENTO EN ESCOMBRERAS



ING. ESTEBAN ROJAS
CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000055

PROYECTO No. FECHA: 20 - MAYO - 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROSB Y FISS II Y OYALTO

CONTRATISTA: CONSOLCZO - EL TROSB - OYALTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS Y ESCOMBRAS EN ESCOMBRERAS - OYALTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS Y ESCOMBRAS PLATAFORMA SUR DEL TROSB Y
RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS Y SEMAS PLATAFORMA TROSB 3
57 TELAHERA EL HOSPITALITO DEL TROSB EP. VIA SOBRIA TROSB 2

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROCAMIONES
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Disposición de material y operación de Escombreras en BIRS - EP, sin novedad.
- Limpieza de Av. Jirón Bolívar
- Control de Puntos de Escombreras.


Luis Fernando Rosales
CONTRATISTA

135


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000054

PROYECTO No. FECHA: 17-11-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO Y FASE II Y OYNITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYNITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBRERAS OYNITO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBRERAS PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y AREAS PLATAFORMA - TRONCO A
CONSTRUCCIÓN DE VÍA SOBRE TRONCO 2.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE LOSOS Y ESCOMBRERAS PLATAFORMA SUPERIOR POR TRONCO A (VIA)
- RECEPCIÓN DE LOSOS DEL RETRO EN LUGAR CONSTRUIDO EN LUGAR SUR OCCIDENTAL.
- CONTROL DE POLVO EN ESCOMBRERAS
- UPIAZA AV. JIJON BOLIVAR.
- RECEPCIÓN DE TODO MATERIAL DE ESCOMBRERAS Y LOSOS EN ESCOMBRERAS OYNITO


ING. FERNANDO RIQUELME
CONTRATISTA

136


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000053

PROYECTO No. FECHA: 18-MAYO-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA RECEPCIÓN DE LUGOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS - OYALOTO
RECEPCIÓN DE LOS ESCOMBROS SUR OCCIDENTAL TRONC 4 DEJ
RECEPCIÓN DE LOS Y SECS EN PLATAFORMA DEL TRONC 4 LOCAL
SE SANAN AMPALLOS DE PASTA PARA SU REHABILITACION

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPOGRAFOS: 3
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETIRO EXCAVACION
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado X Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte X
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti X Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RETIRADA DE PASTA DE AMBROSOS PIGMENTOS A SER REHABILITADOS EL TRONC 4 FASE II
- RECEPCIÓN DE LOS Y SECS EN PLATAFORMA DEL TRONC 4 LOCAL
- RECEPCIÓN DE LOS ESCOMBROS SUR OCCIDENTAL TRONC 4 DEJ
- RECEPCIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PLATAFORMA DEL TRONC 4 LOCAL
- RECEPCIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PLATAFORMA DEL TRONC 4 LOCAL


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000052

PROYECTO No FECHA: 17-MAYO-2017 DÍA: VIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE 4 FASE II Y OYALTO

CONTRATISTA: CONCURSO EL TRUJO - OYALTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE LOSOS Y ESCOMBROS ESCOMBREAS - OYALTO
RECEPCION DE LOSOS Y SECA PLATAFORMA SUP O HORIZONTAL DEL TRUJE 4 DES
LA EMPRESA DE US
RECEPCION DE LOSOS DURANTE LA NOCHE SOBRE EL TRUJE 3
SE RECALZA Y SE DESALOTA EN CONSTRUCCION DE VTC SOBRE EL TRUJE 2

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas - ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos - ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORAS
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- DISPOSICION DE MATERIALES Y OPERACION DE ESCOMBRE
RAS SIN NINGUNA NOVEDAD
- CONTROL DE PONDOS ESCOMBREAS.

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

138

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000051

PROYECTO No. FECHA: 16 MARZO - 04 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR (DIA)
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y SBOOS EL TRASE 4 (NOCHES)
CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO SOBRE EL TRASE 4
LIMPIEZA DE PLATAFORMA SUR DURANTE LA NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORAS
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado X	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti X	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR SUPERIOR TRASE FASE II (DIA).
- RECEPCION DE LODOS RESTO A LOS LUGAR SITUADO EN PLATAFORMA SUR INFERIOR TRASE 4.
- RECEPCION DE MATERIALES ESCOMBROSA OYACOTO
- CONTROL DE PUNTO ESCOMBROSA.
- VIGILIA AV. SIMON BOLIVAR


CONTRATISTA:
LOS FERNANDO POLOCE


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000050

PROYECTO No. FECHA: 15-MAYO DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE-OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos Y ESCOMBROS TRASE 4 PLATAFORMA SUR
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos Y ESCOMBROS EN OYALOTO
RECEPCIÓN DE Lodos Y MATERIAL SECO TRASE 4 DURANTE LA NOCHE
CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SOBRE EL TRASE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; RETIRO DE CAJONERA
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado X Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti X Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte X

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

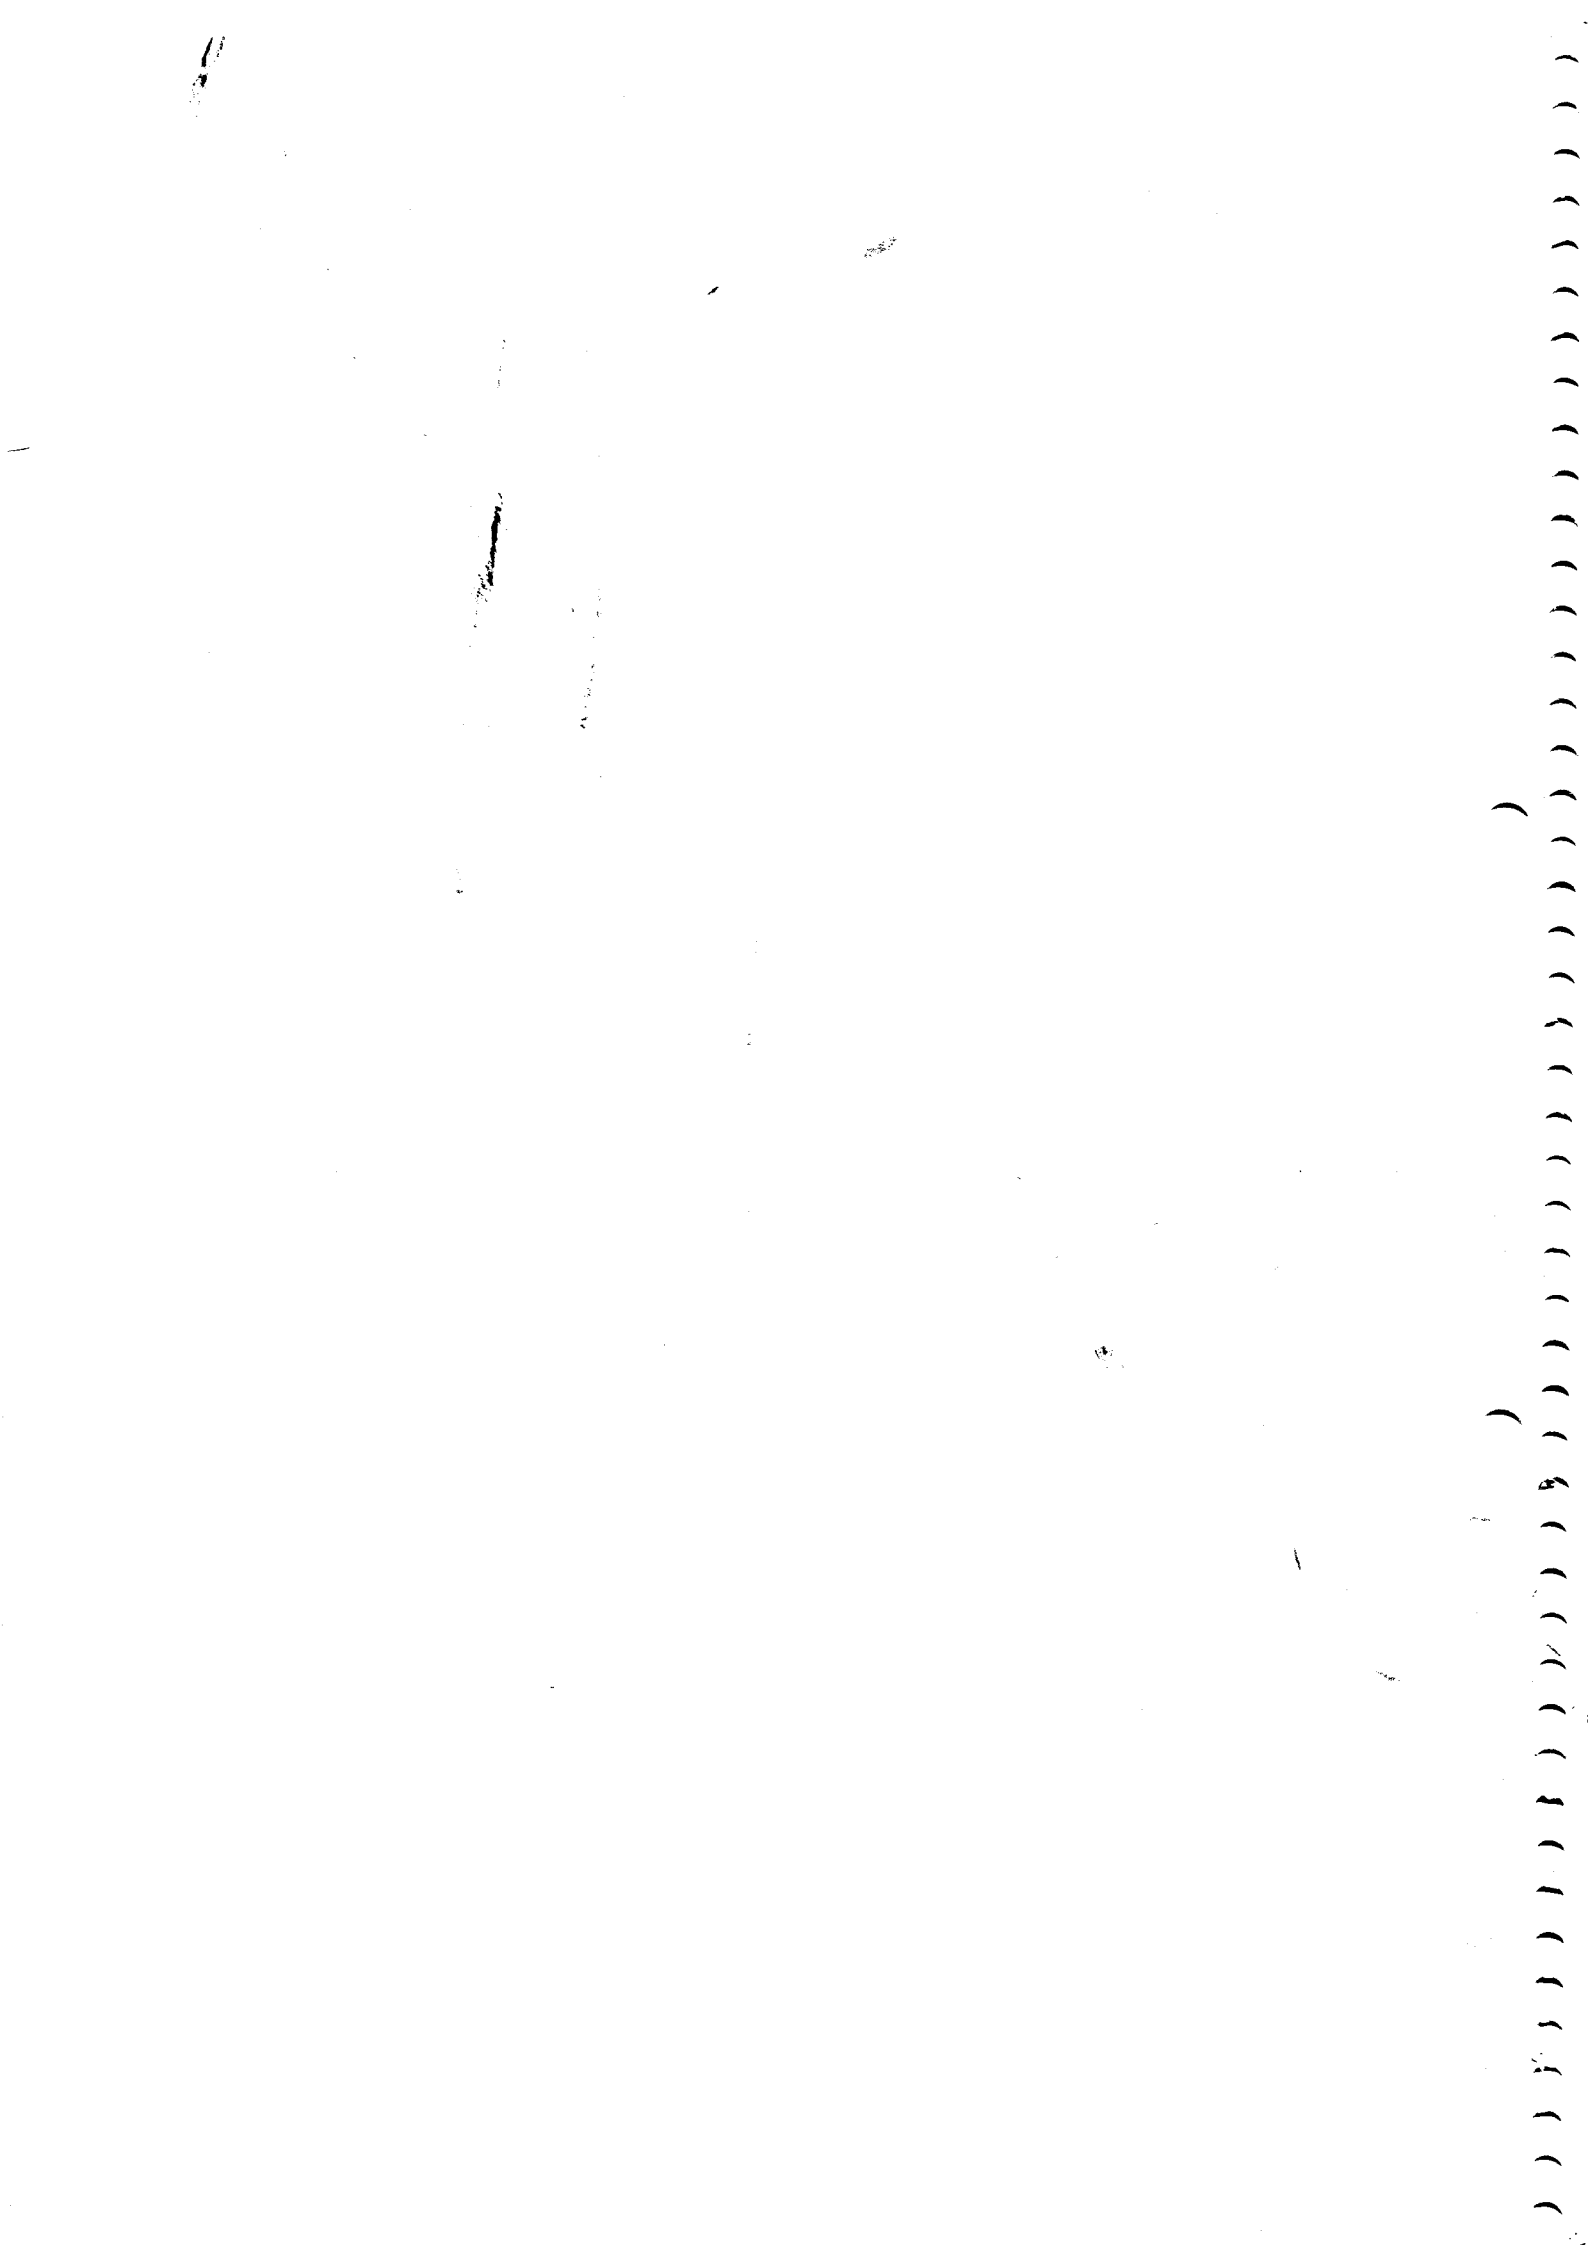
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION DE ESCOMBRENA FUGIBS-EP, 114 NOVEDAD, TRASE 4 EN TRASE 4 FASE II OYALOTO.
- LIMPIEZA AV. JI?OH BELINAR.
- CONTROL DE POLVOS DE ESCOMBRENA.


CONTRATISTA
DR. FERNANDO GARCIA

140


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000049

PROYECTO No. FECHA: 14 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TIPOSO A FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TIPOSO - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS: ✓
ARREGLO DE PLATAFORMA SUP
LIMPIEZA DE VTA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS: 2

OPERADORES: 4

AYUD. MAQ.: 1

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ARREGLO DE PLATAFORMA IVE (RECONFORMACION) + COYALOTOS TRONCA
- REARREGLO DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMAS SUPERIORES TRONCA Y FASE II
- REARREGLO DE MATERIALES EN PLATAFORMA DE OYALOTO.
- CONTROL DE POLVOS EN PLATAFORMA.

2

CONTRATISTA
ING FERNANDO RIVERA

141

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000048

PROYECTO No. FECHA: 13-MAYO-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRUJE 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIALES LIGOS, SECOS; ESCOMBROS PLATAFORMA SUR Y TRUJE 3
- RECEPCIÓN DE MATERIAL LIGOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS OYALOTO
- CONTROL DE VÍA INTERIAS Y EXTERIAS
- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO POR EL TRUJE 2.
- ARMADO DE PLATAFORMA EN TRUJE 3

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Disposición de MATERIALES ES ESCOMBROS EN GIRSIPT, TRUJE TRUJE 4 FASE II Y OYALOTO SIN NINGUNA NOVEDAD.
- CONTROL DE POLVOS ESCOMBRERAS
- LIMPIEZA AV. SIMON BOLIVAR.

CONTRATISTA
LAS FELICIANO BAZQUEZ

142

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000047

PROYECTO No FECHA: 12 MAYO-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSOLIDO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL ZONAS SECOS ; ESCOMBRAS PLATAFORMA SUR
- RECEPCION DE MATERIAL LIJOS Y ESTAMBLOS ESCOMBRERAS - OYACOTO
- SE PONIA FUJO DE PROTECCION DE CUBOTO
- SE LIMPIA - JAS INTERNAS Y EXTERNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ; RETROCAMION
Otros:
En reparación: TRAC DEK
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE SIGUE CONSTATANDO DIVULG DE LOSIENCIÓN PARA CUBOTA TRONC FASE II, PARA RECEPCION 10201 DEL TRONC
- RECEPCION DE MATERIAL HUMEDO Y SECO PLATAFORMA SUPERIOR SUR TRONC F II
- CONTROL DE POLVOS ESCOMBRERAS
- LIMPIEZA DE AS. LINDA BORDAR
- RECEPCION DE CUBOTA, SE CO LO ESCOMBRERAS DE OYACOTO.


CONTRATISTA
LOS FERREROS BOGOS

143


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000046

PROYECTO No. FECHA: 11-MAYO-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE CONSTRUYE AMPLIACION DE CUBIERTO VADO SUR - PARTE POSTERIOR.
- SE RECIBE MATERIAL DE LADRILLOS Y ESCOMBROS PUTREFACTOS SUR
SE LIMPIA VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
SE TRANSPORTA - SE CARGA TAMBIÉN CON TRESORAMIENTO VÍA DEL ACCESO AL TRAJE 4
SE RECIBE MATERIAL DE LADRILLOS Y ESCOMBROS EN OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
Motoniiveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- SE ABRIÓ EL CUBIERTO EN TRAJE 4 FASE II, PARA RECEPCIÓN DE LADRILLOS.
- RECEPCIÓN DE LADRILLOS Y YESOS EN PLATAFORMA SUPERIOR DEL TRAJE 4.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL MUEBDO Y YESO EN ESCOMBRERA OYACOTO.
- CONTROL DE VOLUMEN ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA
RHC FERNANDO RAMIREZ


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000045

PROYECTO No. FECHA: 10-11-2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO FASE II Y OYALCÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO - OYALCÓN
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE LOTES, SECCS Y ESCOMBRAS EN PLATAFORMA SUR
RECEPCION DE LOTES TRONCO
SE LEVANTA PUNO DE CUBRTO
SE COLA MATERIAL DES METAMATERIAL VIA DE ACCESO PLATAFORMA SUR Y TRONCO
SE TRABAJA MATERIAL EN PLATAFORMA SUR EN LA NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ..
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos .. ; Pata de cabra ..
Camión Cisterna: 1 ; RETROCAMION
Otros: ..
En reparación: D.E.K.
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

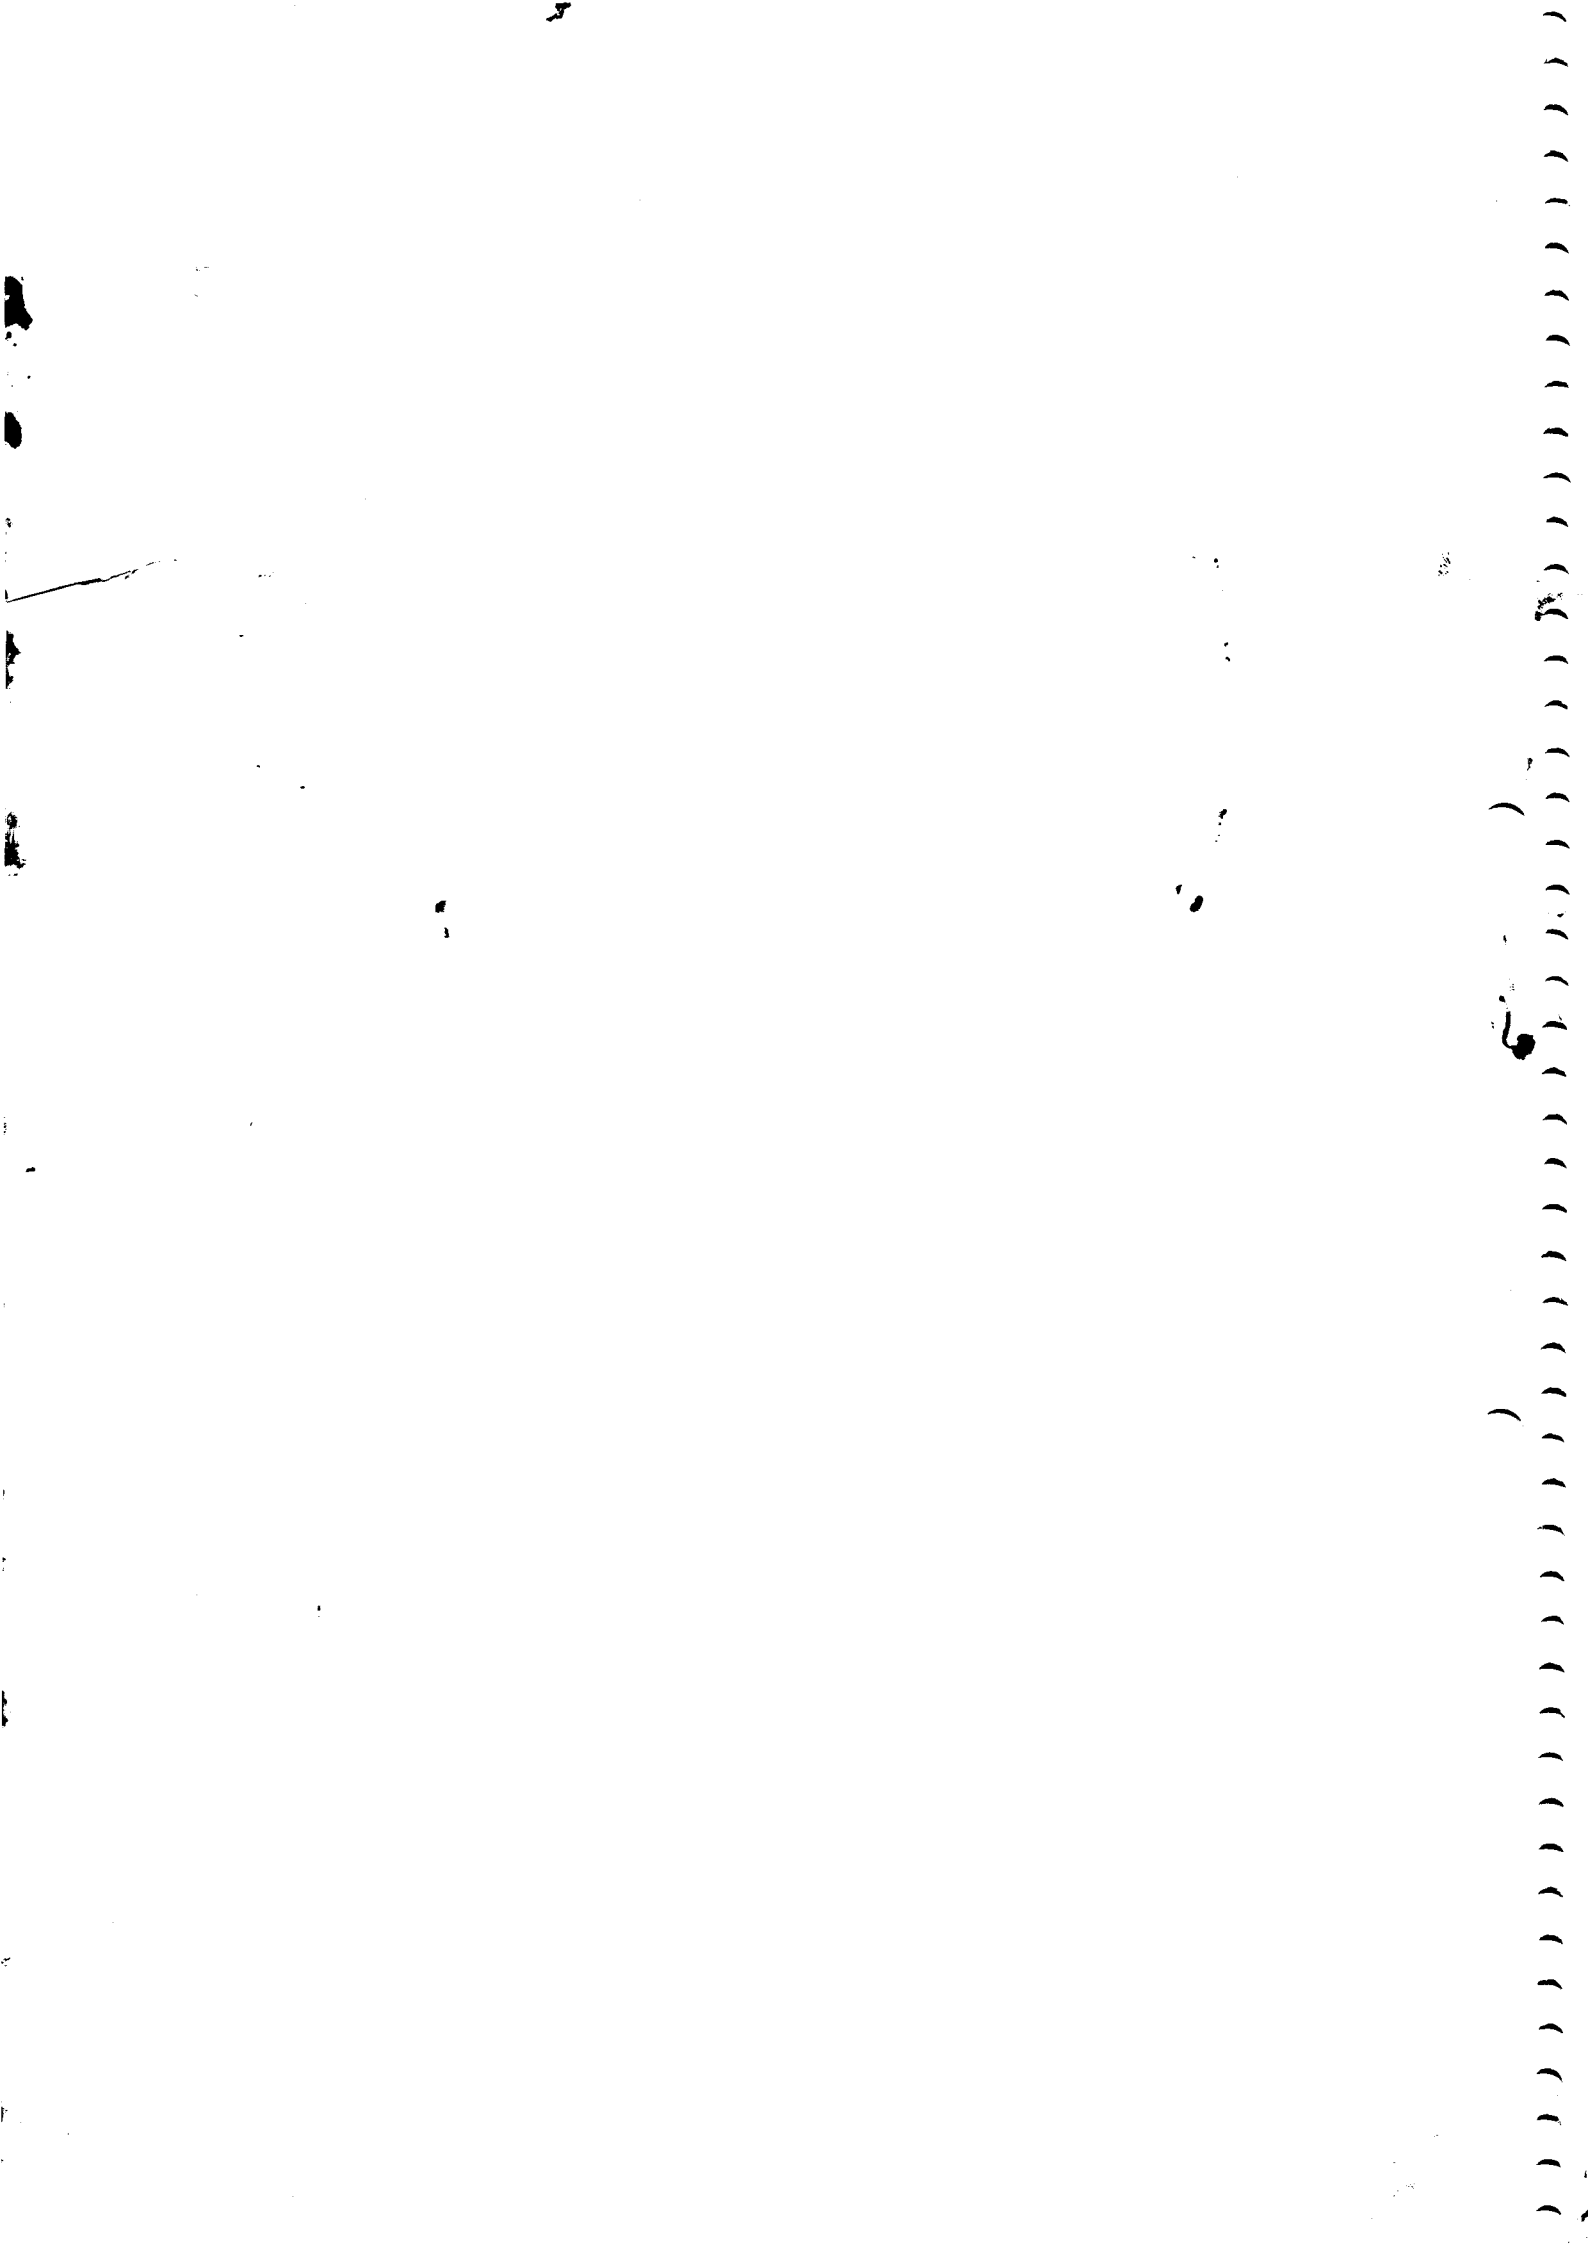
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE LEVANTA DIONE DE LOS TENDIDOS PARA LOS LOTES TRONCO Y FASE II, PARA RECEPCION DE LOTES.
- RECEPCION DE MATERIAL SECO PLATAFORMA SUR SUPERIOR TRONCO Y FASE II
- COSTAL DE PAVIMENTACION ESCOMBRERAS
- RECEPCION DE LOTES Y SECCS EN LA PLATAFORMA SUR OYALCÓN.


CONTRATISTA
LOS FERNANDEZ


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000044

PROYECTO No. FECHA: 9 MAYO 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRONTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE Lodos y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR 324
RECEPCIÓN DE Lodos y SECOS PLATAFORMA TRONTE 4 NOCHE
LIMPIEZA DE XIS
SE COMIENZA MATERIAL DE VIEJAMENTO VIA DE ACCESO TRONTE 4 Y PLATAFORMA SUR DEL
TRONTE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
YUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: RESTAURACION EN OYACOTO
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado X Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte X

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION EN ESCOMBRERAS TRONTE 4 FASE II y OYACOTO SIN NOVEDAD.
- CONTROL DE FOLIOS EN ESCOMBRERAS
- LIMPIEZA DE AV. SINY BOVIA.


CONTRATISTA
ING. FERNANDO BUCATE

146


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000043

PROYECTO No..... FECHA: 8 - MAYO 2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS - EL TRUJE FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECIBEN DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR Y TRUJE A NOCHE
LIMPIEZA DE VÍAS
TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE MATERIAL PARA VÍAS DE NECESARIO TRUJE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Recepción de lodos en plataforma SUR en el día y a la noche se reciben lodos en plataforma SUR TRUJE FASE II
- Limpieza de Vías Internas y Externas y Truje a Fase II
- Control de Pólvoles en 107.315.107 FPGIRS-EP
- Recepción de materiales en Escombreras de OYALOTO


CONTRATISTA
D.G. Fernando Ferrer


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000042

PROYECTO No. FECHA: 7-MAYO-07 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TROTE 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE ADECUACION DE PLATAFORMA SUR
A TRAVÉS DE
ARREGLA DE PLATIFORMA SOBRE EL TROTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

1
2
1
1

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:
TARDE:
NOCHE:

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ADECUACION DE PLATAFORMA SUR PARA RECEPCION DE MATERIAL EN EL TROTE 4 FASE II
- UNPIEZA DE AR. SINON BOJAR.
- DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRERAS DE OYACOTO.
- CONTROL DE PUNOS EN ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA:
Luis Fernando Priati



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000040

PROYECTO No. FECHA: 6 MARZO 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRAZO OYALOTO -

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAZO - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y LÍQUIDOS PLATAFORMA SUR.
RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS PLATAFORMA TRAZO DURANTE LA NOCHE
LÍQUIDOS DE LOS
REPOSICIÓN DE MATERIAL VÍA DE ACCESO AL PLATAFORMA TRAZO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: CAMION
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE TODOS EN LUGAR CONSTRUIDO EN TRAZO A FASE II, PLATAFORMA INFERIOR SUR. T
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SÓLO EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR. TRAZO A FASE II
- LÍQUIDOS EN LUGAR BOMBA.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL EN ESTACIONERA DE OYALOTO
- CONTROL DE PUNOS ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA:
EL CONSORCIO EL TRAZO - OYALOTO

149


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000039

PROYECTO No FECHA: 5 MAYO - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS TRUJILLO 4 FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO BELMONTA -
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE ESCOMBROS Y LIXOS PLATAFORMA SUR DURANTE EL DIA
LIMPIEZA DE VÍA INTERNA Y EXTERNA
RECEPCION DE BOLSAS EN EL TUBO DE CUBIERTO
SE CONSTRUYE MURO DE PROTECCION CUBIERTO SUR OCCIDENTAL PARTE BAJA
SE REALIZA DIRECCION DE PLATAFORMA SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación: TRACTOR 6/6 ZAPATA
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION EN ESCOMBRERAS F-6 IRS - EP SIN NINGUNA NOVEDAD.

CONTRATISTA
ZAS. FERRER PUARU

150

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000038

PROYECTO No. FECHA: 4 Mayo DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASEA 4 FASE II Y STACADO

CONTRATISTA: CONSORCIO TIOJA - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- SE RECIBE LORO EN ESCOMBRERA - STACADO
- LIMPIEZA DE VES
- SE RECIBE LORO Y MATERIAL SECO EN ESCOMBRERA NORTE Y SUR
- SE RECIBE LORO EN PLATAFORMA DEL TRASEA 4 INTERIOR.
CONSTRUCCION DE VIGERIA DE MANTENIMIENTO VES DE ACCESO TRASEA 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 15
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6 ; Cargadoras ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación: TRASEA DE INTERIOR
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE LOROS EN LORO CONTINUA EN ESCOMBRERA TRASEA 4.
- RECEPCION DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR INTERIOR TRASEA 4
- MANTENIMIENTO DE VIAL INTERIOR TRASEA FASE II
- RECEPCION DE TODO TIPO DE MATERIAL HUMEDO Y SECO EN ESCOMBRERA DE OYALSO
- CONTROL DE POLVOS EN ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA
ING. FRANCISCO PARRALES

151


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000037

PROYECTO No. FECHA: 3 MAYO 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE 4 FASE 4 - OYACOTO

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE TRABAJO OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE LOROS EN ESCOMBRERA EL TRAJE 4 DURANTE LA NOCHE
EMPRESA DE VIAL
RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LOROS A ESCOMBRERA - OYACOTO
COORDINACIÓN DE MATERIAL DE PASADIZOS VÍA DE ACCESO A TRAJE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: REPARACIONES
En reparación: 1 TRACTOR SYNTON
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE LOROS EN ESCOMBRERA EL TRAJE 4, RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR.
- LIMPIEZA DE AV. SIMÓN BOLÍVAR.
- RECEPCIÓN DE LOROS Y SECCIONES EN ESTACION DE OYACOTO.
- COORDINACIÓN DE MATERIAL EN VÍAS DE ACCESO A TRAJE 4.
- CONTROL DE PUNOS.


CONTRATISTA
ING. EDUARDO PÉREZ

152


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000036

PROYECTO No. FECHA: 2 DE MAYO 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS DE TRASTE - SILLAS -

CONTRATISTA: CONSOLIDO EL TRASTE - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LOMOS PLATANERA NORTE Y SUR 1
LIMPIEZA DE VÍAS EXTERNAS E INTERNAS
COLOCACIÓN DE MATERIAL MEDIOAMBIENTAL DEL SE ACCESO AL TRASTE 3
RECEPCIÓN DE LOMOS ESCOMBRERAS QUITO
HEBRADO DE VÍAS ESCOMBRERAS QUITO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ADESGO DE VÍAS INTERNAS ESTACIONERA E. TRASTE 4 FASE II
- LIMPIEZA CON MOTONIVELADORA DE AJ. SIMON BONUAR.
- DISPOSICIÓN DE PATENTE DE RESERVA EN LAS VÍAS DE ACCESO TRASTE 4 FASE II
- RECEPCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL
- SE REALIZA CONTROL DE VOLUMEN EN LAS ESCOMBRERAS


CONTRATISTA
ING. ENGEN. FERRER

153


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000035

PROYECTO No..... FECHA: 1 Mayo DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONC - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL Y Lodos PLATAFORMA NORTE Y SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL Y Lodos ESCOMBRERAS OYALOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE:.....
TOPÓGRAFOS:.....
OPERADORES:.....
AYUD. MAQ.:.....
CHOFERES:.....
MECÁNICOS:.....
OTROS:.....

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna 1;
Otros: RETRANSMISORA
En reparación: 1 TRACTOR 2470 660
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado.....	Nublado X	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
TARDE:	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter X	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
NOCHE:	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte X

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- = SE RECIBI MATERIAL SECO Y Lodos EN PLATAFORMA SUR Y NORTE DEL TRONC 4.
- RECEPCIÓN DE Lodos Y SECO PROHIBIDOS DEL SECTOR NORTE EN EL OYALOTO
- = CONTROL DE FONDOS EN EL OYALOTO.


CONTRATISTA
TAMU FERRERAS INGENIEROS

154


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
