

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000127

PROYECTO No.

FECHA: 31-10-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREMA - EL TIOTE Y FASE II / OTACOTO

CONTRATISTA: COMARCO - EL TIOTE - OTACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUR BASTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBREMA - OTACOTO  
HIDRATACION DE UNAS ESCOMBREMAS EL TIOTE Y OTACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 2

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORES  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- RECEPCION DE LOSOS Y SACOS EN PLATAFORMA SUR INFERIOR Y NORTE, EN LA ESCOMBREMA EL TIOTE A.
- CONTROL DE PUNOS EN LAS DOS ESCOMBREMAS, TIOTE Y OTACOTO.
- DISPOSICION DE MATERIAL SECO Y HUNEDO EN ESCOMBREMA DE OTACOTO.
- LITARIA DE AV. SIMON BOLIVAR.

  
J.F. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

## LIBRO DE OBRA

HOJA No

000000126

PROYECTO No

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRAJE 4 FASE II / OYACOTO

FECHA: 30 JULIO 2017 DÍA: Domingo 3

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE TUBOS EN CUBIERTO DE LOSOS  
RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA SUR ALTA Y NORTE  
MANTENIMIENTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 6  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 2

### EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;  
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1 ;  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


### OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES LATERALES EN CUBIERTO EN EL TRAJE 4
- RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA NORTE 7 SUR TRAJE 4.

  
ING. FERNANDO BARRERA  
CONTRATISTA

  
121  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

## LIBRO DE OBRA

HOJA No

000000125

PROYECTO No

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAR EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

FECHA: 29-JULIO-2017 DÍA: SABADO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR BAJA DEL INOCHE  
RECEPCION DE VEA ESCOMBROS EL TRASE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS Y SECOS ESCOMBREAR - OYACOTO  
CONSTRUCCION DE PUJO EN PISCINA DE LOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra  
Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMIONES ; CAMION  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


### OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION NORMAL EN LA DEL ESTILOBRERA, TANTO EN EL TRASE 4 COTU EN OYACOTO.
- CONTROL DE VOLUJOS EN LAS DOS ESTILOBRERAS.

  
FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000124

PROYECTO No.

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAR EL TERRENO Y TASE II Y OMACOTO

FECHA: 28 JUNIO 2017 DÍA: VIERNES

CONTRATISTA: COLSONZO - EL TERRENO - OMACOTO

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS ESCOMBRES Y SECCS DUTABONA SUR BARRA AZA VINOCHES  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS ESCOMBRES Y SECCS ESCOMBREAR - OMACOTO  
CONSTRUCCION DE MURO EN CUBIERTO DE LOSAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 3  
OTROS: 2

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; REINTEGRACION; OMACOTO  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE MATERIALES EN PATIO FUERTE SUR Y NORTE TASE 4.
- DISPOSICION DE ESLOABRUIOS EN LA ESCOMBRELA DE OMACOTO.
- LIMPIEZA DE LA A.S. SIMON BOLIVAR.
- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE BARRA Y TASE EN EL TASE 4.



CONTRATISTA



FISCALIZADOR DE OBRA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000123

PROYECTO No. .... FECHA: 27-JULIO-2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRAZO 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAZO - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRELA NORTE Y SUR.  
DTR Y NOCHES.  
HIDRANTACION DE UNA ESCOMBRERA EL TRAZO 4 Y OYACOTO  
RECONSTRUCCION DE UNAS PLATAFORMAS  
CONSTRUCCION DE BERMAS PLATAFORMAS SUR BRSA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 4  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 2; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RECONSTRUCCION; CAMION  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- DISPOSICION DE MATERIALES SECOS, Lodos en PLATAFORMA INFERIOR SUR y PLATAFORMA NORTE TRAZO 4.
- SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE BERMAS y TAMBEN ESCOMBRELA EL TRAZO 4.
- CONTROL DE PUNOS DE LAS DOS ESCOMBRERA.
- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR.
- RECEPCION DE MATERIALES (BOLIVAR) EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.

  
DRS FERNANDO BUARQUE  
CONTRATISTA

  
124  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000122

PROYECTO No. .... FECHA: 26-NOV-2017 DÍA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II / OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYALOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SECCAS DURANTE HORAS Y SIN  
MEDICION DE LA ESCOMBRELA EL TRAJE Y OYALOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOS SECCAS Y ESCOMBROS ESCOMBRELA - OYALOTO  
CONSTRUCCION DE TUBO CURETO DE LOSOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 2 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR ; GRADER  
Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE PAREDES LATERALES DEL CURETO PART EL TRAJE A.
- RECEPCION DE MATERIAL EN PATA FUERA SUR Y NORTE DEL TRAJE 4
- CONTROL DE PUNOS DE LAS DOS ESCOMBRELA
- COMPACTACION DE BERMA CON RODILLO PATA DE CABRA.

  
IVO FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
125  
FISCALIZADOR DE OBRAS

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. \_\_\_\_\_

## LIBRO DE OBRA

000000121

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 25-JULIO-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, Lodos y ESCOMBROS PLATAFORMA NICOTE Y SUPLENIR Y NOCHE  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA OYACOTO  
RECONSTRUCCIÓN DE VEH ESCOMBROS EL TROTE Y OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas -  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETRAXION,  
CAMION  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_  
TARDE: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_  
NOCHE: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_

## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:


- SE CONTINUA LA OPERACION NORMAL EN LAS ESCOMBRERAS EL TROTE 4 Y OYACOTO, SIN NOVEDAD.
- CONTROL DE PULOS EN VIM DE ACERVO E INTERUM DE LAS ESCOMBRERAS EL TROTE 4 Y OYACOTO.
- SE CONTINUA CON LA CONTORNACION DEL CUBIETO PARA RECEPCION DE Lodos EN EL TROTE 4.
- RECONSTRUCCION DE VIM INTERUM TROTE 4

  
ING. FERNANDO RODRIGUEZ

CONTRATISTA

  
126  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000120

PROYECTO No. FECHA: 24-11-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - ESTACION 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO FC TUNJO-OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE BARRAS, ESCOMBROS Y LAGOS EN PLATAFORMAS NORTE Y SUR DEL Y NOCHE  
HIDRANTACIÓN DE VÍAS Y LIMPIEZA ESCOMBROSA EL TUNJO Y OYACOTO  
CONSERVACIÓN DE BARRAS PLATAFORMA SUR  
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ESCOMBROS, LAGOS Y SECOS ESCOMBROSA OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 6  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 3; Volquetas;  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; BOFALCAUNSONA, GATZON  
MELICARSONA  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- DISPOSICIÓN DE MATERIALES HUNDIDOS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR Y NORTE DE LA ESCOMBRERA EL TUNJO A.
- CONTROL DE POLVOS DE LAS ESCOMBRERAS.
- LIMPIEZA DE AV. SIMÓN BOLÍVAR.
- RECEPCIÓN DE MATERIALES EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.
- COMPACTACIÓN DE PLATAFORMAS CON RODILLO PATA DE CABRA.

  
JOS FERNANDO BUELICHE  
CONTRATISTA

  
127  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000119

PROYECTO No. .... FECHA: 23-7-2020-2022 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EC TRANS 4 FAS II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ECTHOTE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VÍAS Y PLATAFORMAS  
ELEVACION DE VÍAS  
PANTALLA GENERAL

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 10  
AYUD. MAQ.: 4  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 2; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 7; CAMION; MECANIZADOS  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

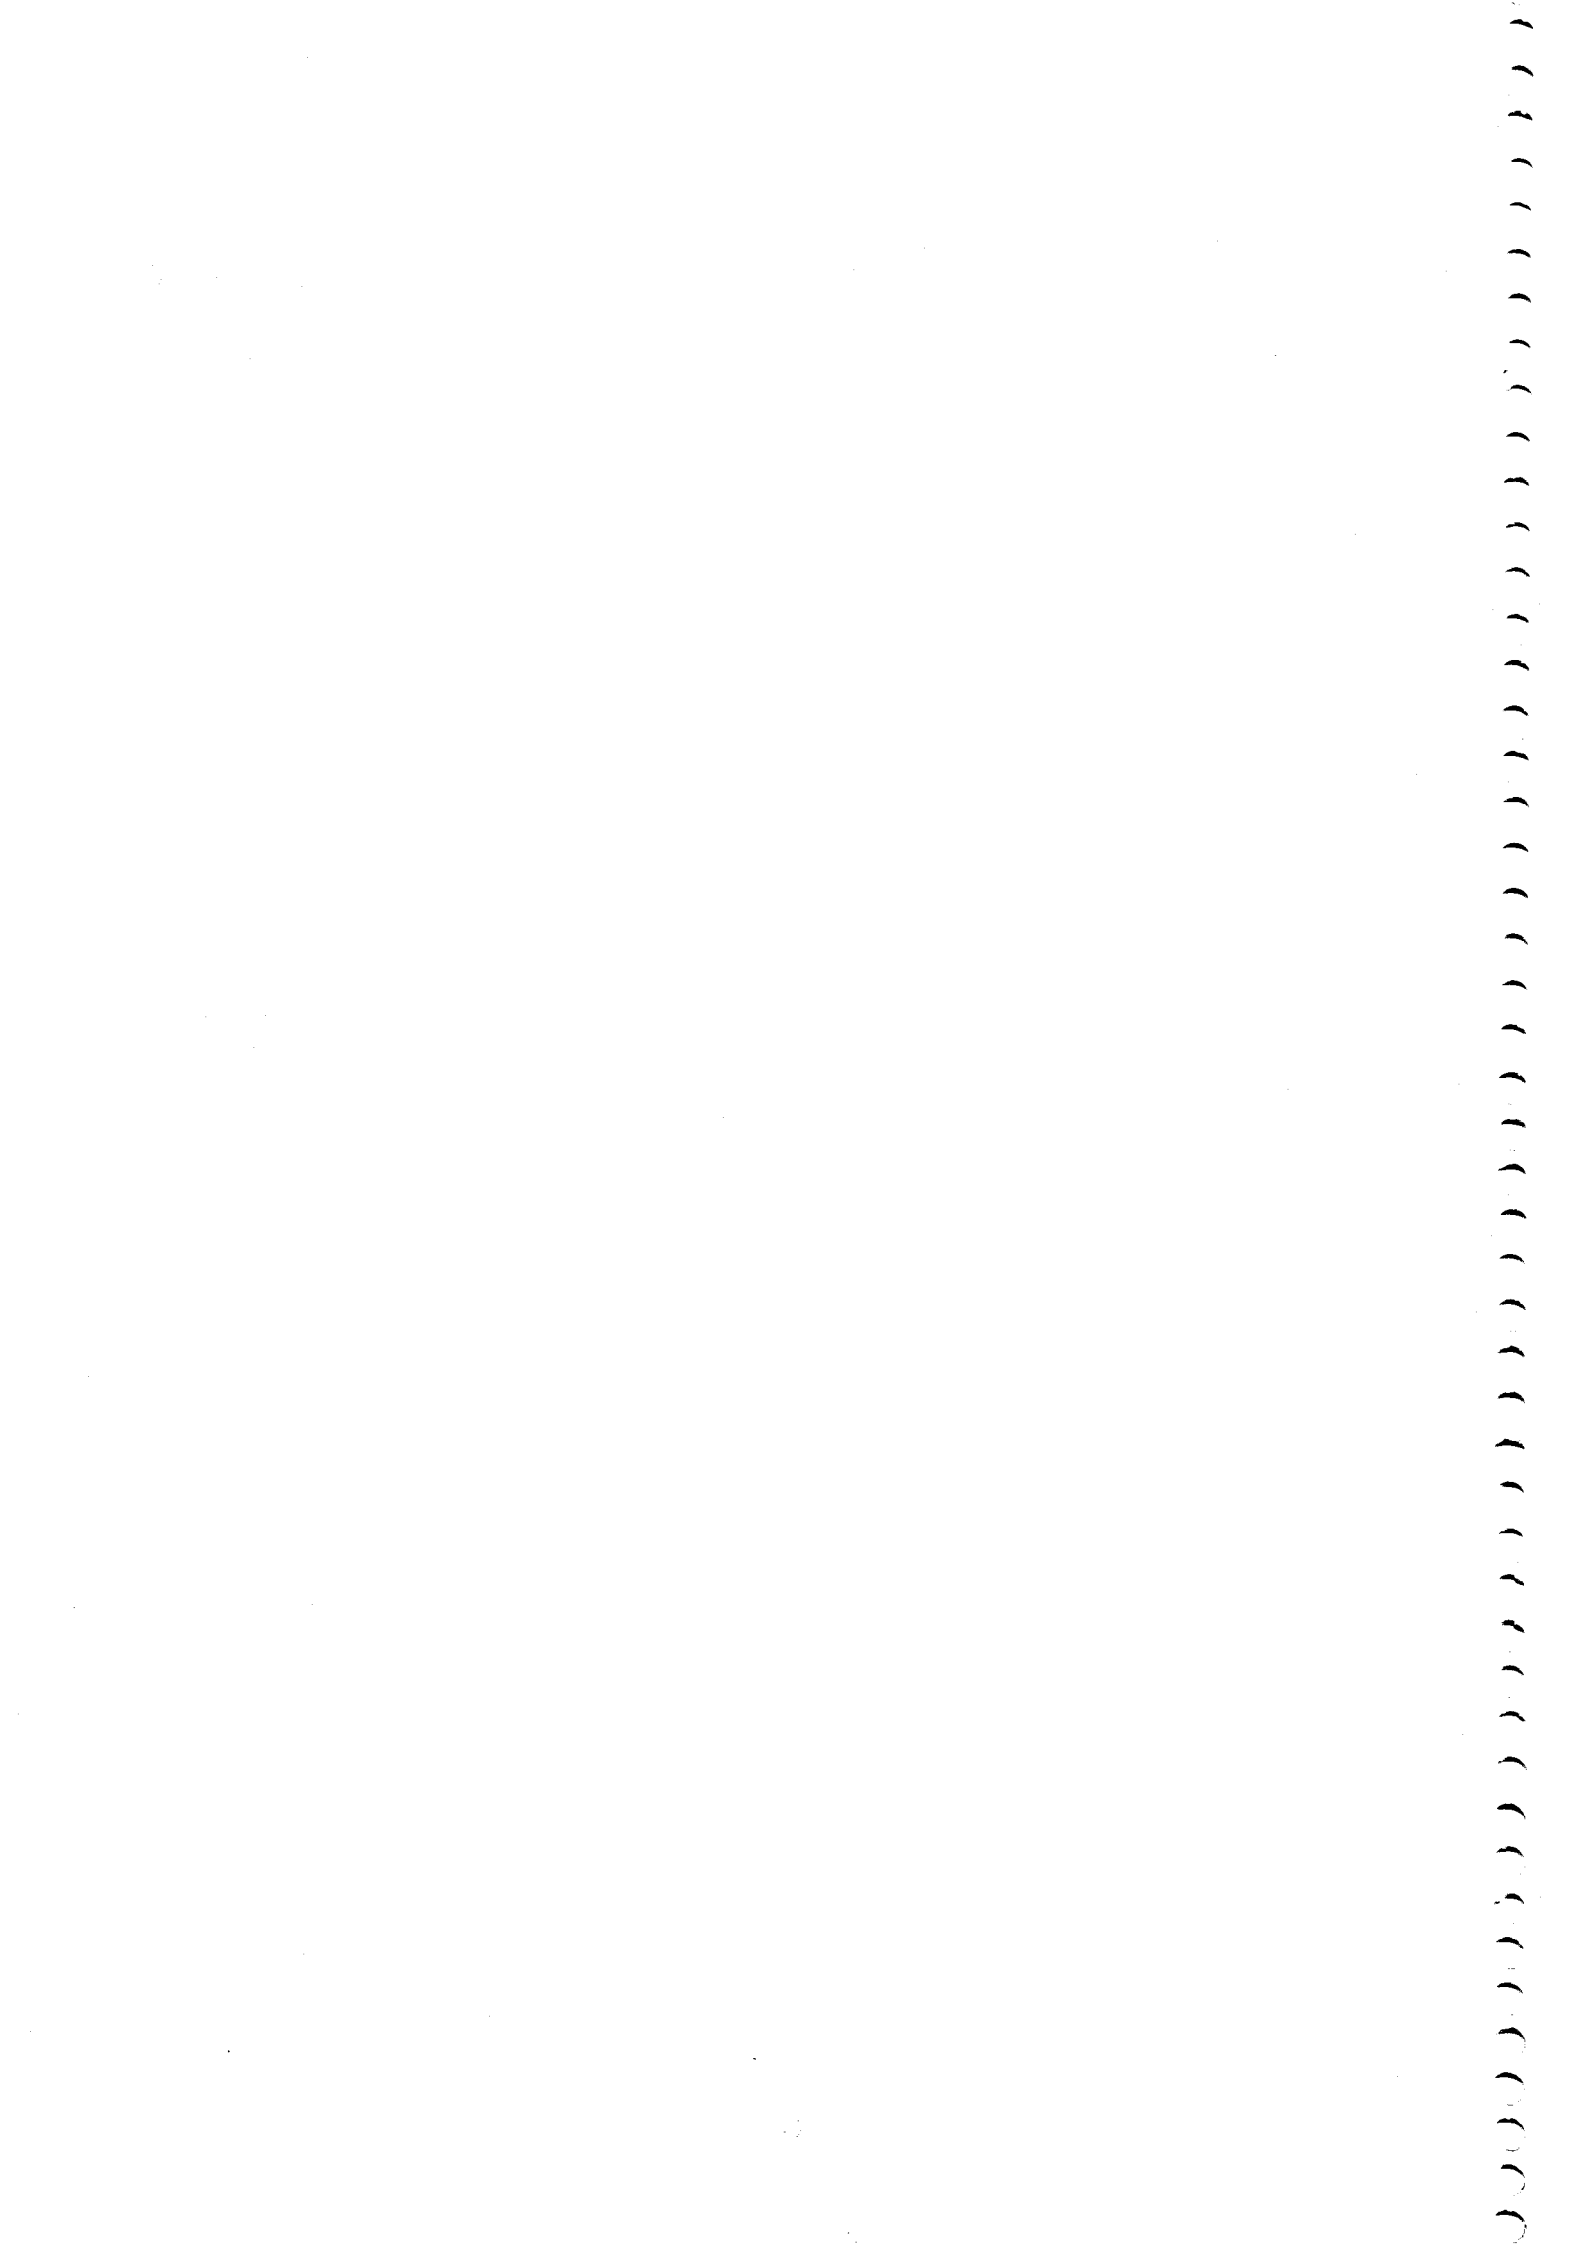
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- RECONFORMACION DE PLATAFORMAS.
- LIMPIEZA DE VÍAS INTERNAS

  
JHS FERNANDO PONCE  
CONTRATISTA

  
128  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000118

PROYECTO No ..... FECHA: 22-Julio-2017 DÍA: SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA - EL TROJE Y FINCA II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBRAS Y SUELOS PLATAFORMAS - NORTE Y SUR.  
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBRAS Y SUELOS ESCOMBRA - OYACOTO.  
- RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCOMBRA EN EL TROJE Y OYACOTO  
- CONSTRUCCIÓN DE BERMS PLATAFORMA SUR B15.  
- RECONSTRUCCIÓN Y CORRIAJAZÓN DE VÍAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras ; Excavadoras ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR, CARRON  
MANIZALCARRON  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

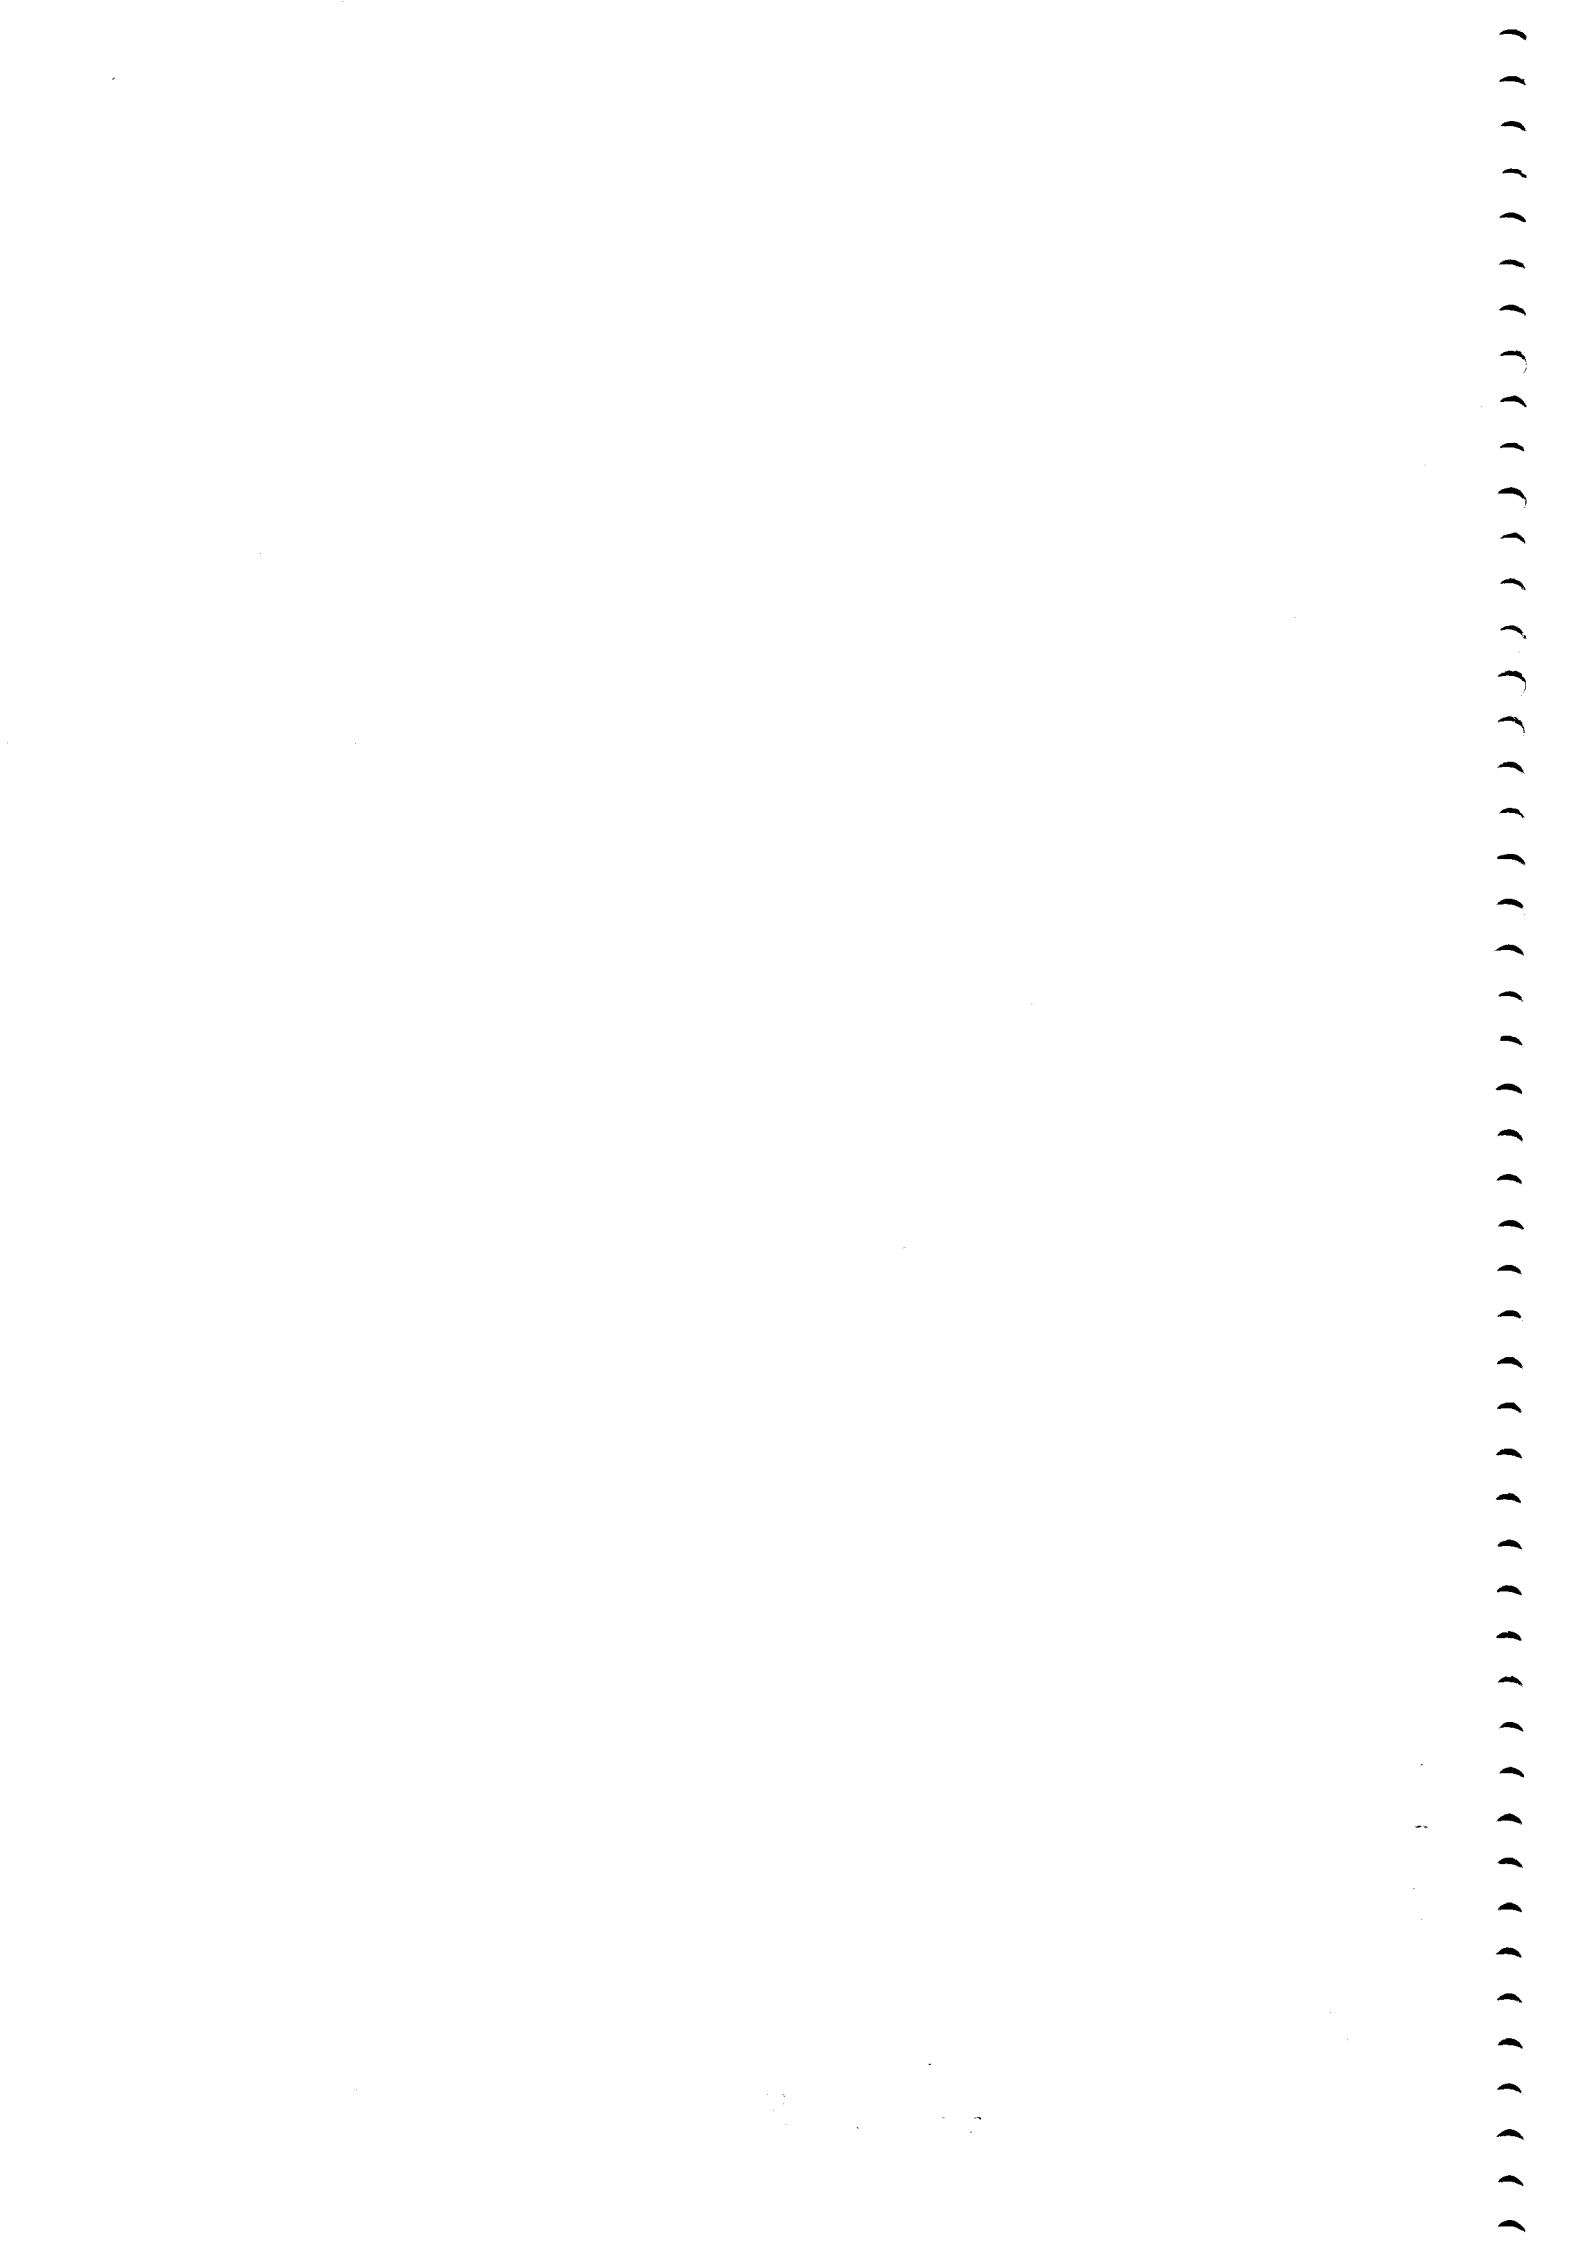
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- DE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL TROJE, TROJE A.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PLATAFORMAS SUR Y NORTE, ESCOMBRA EL TROJE A.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRA DE OYACOTO.
- LIMPieza DE AS. SINOY BOIJAE.
- CONTROL DE POSICIÓN EN VÍAS DE ACCESO E INTERIORES DE LAS ESCOMBRAS.

  
EL CONSORCIO  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA  
129

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000117

PROYECTO No. .... FECHA: 21 JULIO 2017 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSULCIN - EL TRONC - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE LOROS; ESCOMBROS Y SEDA PLAZA NOROCCIDENTAL NORTE Y SUR.  
RECEPCIÓN DE MATERIAL SEDA LOROS Y ESCOMBROS ESCOMBROSA - OYACOTO  
RECEPCIÓN DE LOROS ESTERILIZADOS INTERNOS  
ELIMINACIÓN DE LOS ESCOMBROS EL TRONC Y OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras .....; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 4; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR: 1  
MEXCOPAS  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....


ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- CONSTRUCCION DE PAREDES PERMETRALES TIPO DOWE EN CUBETO, PARA RECEPCIÓN DE LOROS EN EL VENTILADOR, DEL TRONC.
- RETIRO DE LOROS Y SEDA DE CUBETO, DEL TRONC.
- DISPOSICIÓN DE MATERIALES HUNDIDO Y SEDA Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL NORTE Y SUR DE ESTACIONES OYACOTO, TRONC.
- COSTEO DE POLVOS DE ESCOMBRERAS.

  
ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
130  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000116

PROYECTO No. .... FECHA: 20-Julio-2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO - EL TROTE 4 FASE II - OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROTE - OYALOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS LINDOS Y SECOS EN PLATAFORMA NORTE  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS LINDOS Y SECOS ESCOMBRO - OYALOTO  
RECEPCIÓN DE JER INTERNAS Y EXTERNAS ESCOMBROS OYALOTO Y EL TROTE  
LIMPIEZA DE VÍAS  
CONSTRUCCIÓN DE BARRAS PLATAFORMA SUR

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; REPARACIONES; CAMIÓN  
MEZCLADORA  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado ✓ Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIALES MUNDOS Y SECOS EN PLATAFORMA NORTE DEL TROTE 4.
- DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN ESCOMBRO DE OYALOTO.
- CONTROL DE POLVO EN ESCOMBROS,
- CONSTRUCCIÓN Y PÉTIMO DE TUBO DEL CUBIERTO DE DISPOSICIÓN DE LINDOS.

  
ING. FERNANDO GARCÍA  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000115

PROYECTO No. .... FECHA: 17-JUNIO-2017 DÍA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONC - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, LINDOS Y ESCOMBRAS, PLATAFORMA - HERRAJE Y SUELO  
RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, ESCOMBRAS Y LINDOS ESCOMBRERA - OYACOTO  
HIDRANTES DE USOS DE INCENDIOS EN ESCOMBRERA EL TRONC Y OYACOTO  
LIMPIEZA DE USOS SANEAM BOLIVIAN  
CONSTRUCCIÓN DE BARRAS PLATAFORMA SUELO - BARRAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra .....  
Camión Cisterna: 2; ROTOR-EXCAVADOR: CATAN  
METACARONOS  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

OPERACION NORMAL - SIN HOUJADAS EN LAS ESCOMBRERAS DE OYACOTO LOTO DEL TRONC 4.

  
TNO Francisco Javier L  
CONTRATISTA

  
132  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000114

PROYECTO No

FECHA: 18 JUNIO 2017 DÍA: MARTES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA - EL TASTE - 4 FRENTE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TASTE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LINDOS, SECOS Y ESCOMBROS PUTAFORNIA NOROCCIDENTAL Y SUR  
MANTENIMIENTO DE VIAL EN ESCOMBRA EL TASTE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS Y LINDOS ESCOMBRA OYACOTO  
SE CONSTRUYE BANDA PUTAFORNIA SUR - BANDA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 3

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 4; Excavadoras 1;

Motoniveladoras 1; Volquetas 1

Rodillos lisos 1; Neumáticos 1; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA 1; 2000  
MANTENIMIENTO

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:


- RECONSTRUCCION DE PUTAFORNIA SUR 7 HORRE PARA RECEPCION DE MATERIALES, ESCOMBRA EL TASTE A.


- LIMPIEZA DE Av. SIMON BOLIVAR.

- RECONSTRUCCION DE VIALS INTERIORS DE ESCOMBRA EL TASTE A.

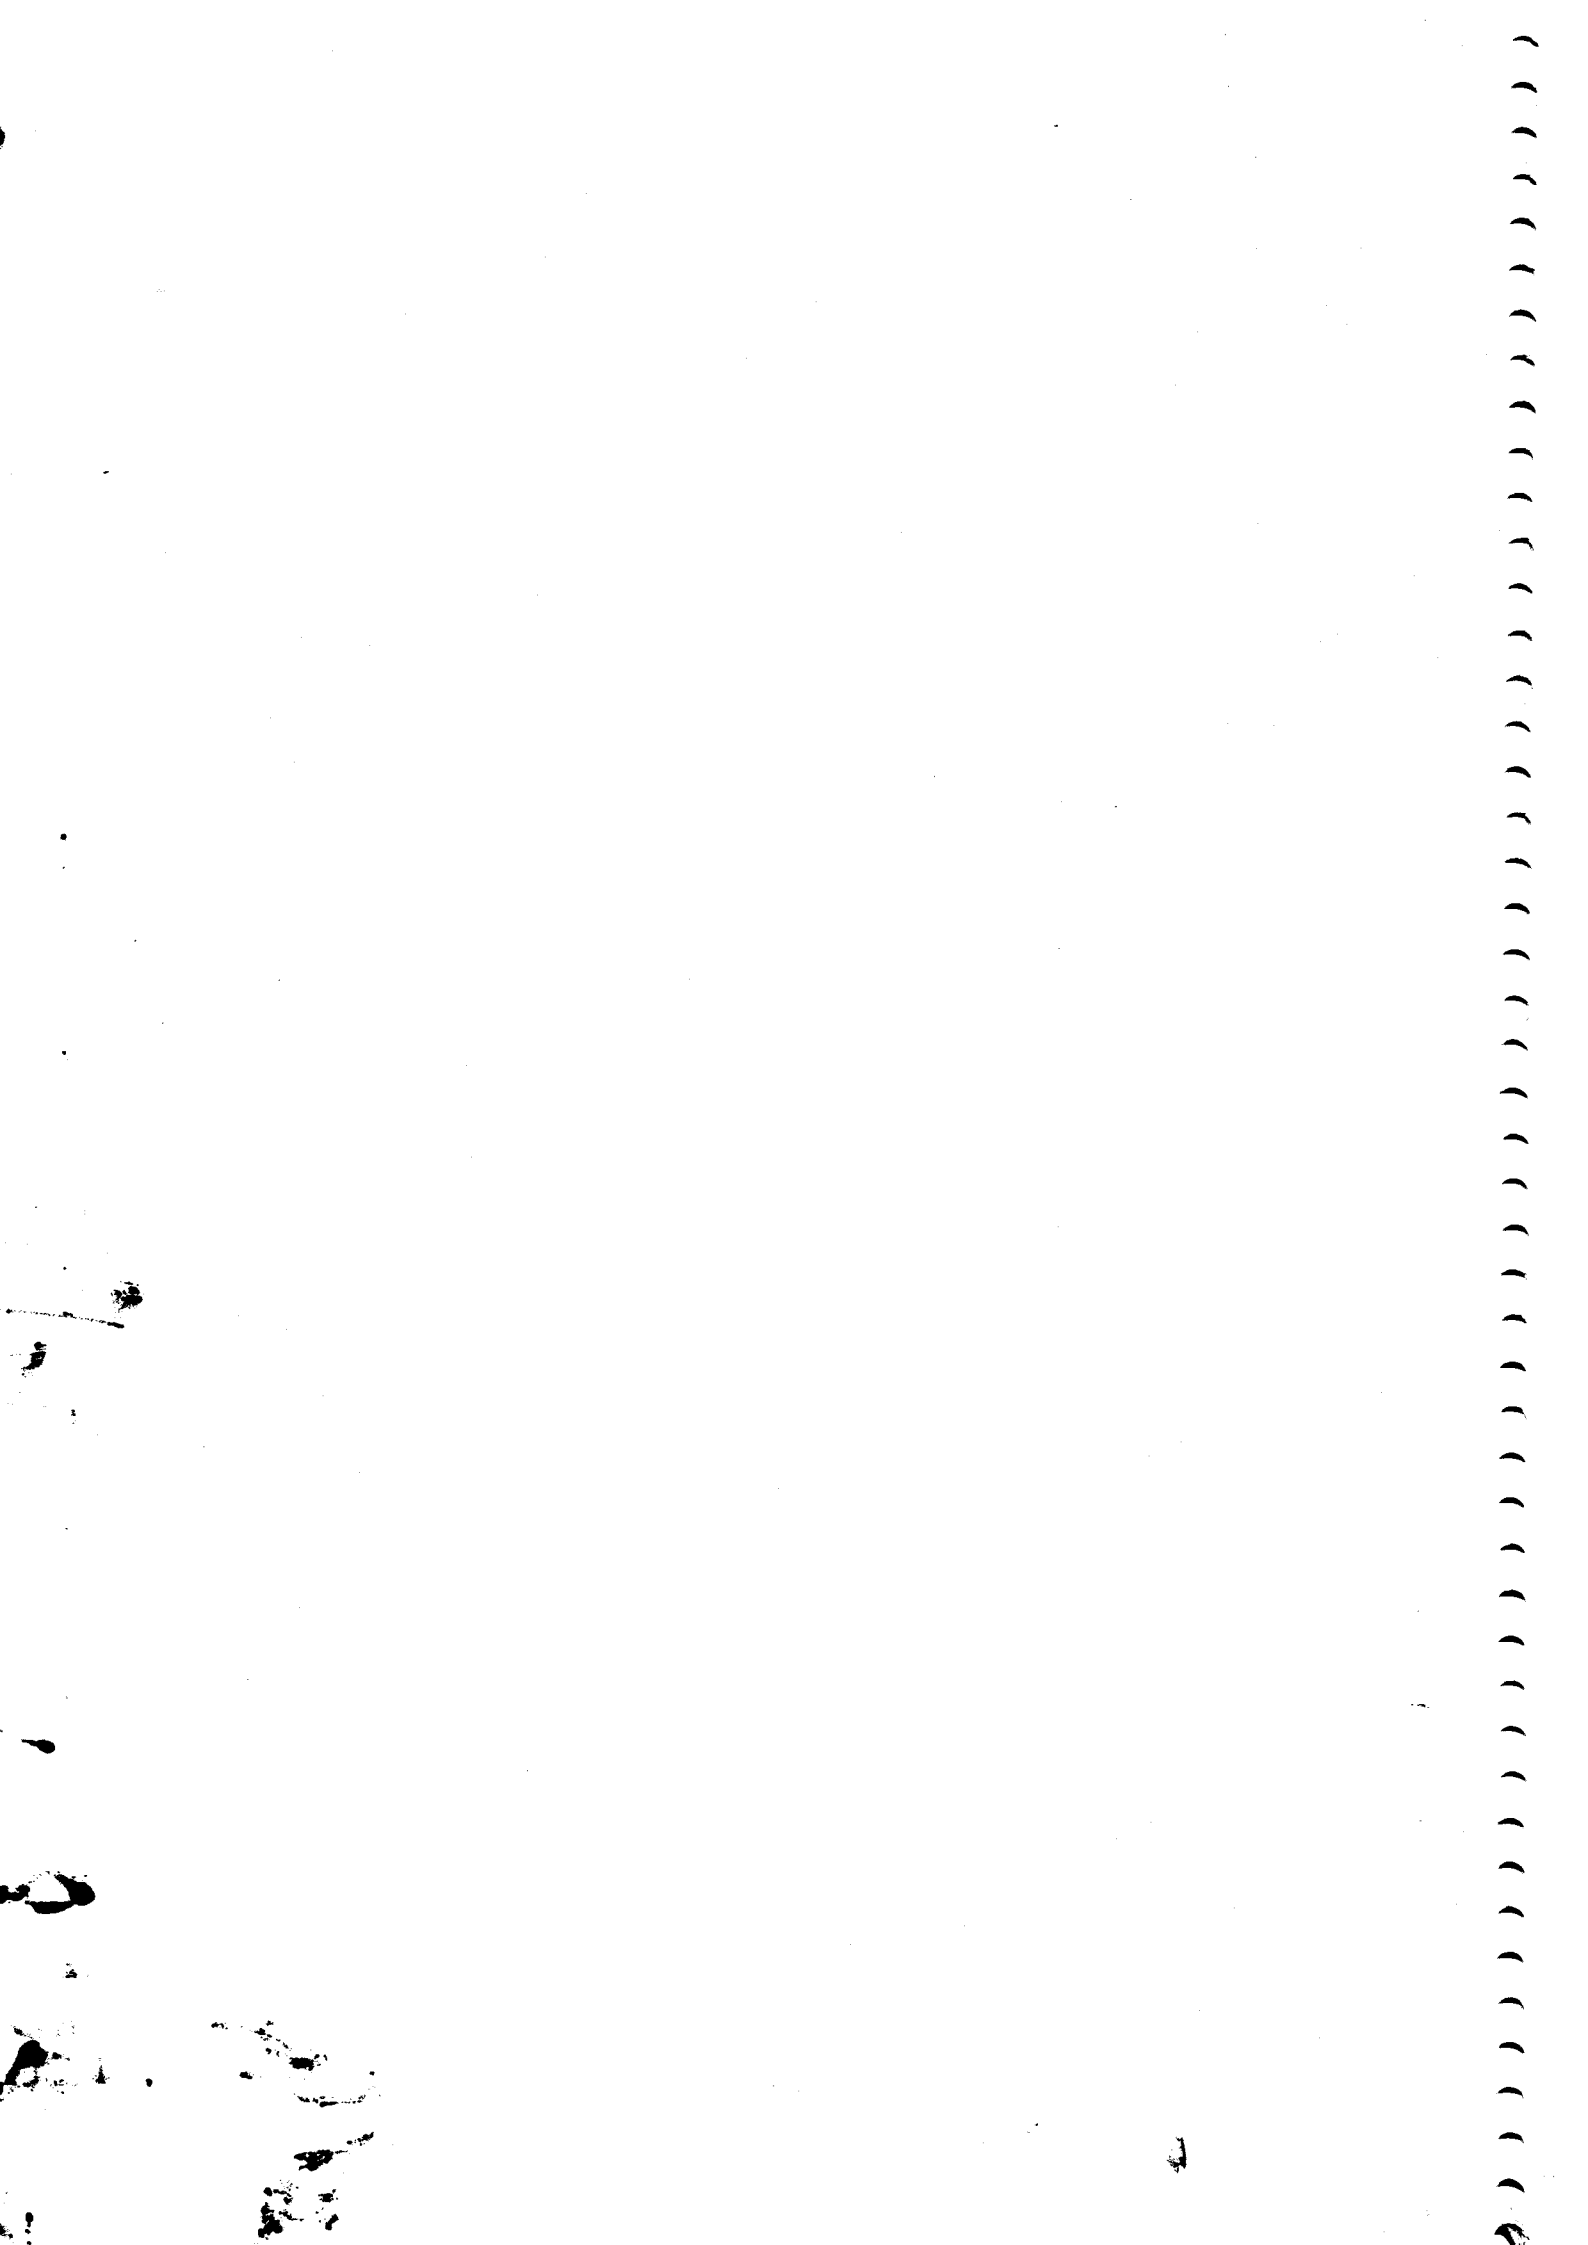
- CONTROL DE POLVOS DE ESCOMBRA.

- DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRA DE OYACOTO.

  
ING. FERNANDO FERRAZ  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. \_\_\_\_\_

## LIBRO DE OBRA

000000113

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 17-JULIO-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TIOJA 4 FASE 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TIOJA - OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE MATERIAL SECO, HUMIDO, ESCORIALES, PLATAFORMA NORTE ✓  
RECEPCION DE MATERIAL ESCORIALES, LINDOS Y SECOS, ESCOMBRERA OYACOTO  
REPARACION DE UNA ESCOMBRERA EN TIOJA Y OYACOTO  
CONSTRUCCION DE UTI  
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA NORTE

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1; Volquetas _____;
TOPOGRAFOS: 1	Rodillos lisos 1; Neumáticos _____; Pata de cabra 1
OPERADORES: 16	Camión Cisterna: 2; REFINORCLIVACOM OYACOTO MENCIONADA
AYUD. MAQ.: 9	Otros: _____
CHOFERES: 3	En reparación: _____
MECÁNICOS: 2	Salida de obra: _____
OTROS: 1	


**CONDICIONES CLIMATICAS:**


	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES

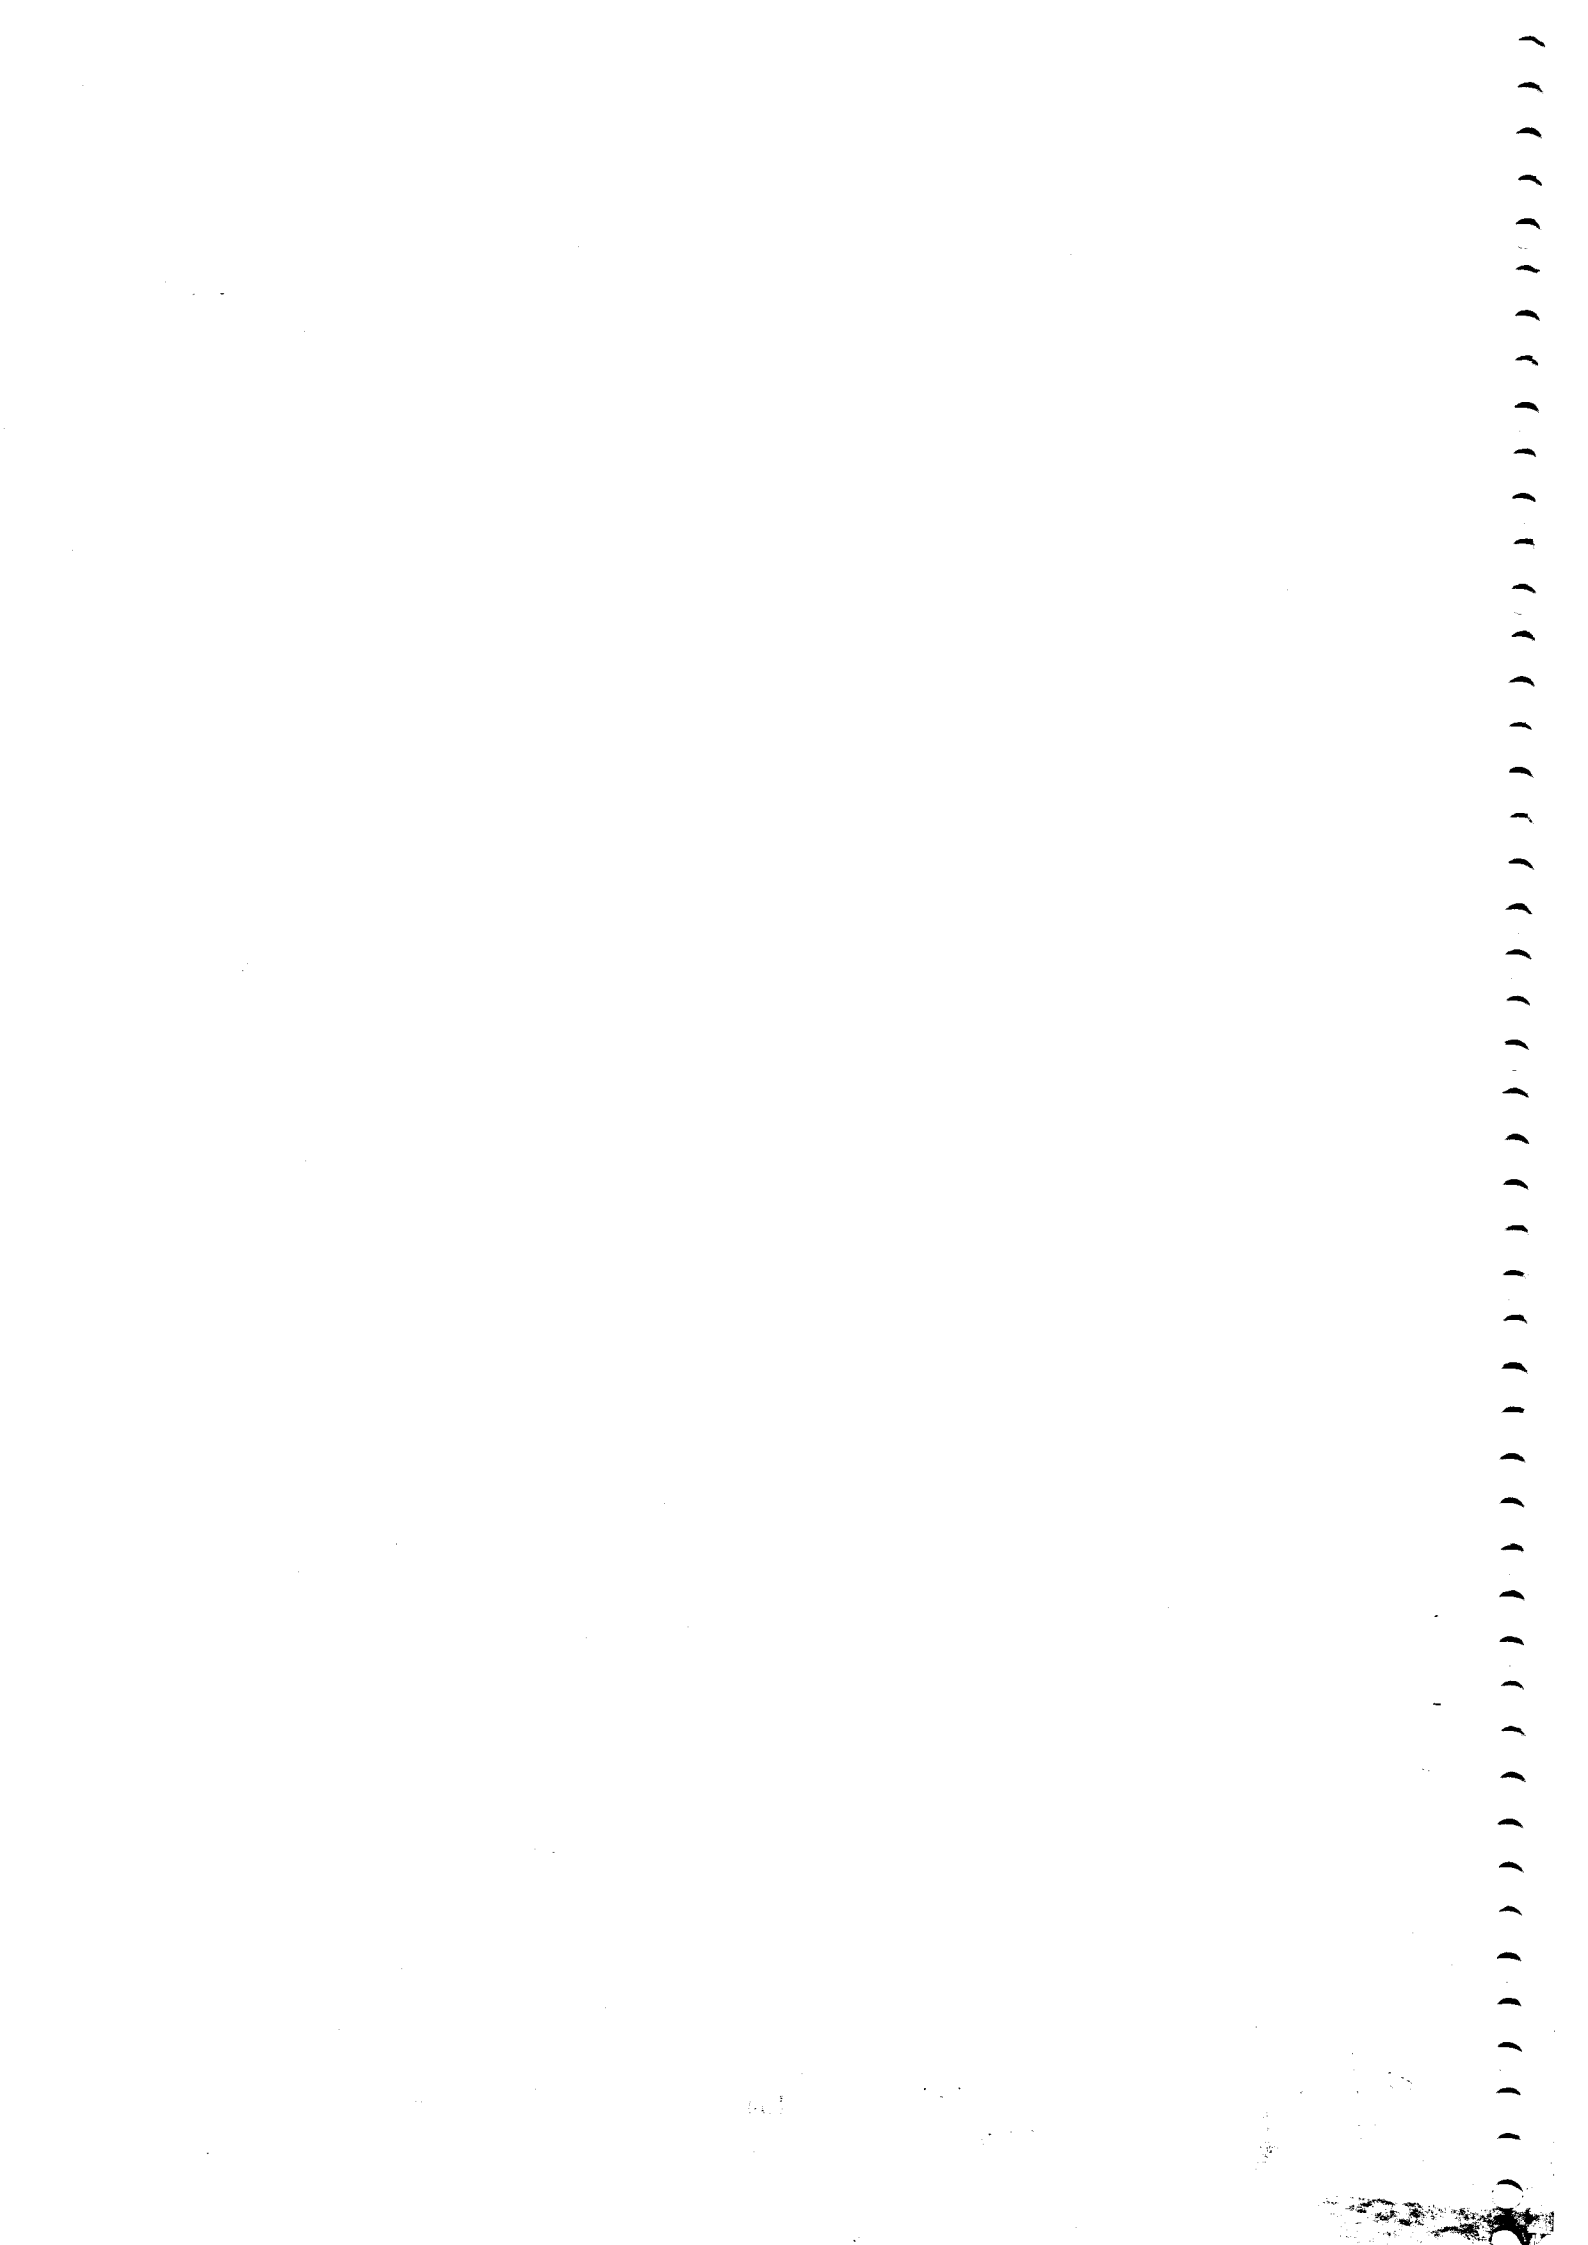
CONTRATISTA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
- RECEPCION DE MATERIAL HUMIDO Y SECO EN PLATAFORMAS SUR Y NORTE DE LA ESCOMBRERA EL TIOJA 4.  
- DISPOSICION DE MAT. ESCOMBRERA DE OYACOTO.  
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS  
- LIMPIEZA DE LA AV. SIMON BOLIVAR.

  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000112

PROYECTO No. .... FECHA: 16-JULIO-01 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
RECOMFORTACION DE PLATAFORMAS  
LIMPIEZA DE VÍAS  
MANEJO DE RESIDUOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 3  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 10  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: -

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras .....; Excavadoras .....;  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADORA, CATON  
MANEJO DE RESIDUOS  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

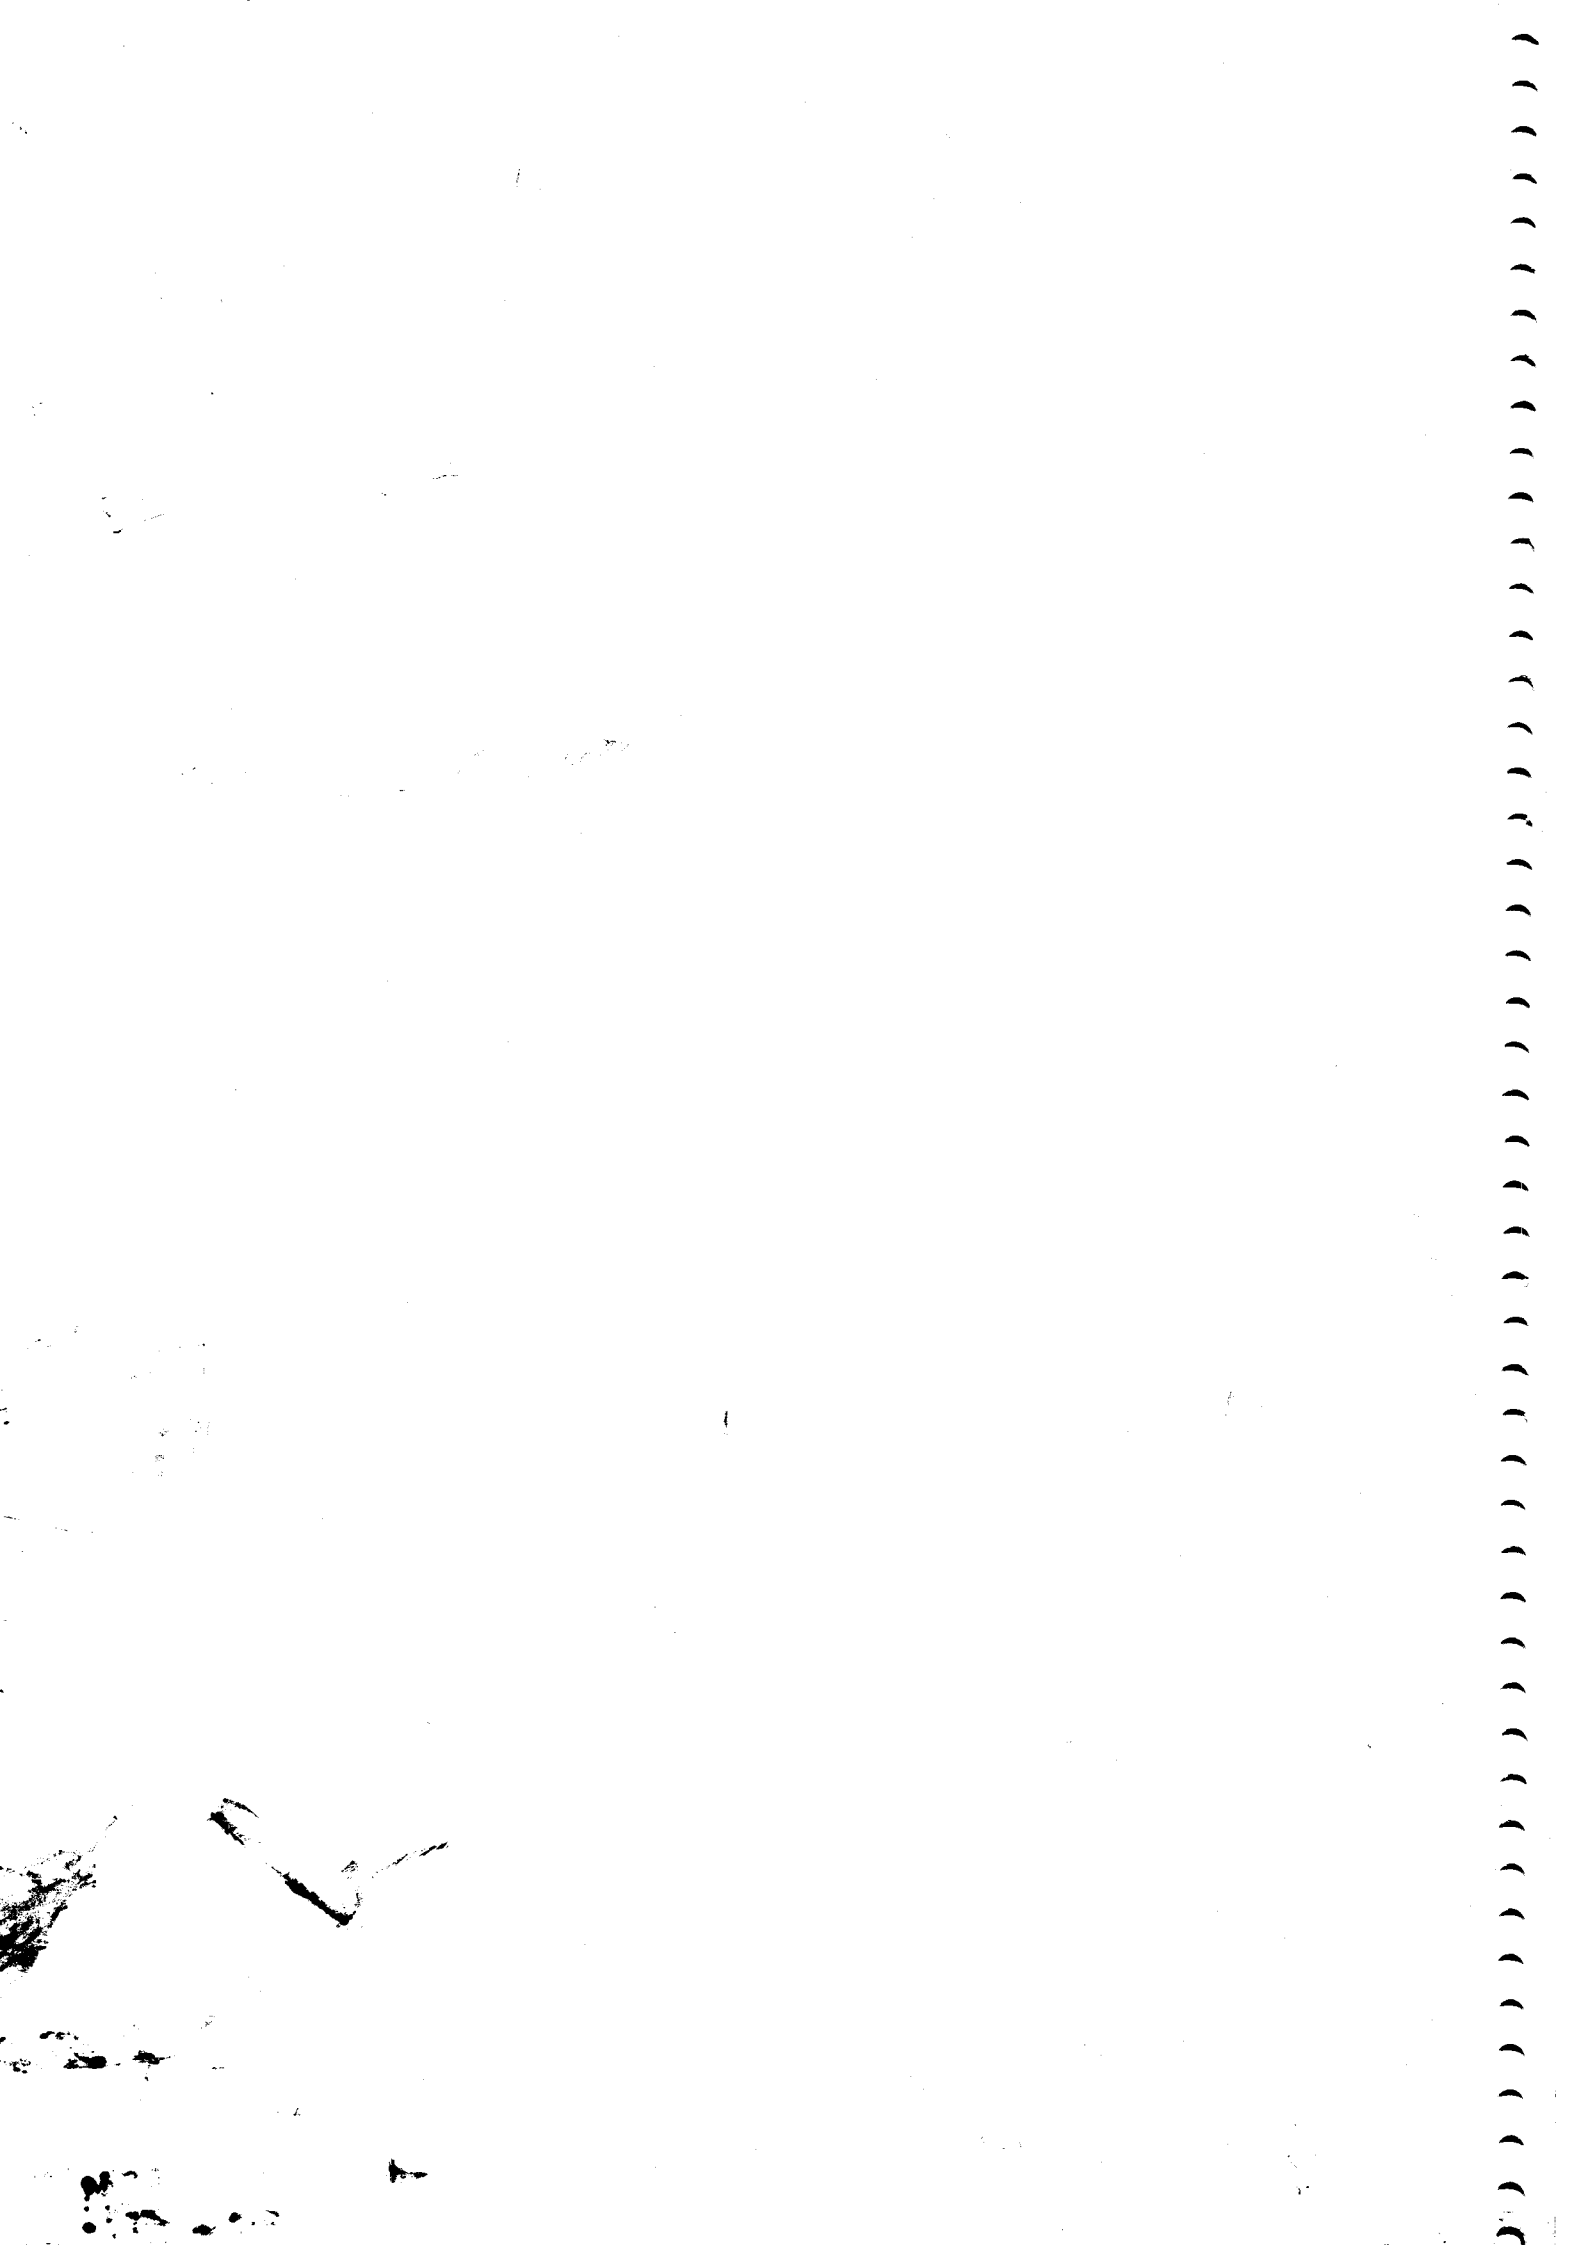
### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- COMPACTACION Y HUMECTACION EN PLATAFORMAS 10 - RODILLO PATA DE CABRA. ESCOMBRERAS TROTE 4 Y OYACOTO.
- LIMPIEZA AV. SIMON BOLIVAR
- RECOMFORTACION DE VÍAS INTERNA EN EL TROTE 4.
- RECEPCION DE MATERIALES EN ESTACION DE OYACOTO.

  
J. C. FERRERA  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000111

PROYECTO No: FECHA: 15- JULIO - 2017 DÍA: SOBLAGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - BERMUDA  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; Lodos y SECOS PUTAPOMA SUR - OSA  
Y PUTAPOMA NORTE  
RECONSTRUCCION E REDECCION DE VAS INTERNO Y EXTERNO  
RECEPCION DE MATERIAL Lodos; ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; Retraexcavador, cambio  
mini cargador  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

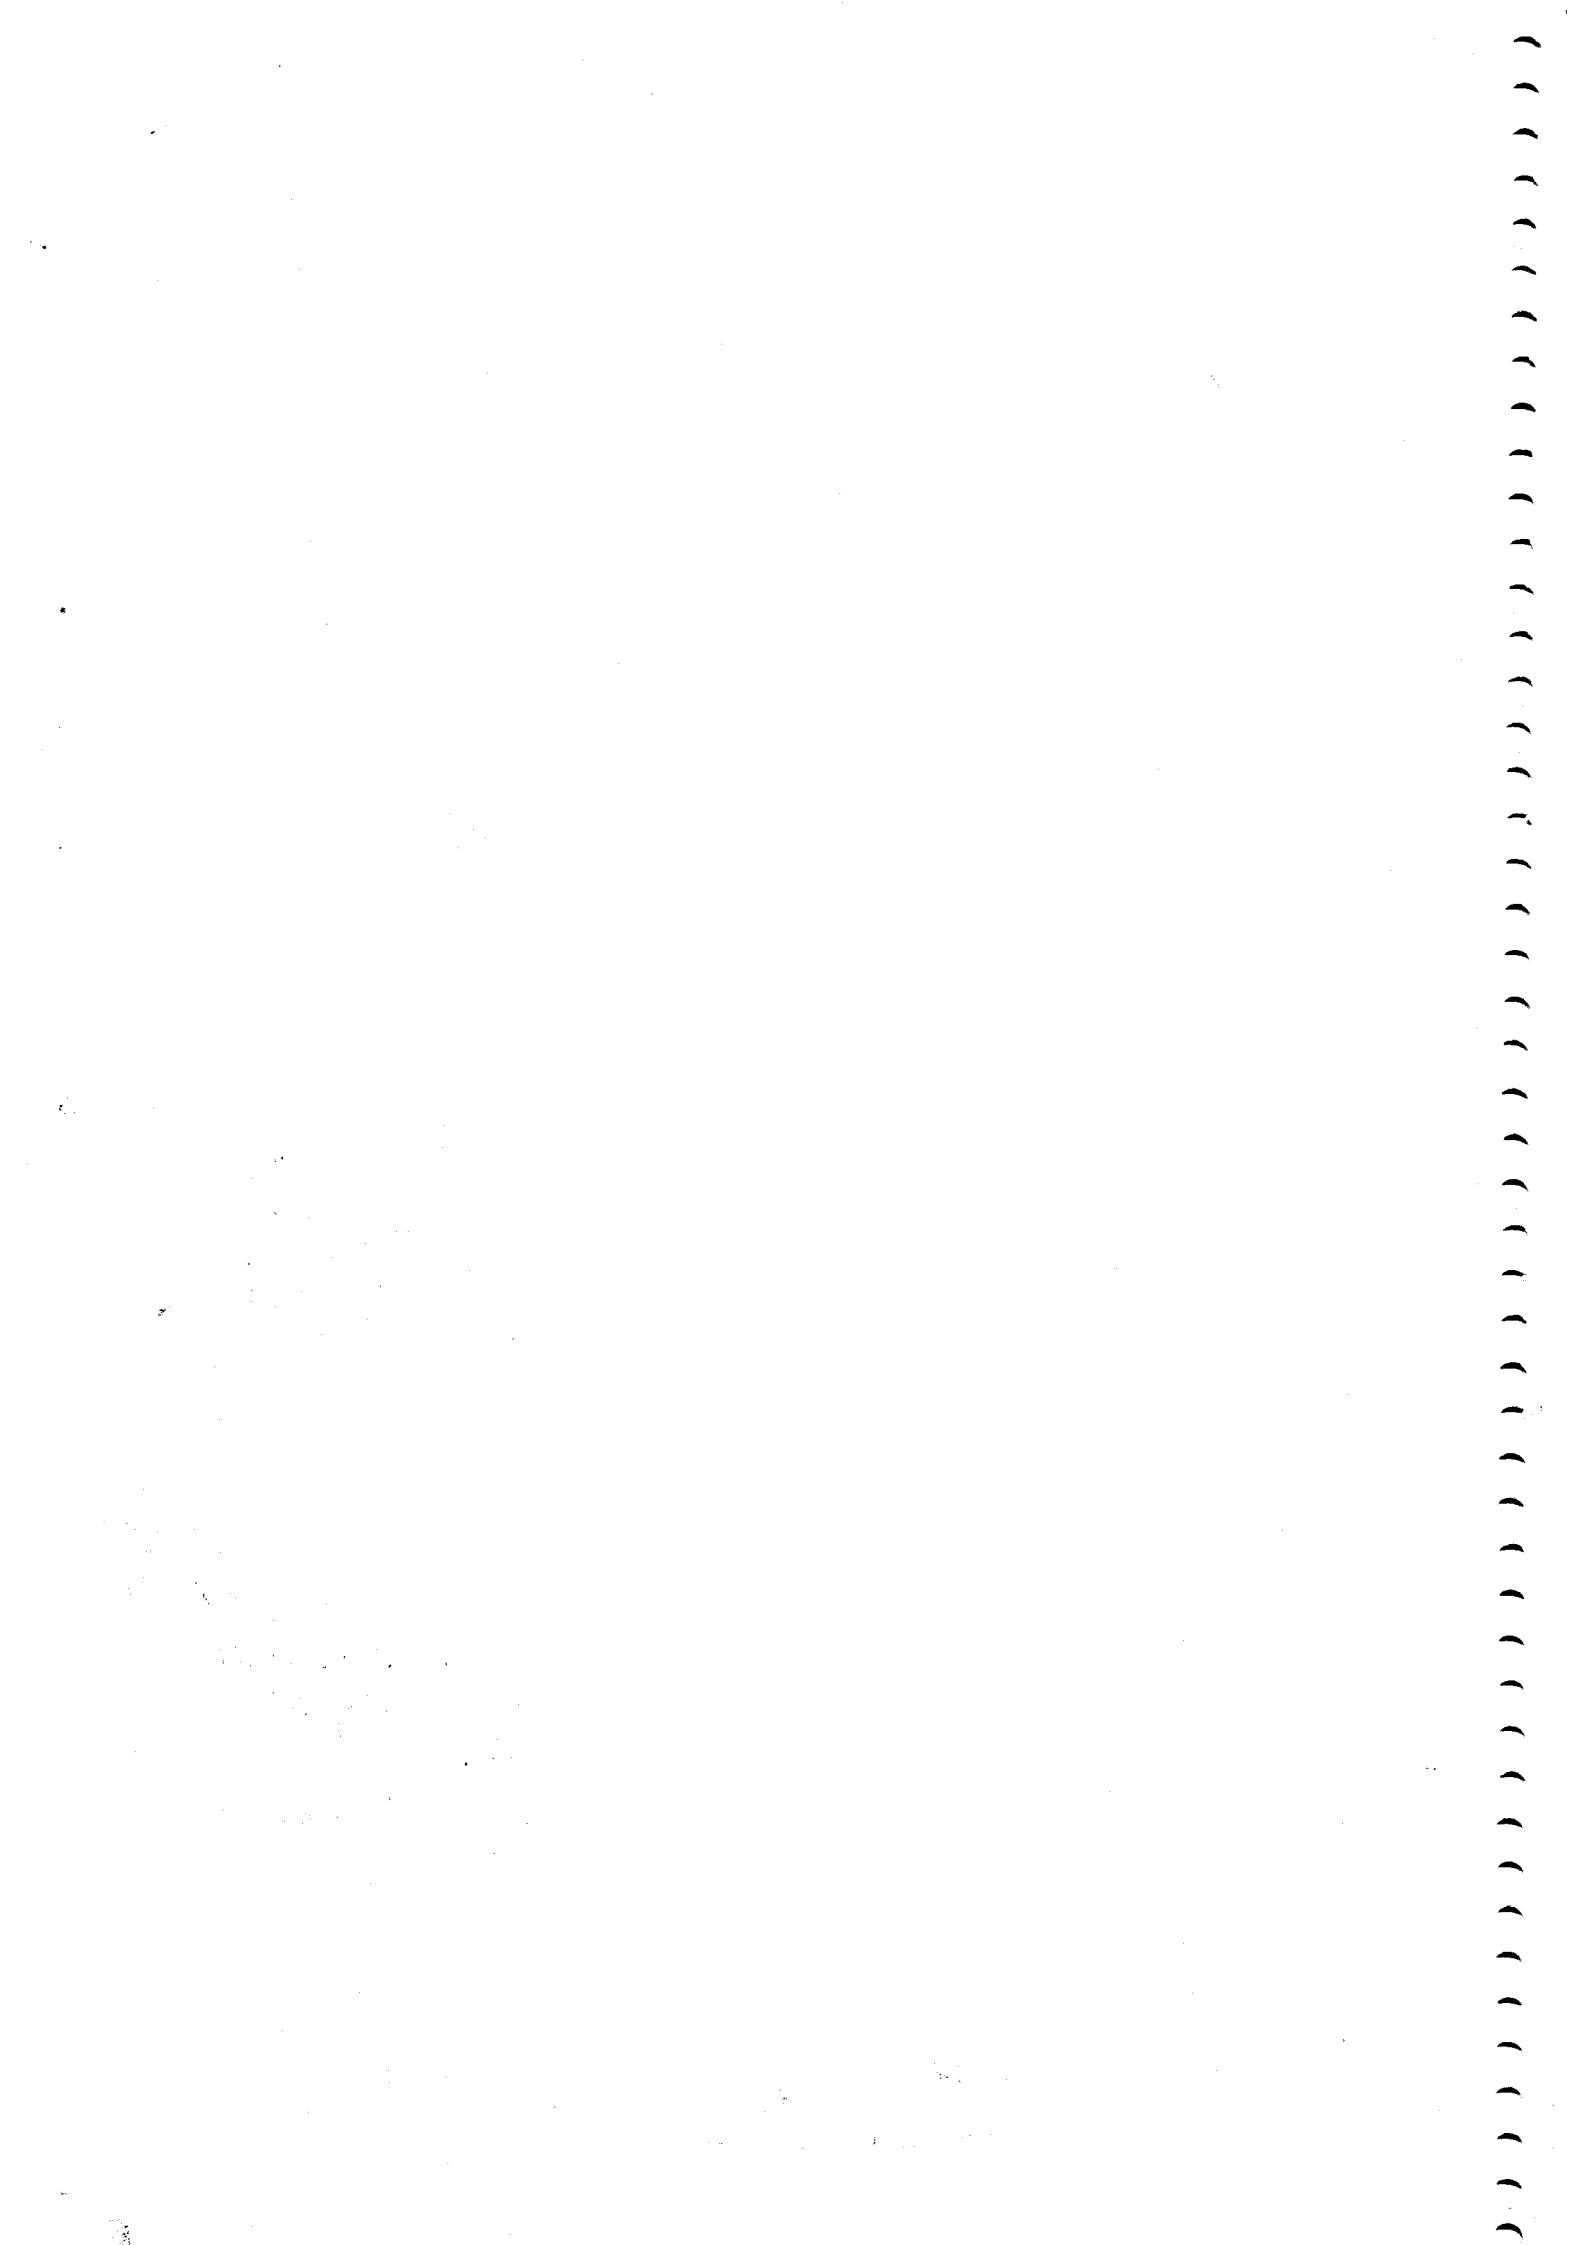
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE BERMUDA Y TAJUELOS, EN TROJE 4
- DISPOSICION DE PLATELADOS EN PUTAPOMAS SUR, NORTE DE LA ESCOMBRERA EN TROJE 4.
- CONTROL DE FOCOS EN LAS ESCOMBRERAS.
- DISPOSICION DE PLATELADOS EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO.

  
ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
196  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. \_\_\_\_\_

## LIBRO DE OBRA

000000110

PROYECTO No. \_\_\_\_\_

FECHA: 14- Julio-2011 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO

FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PATARONA SUR BRB V  
PATARONA NORTE  
RECOLECCION Y ELIMINACION DE LIXIV  
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: \_\_\_\_\_

### EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 2; Volquetas \_\_\_\_\_  
Rodillos lisos 1; Neumáticos \_\_\_\_\_; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CAMION  
ARMACENAMIENTO  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_


ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- OPERACION NORMAL - SIN NOVEDADES DE LAS DOS  
ESCOMBRERAS.

ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

FISCALIZADOR DE OBRA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. \_\_\_\_\_

## LIBRO DE OBRA

000000109

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 13-JULIO-2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONCO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO-OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
RECEPCION DE MATERIAL LINDOS, SECOS Y ESCOMBOS PLATEFORMA SUR BATA Y NORTE  
HIDRATACION DE VEA Y LIMPIEZA  
CONSERVACION DE BARRAS PLATA SUR - BATA  
RECEPCION DE MATERIAL DE LINDOS Y ESCOMBOS EN ESCOMBRERA OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: \_\_\_\_\_

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas \_\_\_\_\_  
Rodillos lisos 1; Neumáticos \_\_\_\_\_; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROCARGADORAS 1; CON  
REINTEGRADORA  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: \_\_\_\_\_


ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: \_\_\_\_\_

- SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE MATERIAL EN PLATAFORMAS SUR Y NORTE DE LA ESCOMBRERA EL TRONCO.
- CONSTRUCCION DE BARRAS Y TAJUELOS PARTE I - FRENTE DE LA ESCOMBRERA EL TRONCO.
- COMPACTACION DE PLATAFORMAS CON RODILLO PATA DE CABRA. ESCOMBRERA.
- CONTROL DE POLVOS DE LAS ESCOMBRERAS.
- DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRERA DE OYACOTO

  
J.F. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
138  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000108

PROYECTO No.

FECHA: 12- Julio- 2014 DÍA: MIÉRCOLES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONC 4 FASES 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL LUDOS, SÍCOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL SUR 15.18 BARR  
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTERNAS  
RECEPCIÓN DE MATERIAL SÍCO, LUDOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 6 ; Excavadoras 3 ;

Motoniiveladoras 4 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMION ; CAMION  
MULICARGADOR

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE MATERIALES SÍCOS Y HU-  
MEDOS EN PLATAFORMA SUR 7 NOROCCIDENTAL SUR 15.18 BARR EL TRONC 4.
- LIMPIEZA AL SITIO BARR.
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.
- CORRECCIÓN DE BARRAS Y PLATAFORMA CON RODILLO PATA DE CABRA.
- DISPOSICION DE MATERIAL EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.

2

  
ITC FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
139  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000107

PROYECTO No. .... FECHA: 11- JULIO-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROTE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ELECTRO - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUB BATA Y NORTE  
LIMPIEZA DE VES  
LIMPIEZA DE VES  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras ;  
Motoniveladoras 1; Volquetas ;  
Rodillos lisos 1; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROCAMIONERA; CARRON  
MANTENIMIENTO  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

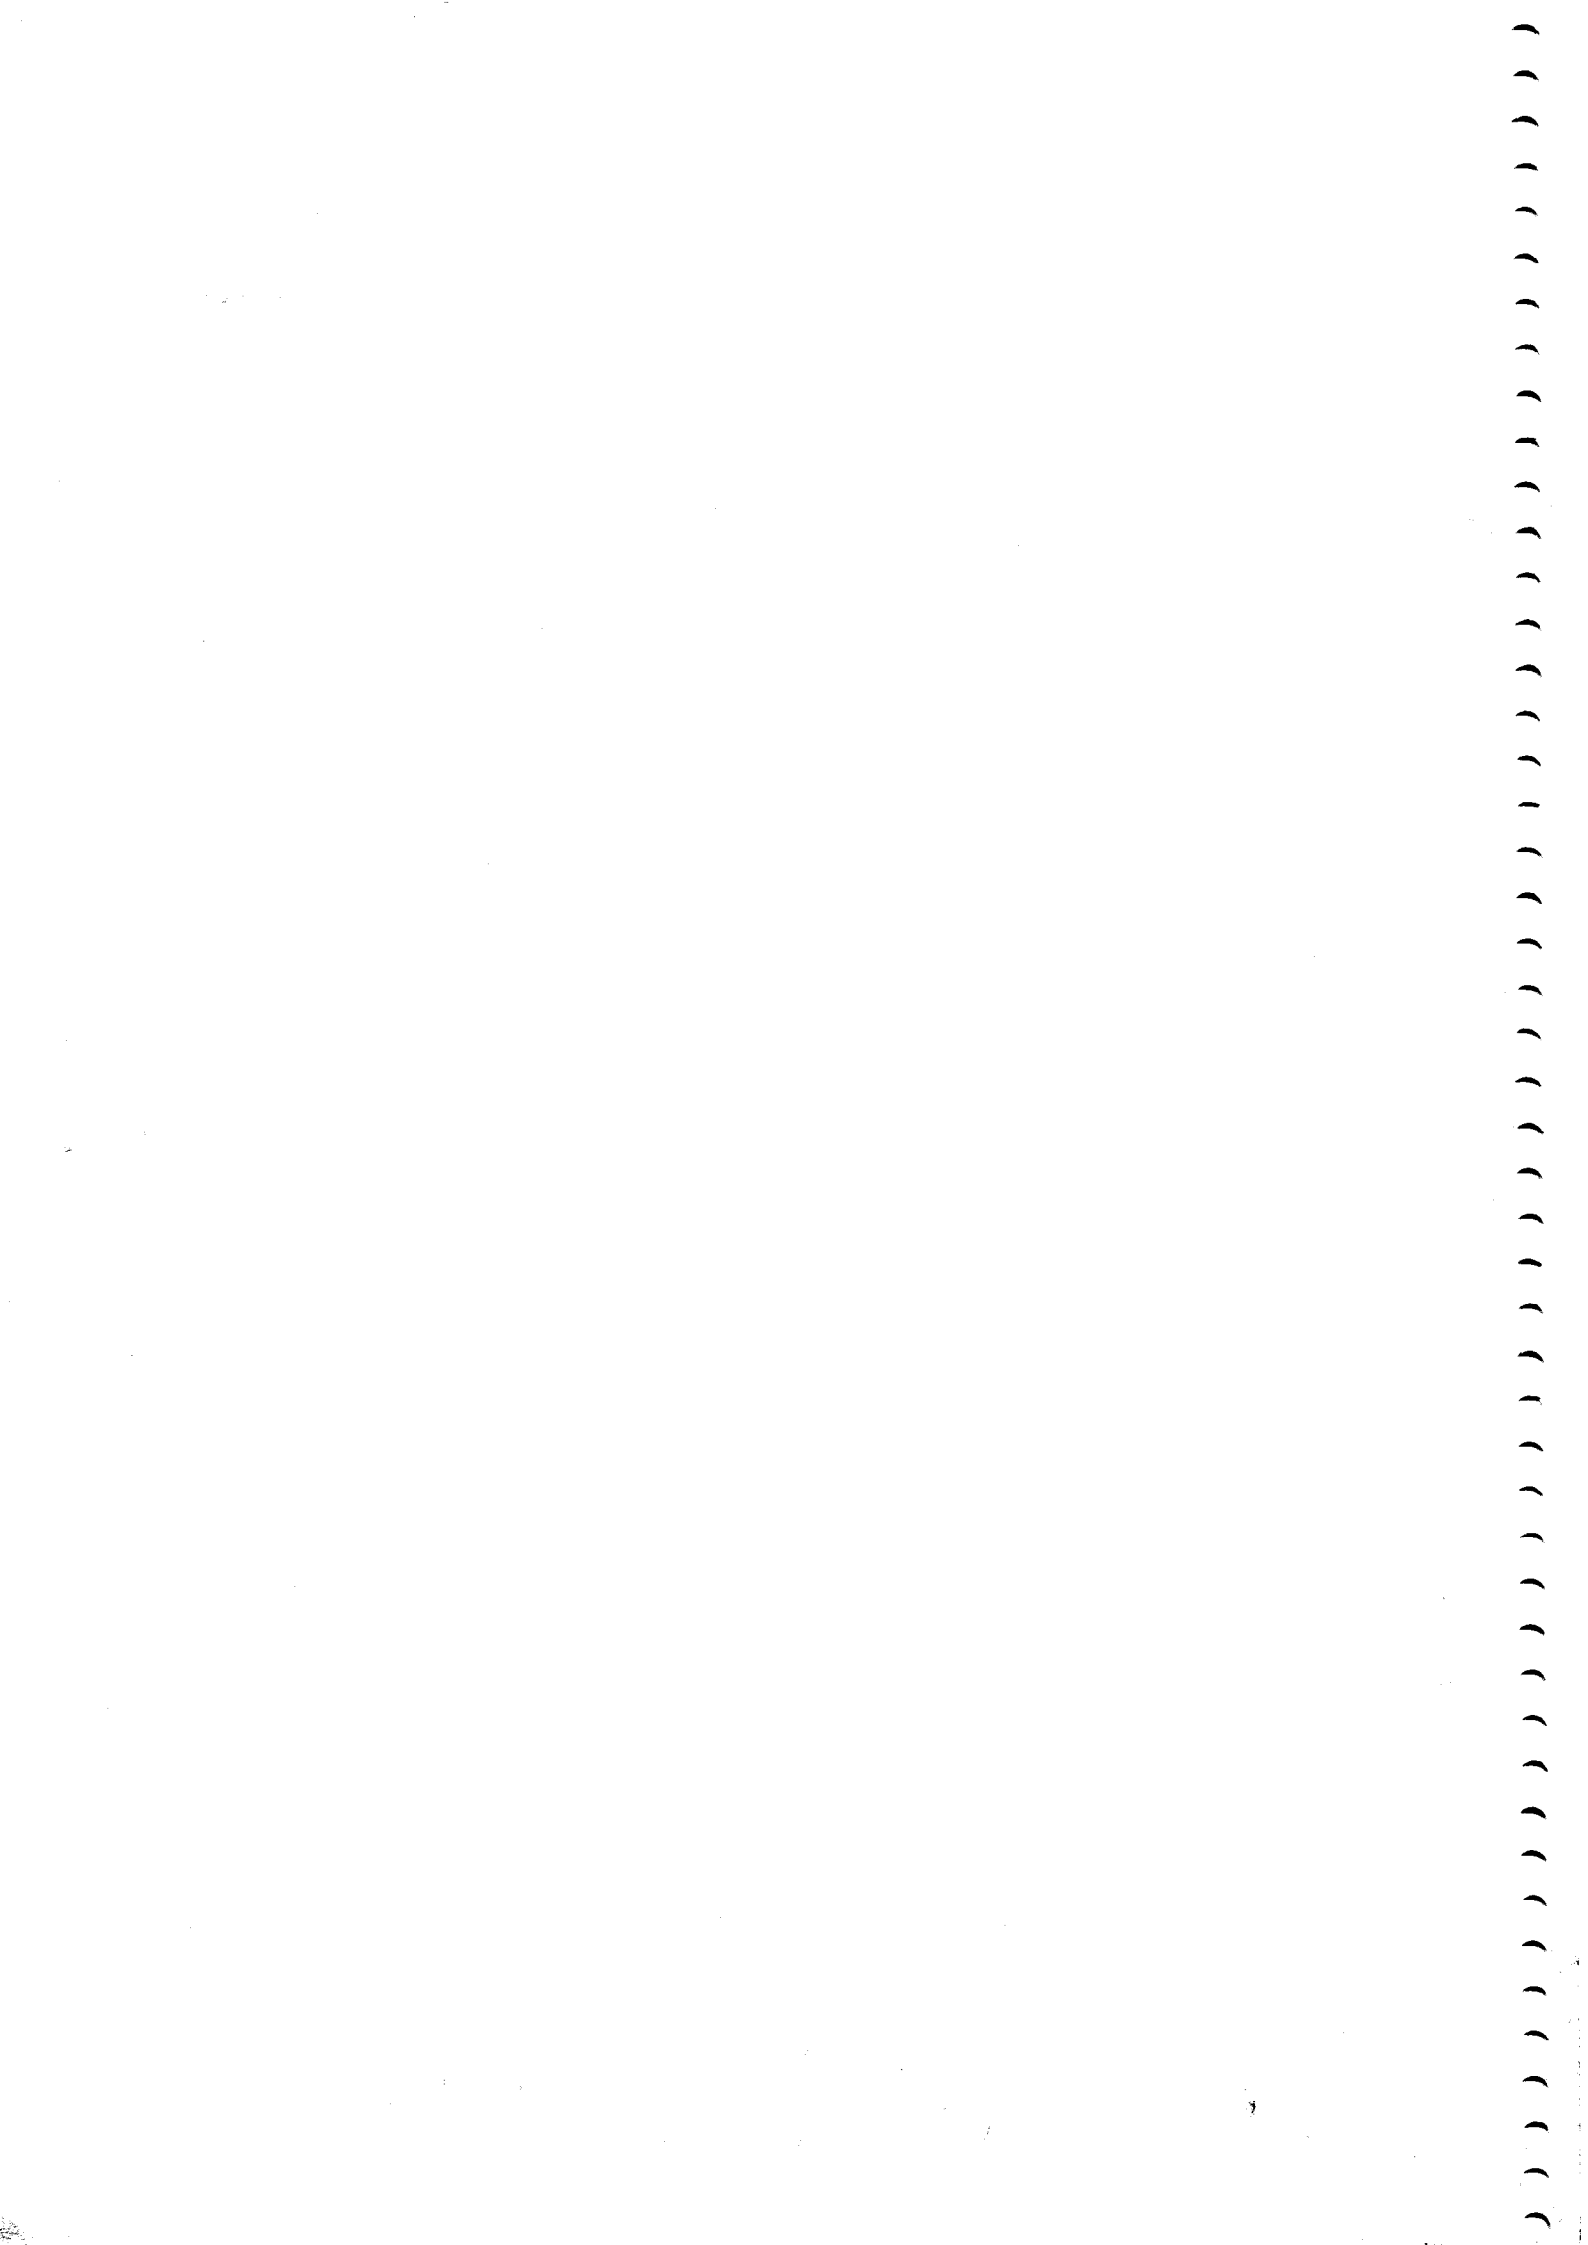
### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE MATERIAL SACO Y LODOS EN PLATAFORMA SUB BATA Y NORTE DEL TROTE 4
- LIMPIEZA DE AV. JINOH BOUVAR.
- CONTROL DE POLVOS DE LAS DOS ESCOMBRERAS
- DISPOSICION DE MATERIAL EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO.

  
J. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

00000010E

PROYECTO No.

FECHA: 10- JULIO-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRASTO Y FIBRA DE OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASTO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBROS; LUDOS Y SEDOS PLATAFORMA SUR BATA Y KURTZ  
LIMPIEZA DE VÍAS  
CONEXION DE BARRIO EN CEMENTADO  
RECEPCION DE MATERIAL SECO; LUDOS EN ESCOMBRERA; OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 3

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 4; Excavadoras 3

Motoniveladoras 4; Volquetas

Rodillos lisos 4; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CAMION  
MEZCLADORA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

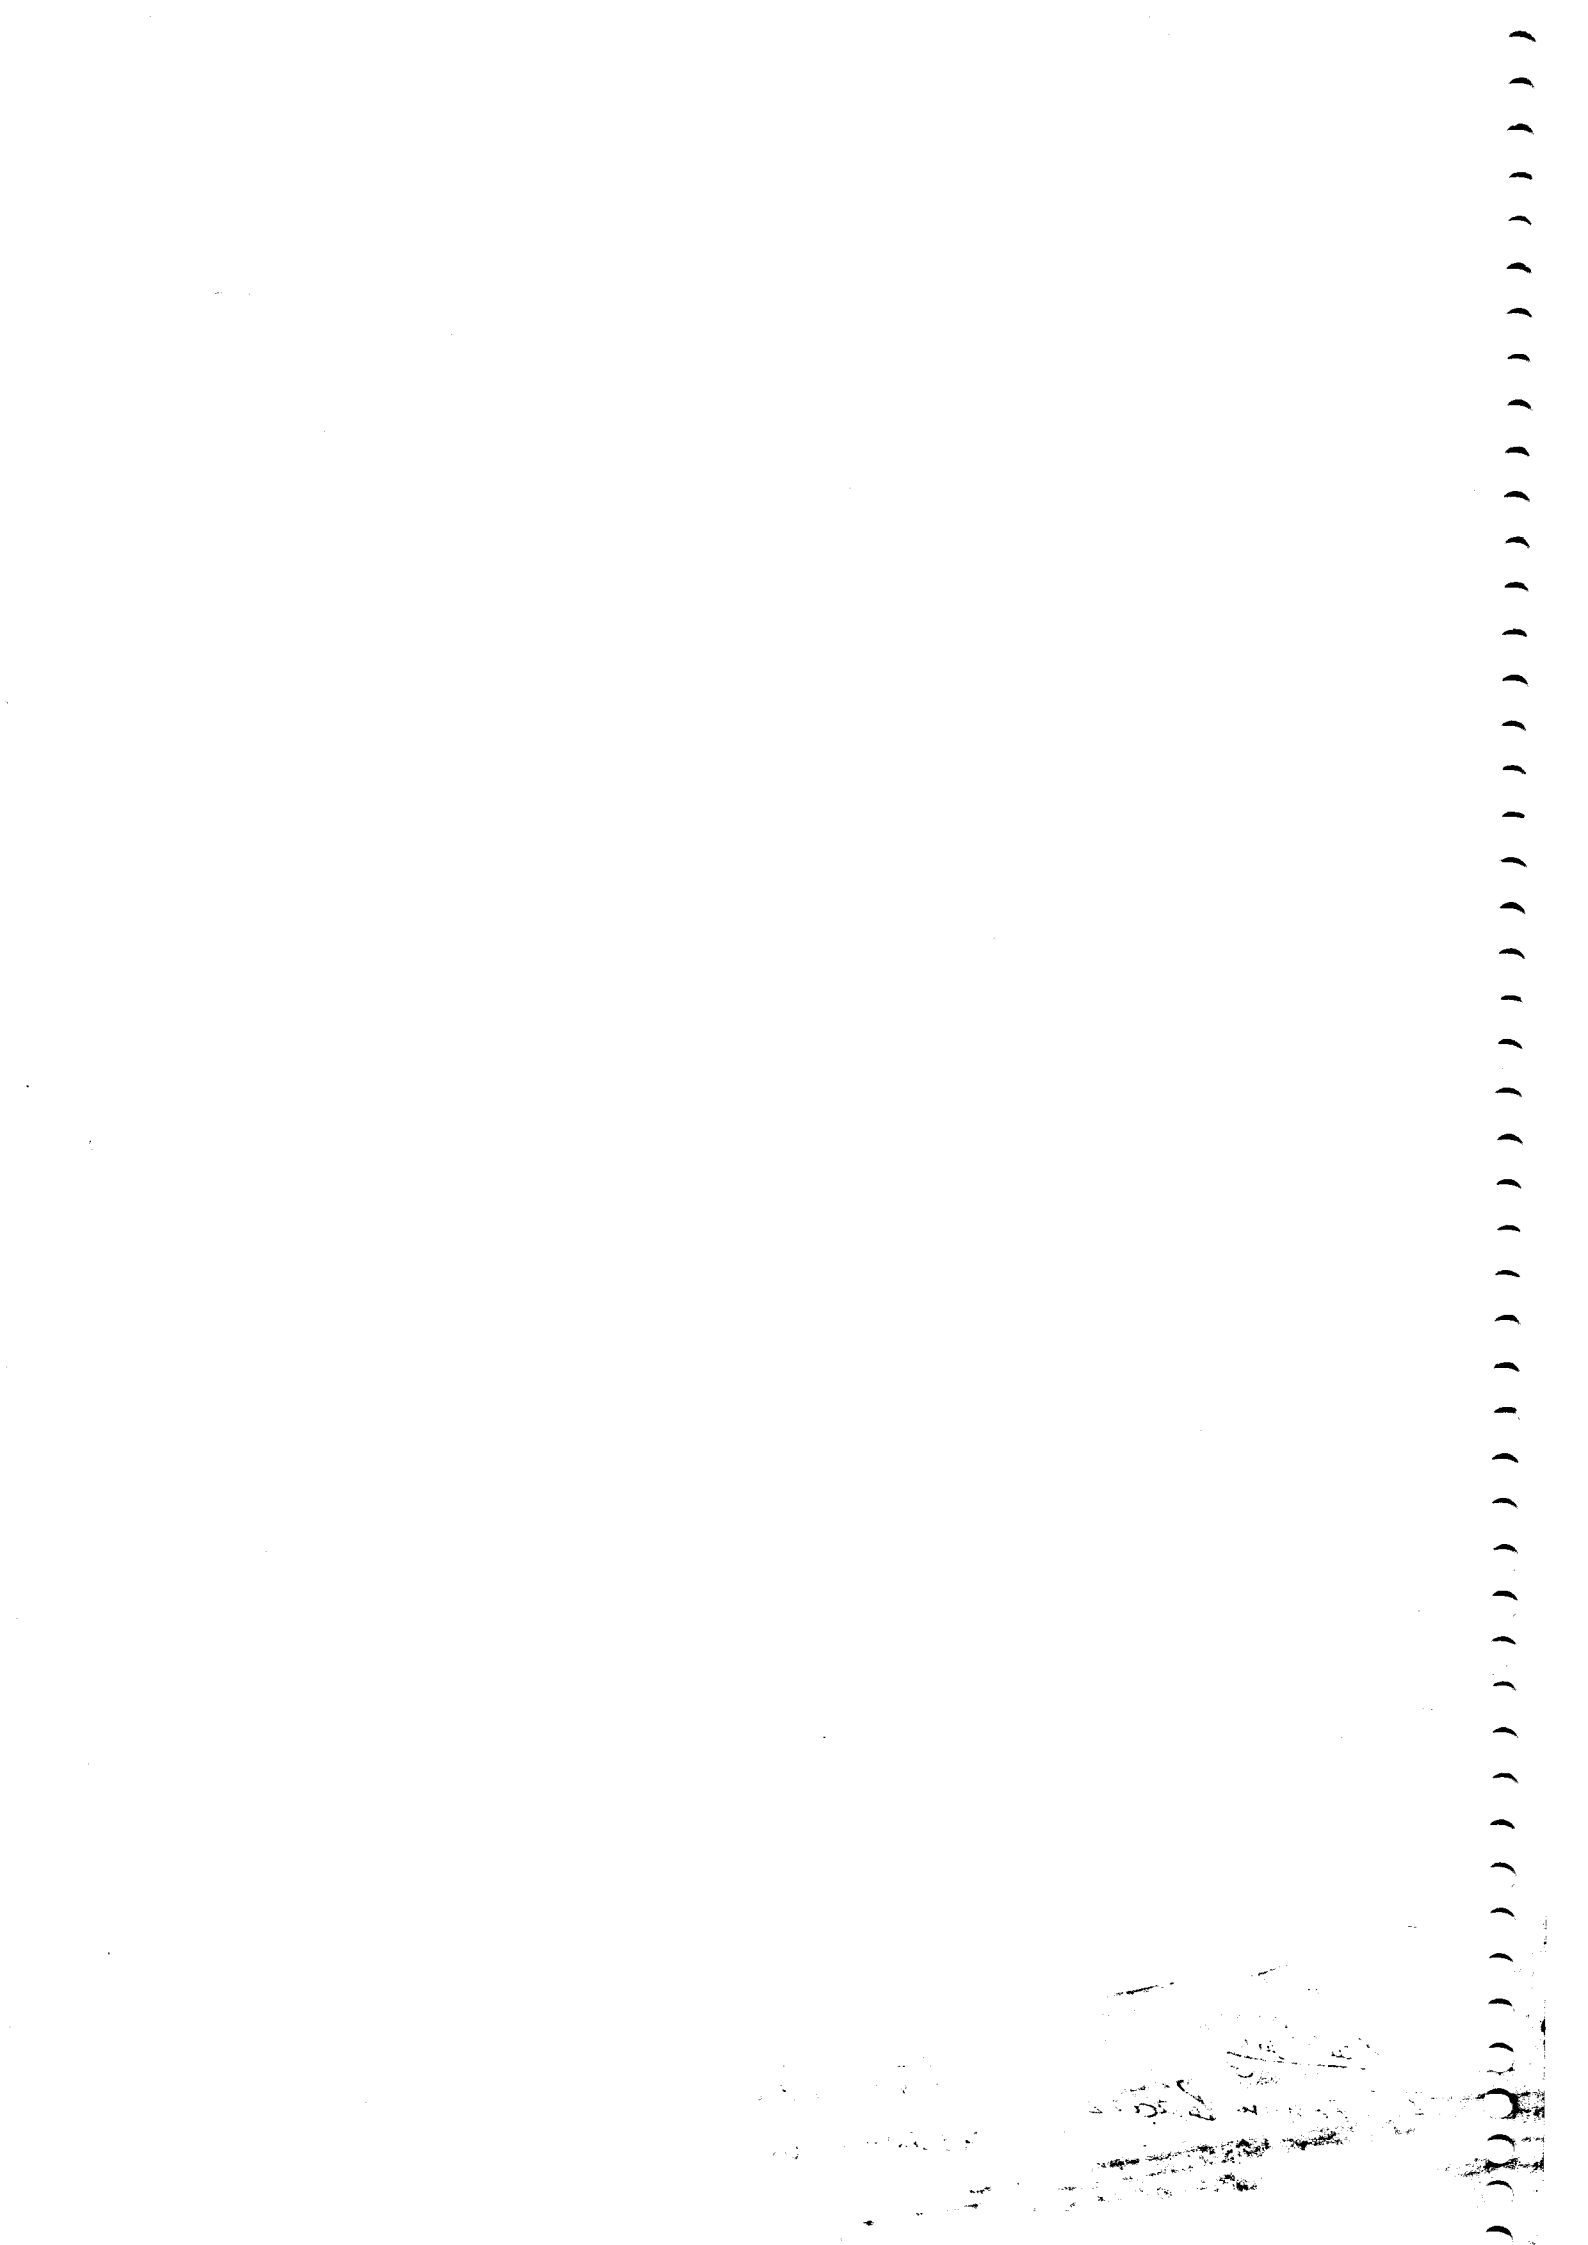
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE BERTHA Y TANDER ESCU  
BUENA EL TRAJE 4
- SE RECIBE MATERIAL SECO Y LUDOS F. PLATAFORMA INFERIOR SUR  
Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL.
- CONTROL DE POLVO EN LAS DOS ESCOMBRERAS.
- LIMPIEZA AV. SIMON BOLIVAR
- RECEPCION DE MATERIAL EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO.

  
INGENIERO ROBERTO  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000105

PROYECTO No: \_\_\_\_\_ FECHA: 7-11-2017 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TIPO 4 FASE II Y OTACITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TIPO - OTACITO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

TRABAJOS DE VÍA  
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS  
MANTENIMIENTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: \_\_\_\_\_  
RESIDENTE: \_\_\_\_\_  
TOPÓGRAFOS: \_\_\_\_\_  
OPERADORES: \_\_\_\_\_  
AYUD. MAQ: \_\_\_\_\_  
CHOFERES: \_\_\_\_\_  
MECÁNICOS: \_\_\_\_\_  
OTROS: \_\_\_\_\_

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3  
Motoniveladoras 2; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra  
Camión Cisterna: 1; RESERVA CUANDO SE NECESITE  
MECANICADOS  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


### OBSERVACIONES

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

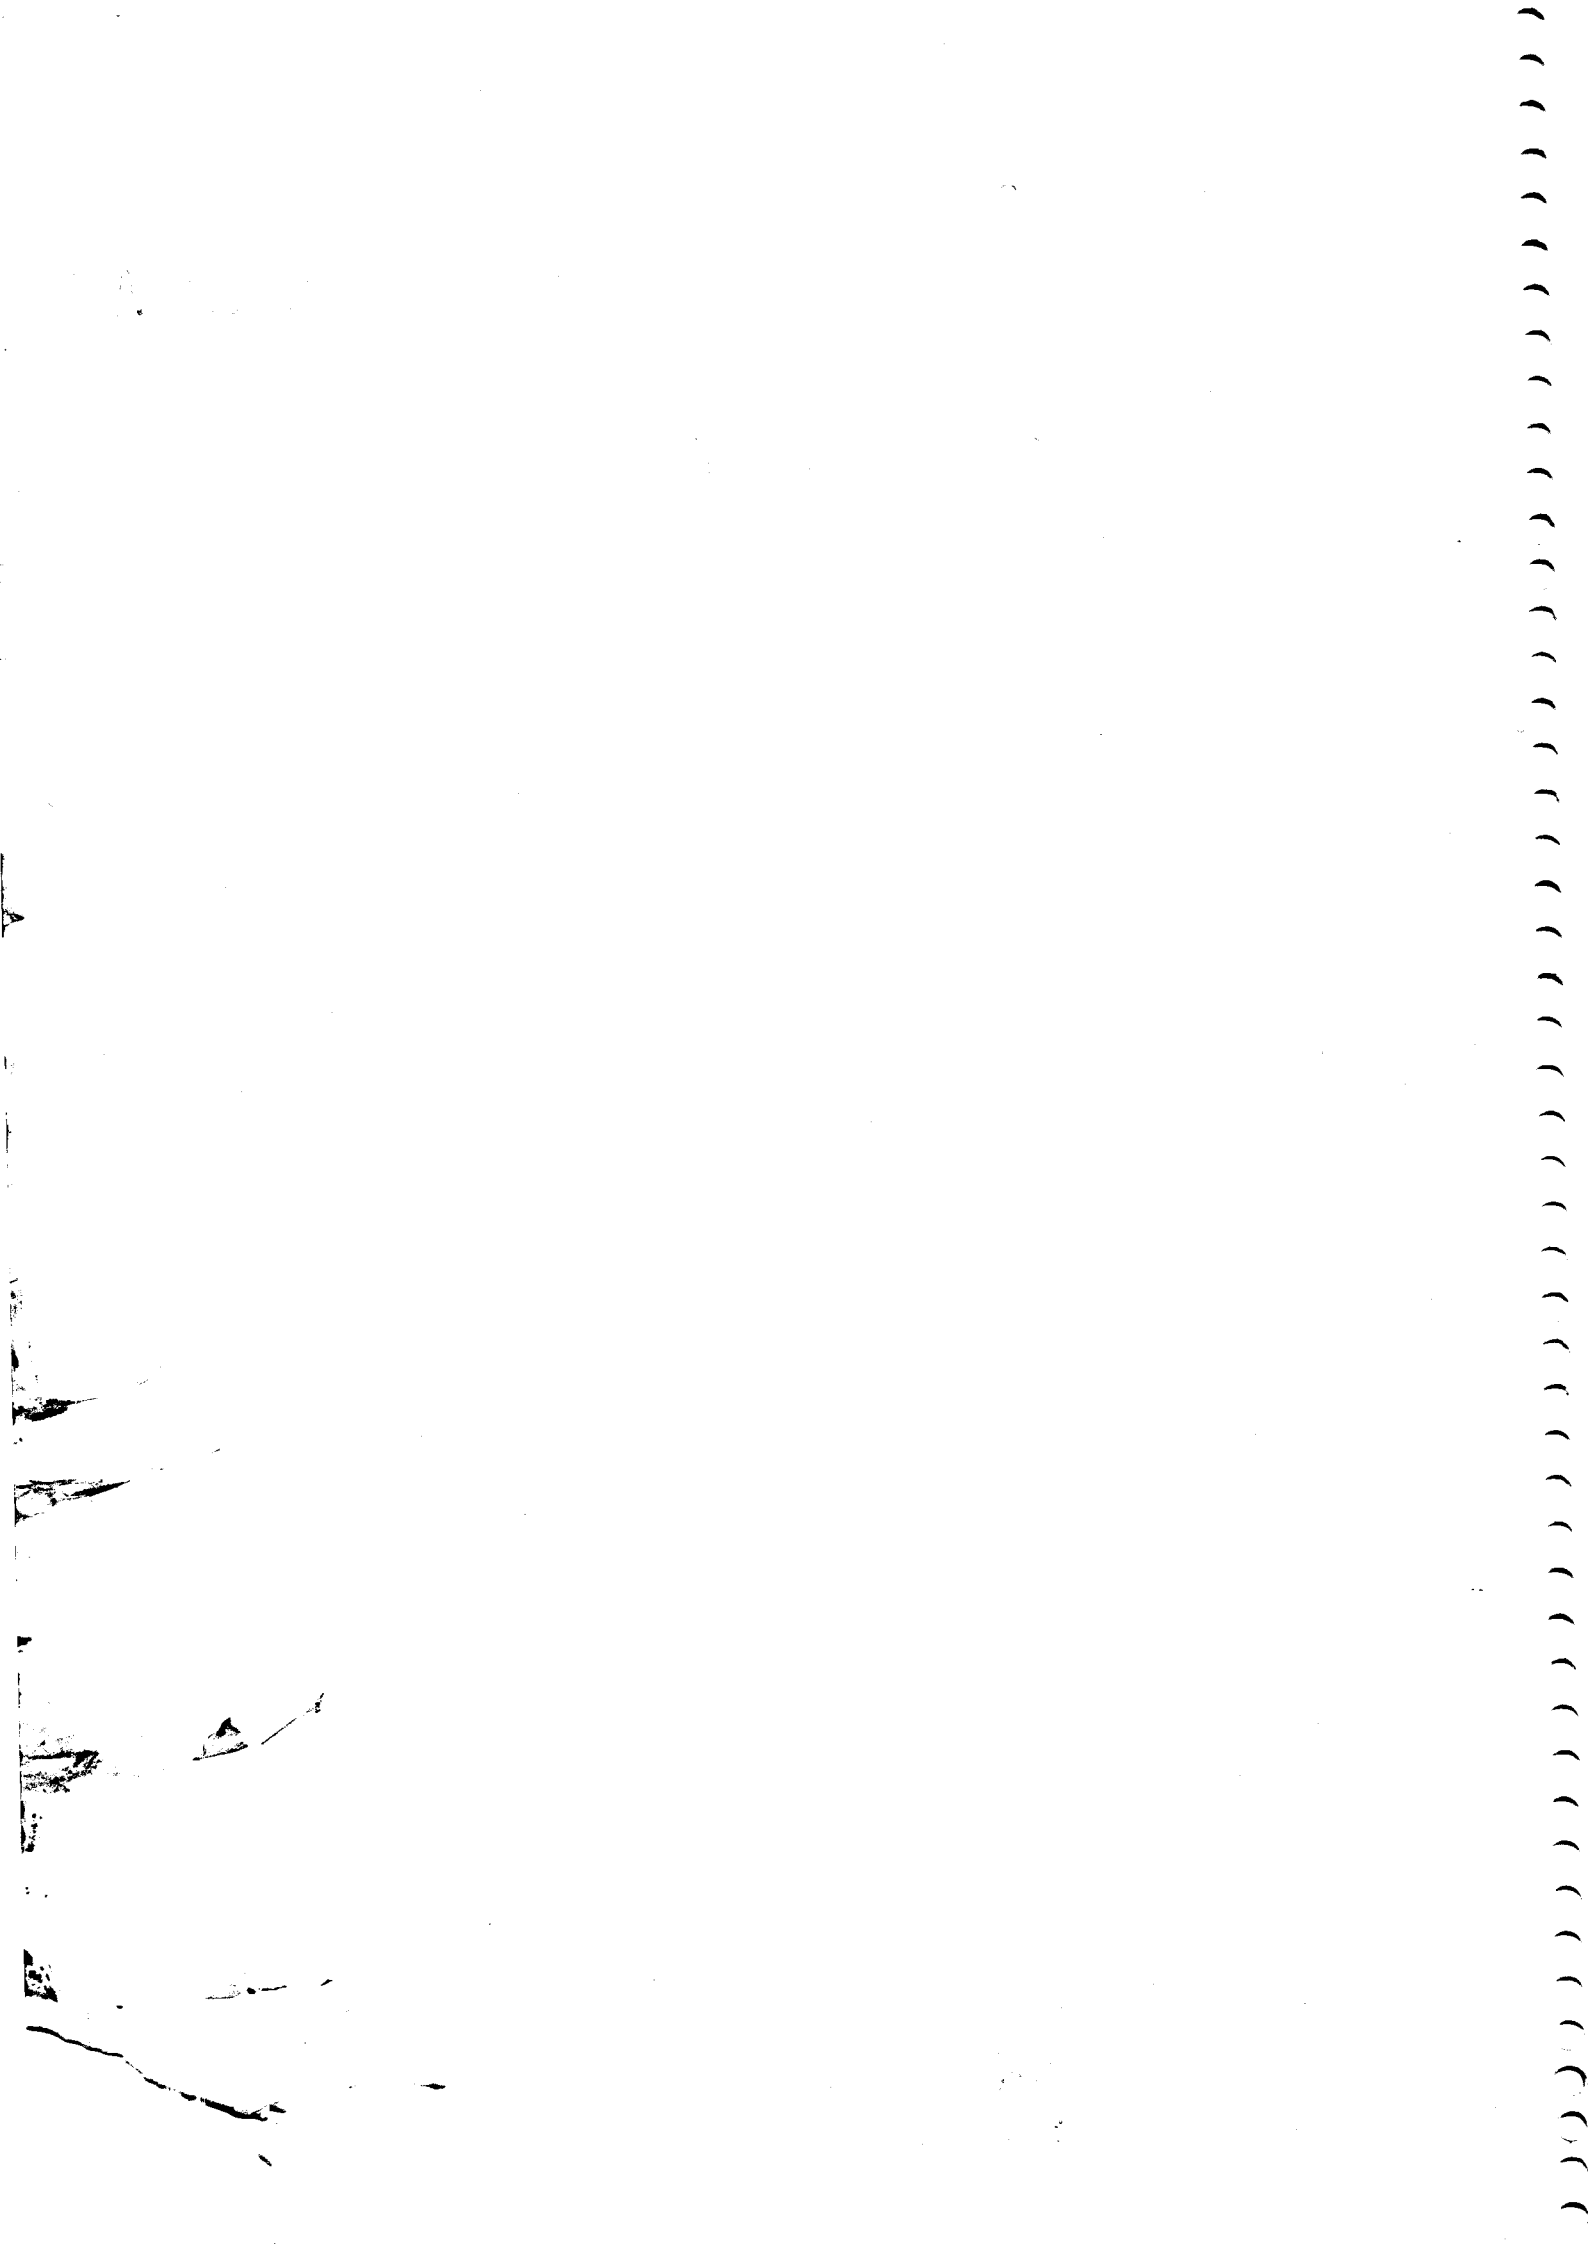
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON OPERACION NORMAL DE LAS DOS ESCOMBRERAS, CUMPLIENDO CON TODA LA PARTE AMBIENTAL.
- OPERANDO SIN NOVEDAD

  
ING. EDMUNDO BARCEL  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CON



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000104

PROYECTO No ..... FECHA: 8-7-2017 DÍA SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONC Y FASE II Y OTACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OTACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, SUELOS Y ESCOMBRERAS; PUNTEO DE NORTE Y SUR  
LIMPIEZA DE VÍAS E HERRAJERÍA  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, SUELOS Y SUELOS ESCOMBRERAS - OTACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 2;

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna 2; DISTRIBUIDORA; CAMION  
MATERIAS PLASTICAS

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:


SE CONTINUA DISPONIENDO TANTO MATERIAL COMO  
LODOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.


- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.


- RECONFORMACION DE VÍAS DE ACCESO E INTERIORES EN LAS  
DOS ESCOMBRERAS.

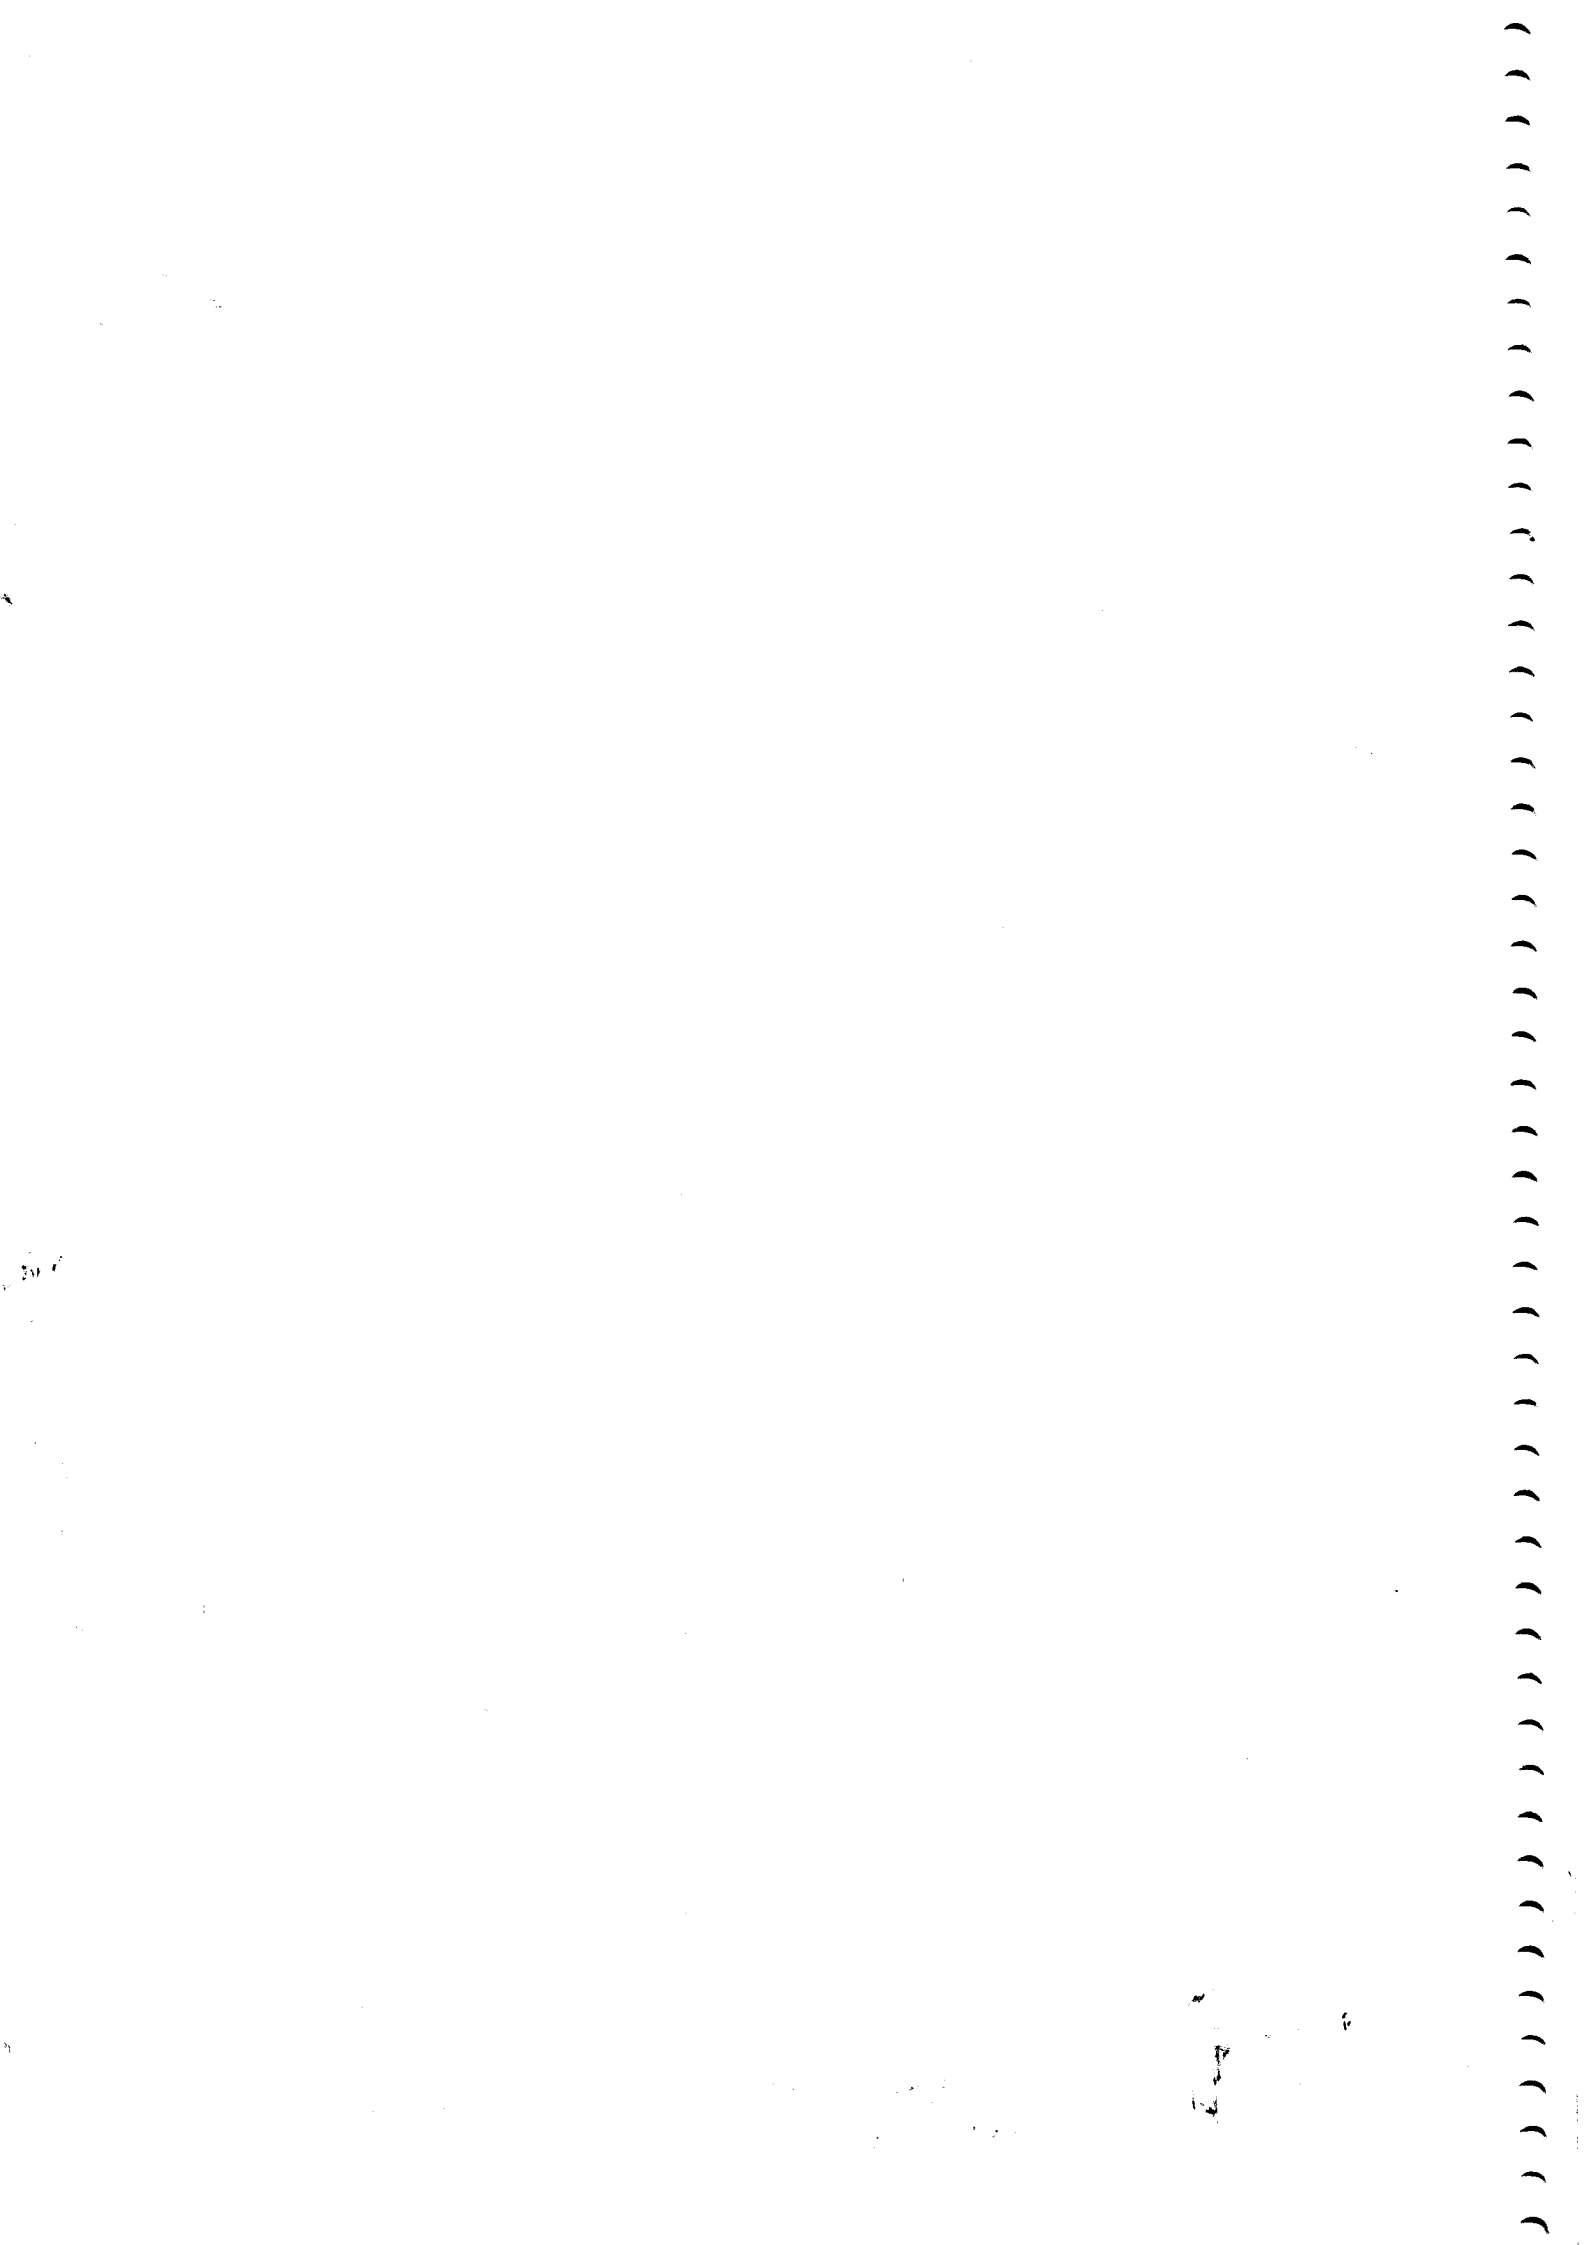
- LIMPIEZA DE LA AV. SIMON BOLIVAR

- CONFORMACION DE TALLERES Y BERTAS, TAJER 4

  
ING. FERNANDO ROSALES  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000103

PROYECTO No. FECHA: 7-JULIO-2017 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONQUE Y FUSO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONQUE-OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBRAS Y SACOS PLASTICOS NOROCCIDENTAL Y SUR.  
LIMPIEZA DE VÍAS Y CONCRETAS  
HIDRATACION DE VÍAS  
RECEPCION DE MATERIAL DE LODO Y ESCOMBROS ESCOMBRERA OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 17  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 3; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RESTOS ESCOMBROS - CAMION  
HIDRATACION  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- DISPOSICION DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR Y NOROCCIDENTAL  
TAJADO DIURNO COMO NOCTURNO.
- LIMPIEZA AJ. SIFON BANAR.
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.
- RECONFORMACION DE VÍA DE ACCESO E INTERNA. ESCOMBRERAS.
- RECEPCION DE MATERIALES EN LA PARTE INFERIOR DE LA VEBEREA  
DE OYACOTO.

  
FERNANDO ROSALES  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000102

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 6-JULIO-2012 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUCOS: PUTAPUÑA NOROCCIDENTAL Y SUR  
NOCHE Y DÍA.  
LIMPIEZA E RECONSTRUCCIÓN DE VÍA  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y Lodos ESCOMBREIRA OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 17  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RECONSTRUCCIÓN: OYACOTO  
METROPOLITANA  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter. _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter. _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter. _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- CONFORMACION DE PLATAFORMA SUPERIOR SUR.
- CONFORMACION DE BARRA Y TACUDES EN PARTE SUPERIOR DE LA ESCOMBREIRA, SECTOR DE LA DESCARGA DEL COLECTOR, TRASE 4
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBREIRAS.
- DISPOSICION DE MANTENIMIENTO EN ESCOMBREIRA DE OYACOTO.
- LIMPIEZA DE LA AJ. SIMON BOLIVAR.

  
ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000101

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 5 - JULIO - 2017 DÍA: Martes  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRERAS, LUGOS Y SEOS EN PLATAFORMA NORTE Y SUR,  
LIMPIEZA DE VÍAS  
HIZOQUEZA DE VÍAS  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRERAS Y LUGOS ESCOMBRERAS - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: \_\_\_\_\_  
RESIDENTE: \_\_\_\_\_  
TOPÓGRAFOS: \_\_\_\_\_  
OPERADORES: \_\_\_\_\_  
AYUD. MAQ.: \_\_\_\_\_  
CHOFERES: \_\_\_\_\_  
MECÁNICOS: \_\_\_\_\_  
OTROS: \_\_\_\_\_

1  
1  
1  
1  
2  
2

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas \_\_\_\_\_  
Rodillos lisos 1; Neumáticos \_\_\_\_\_; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA, OMOV  
MOTONIVELADORA  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE RECIBE MATERIAL SECO Y LUGOS TAJTO EN PLATAFORMA SUR INFERIOR CON PLATAFORMA NORTE E. EL TRAJE 4, TAMBO DIURNO Y NOCTURNO
- CONTROL DE POLVO PERMANENTE EN LA ZONA DE ESCOMBRERAS.
- LIMPIEZA DE AV. JINJA BOLIVAR.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN HIZOQUEZA DE OYACOTO, SOLO DIURNO.

  
FERNANDO SANCHEZ  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000100

PROYECTO No. .... FECHA: 4- JULIO-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EN TRAZO 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTASA - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESPEJE DE MATERIAL DE ESCOMBROS: Lodos y Secos PLATAFORMA SUP Y NODOS  
HIDRATACION DE VIB  
LIMPIEZA DE VIB  
DISPOSICION DE MATERIAL DE OBRAS; ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: .....  
AYUD. MAQ.: .....  
CHOFERES: .....  
MECÁNICOS: .....  
OTROS: .....

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

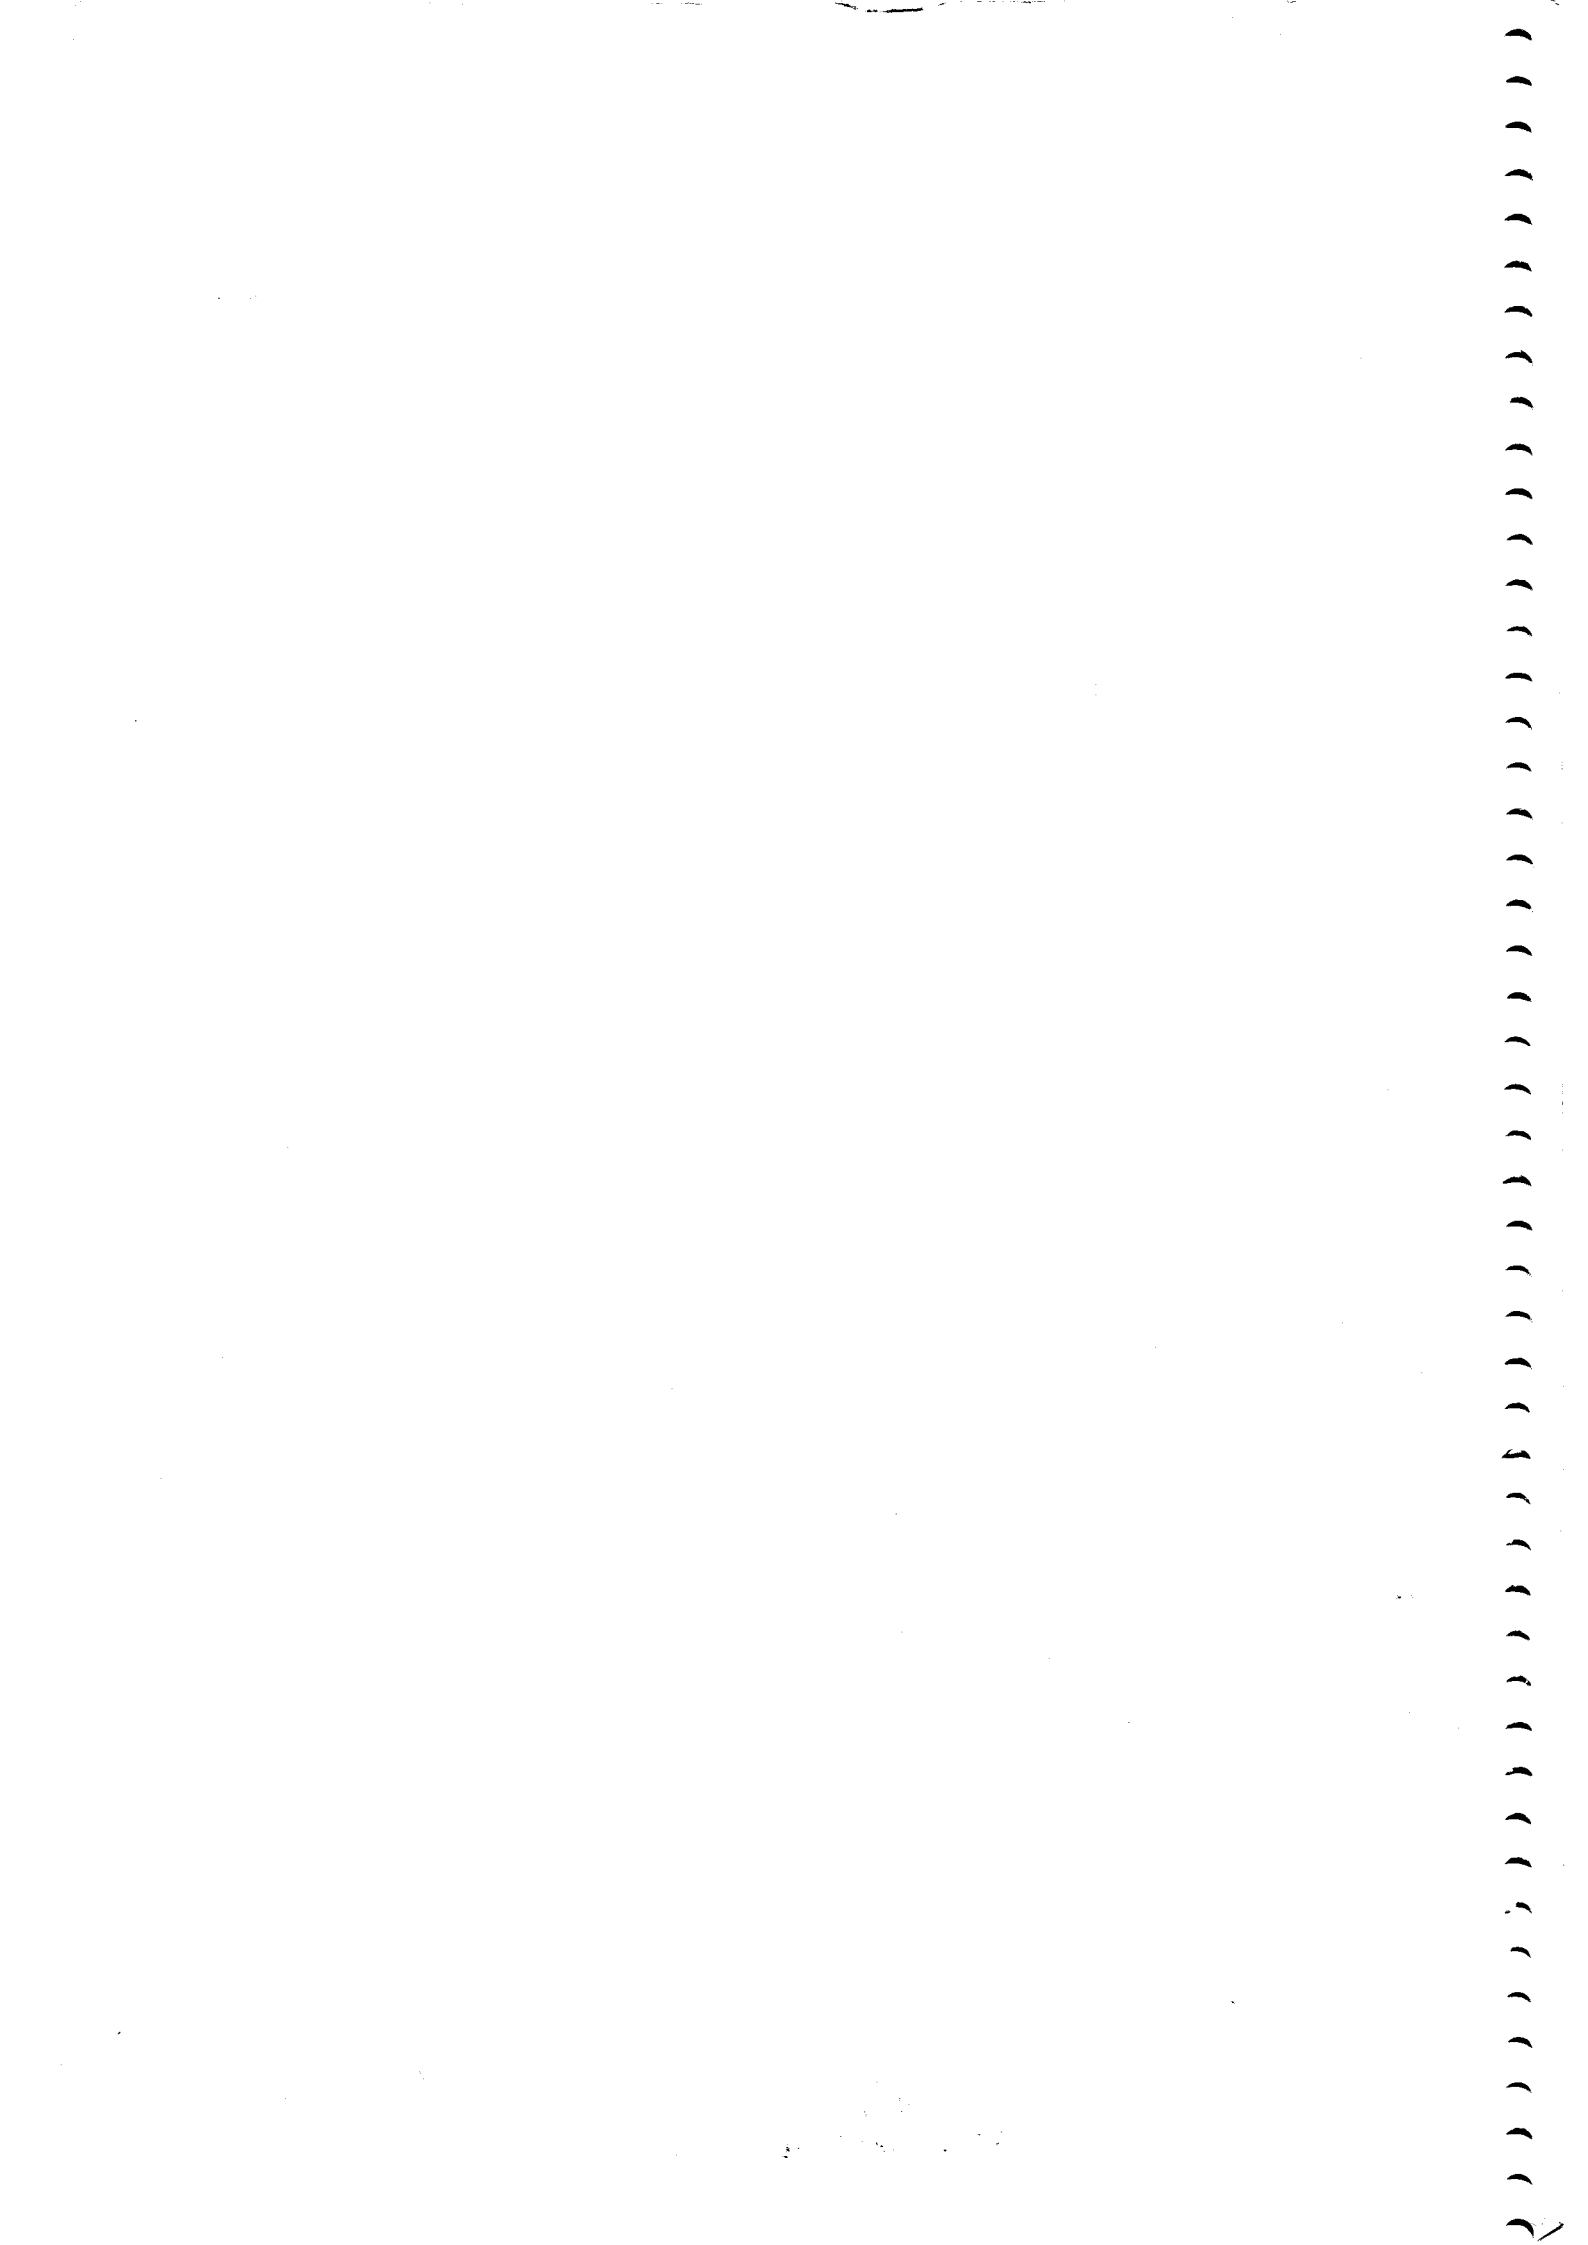
- OPERACION NORMAL TRAZO EN ESCOMBRERA TRAZO 4  
CON OYACOTO.

- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.

  
ING. FERNANDO BACAL  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000099

PROYECTO No ..... FECHA: 3-JULIO-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONDO 4 FRS II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONDO - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS, SUELOS PLATAFORMA SUR Y NOROCCIDENTAL DE USL  
LIMPIEZA DE USL  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 4  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 17  
AYUD. MAQ.: 8  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 4; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETRORRETRON: CAMION  
MECANIZADOR  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

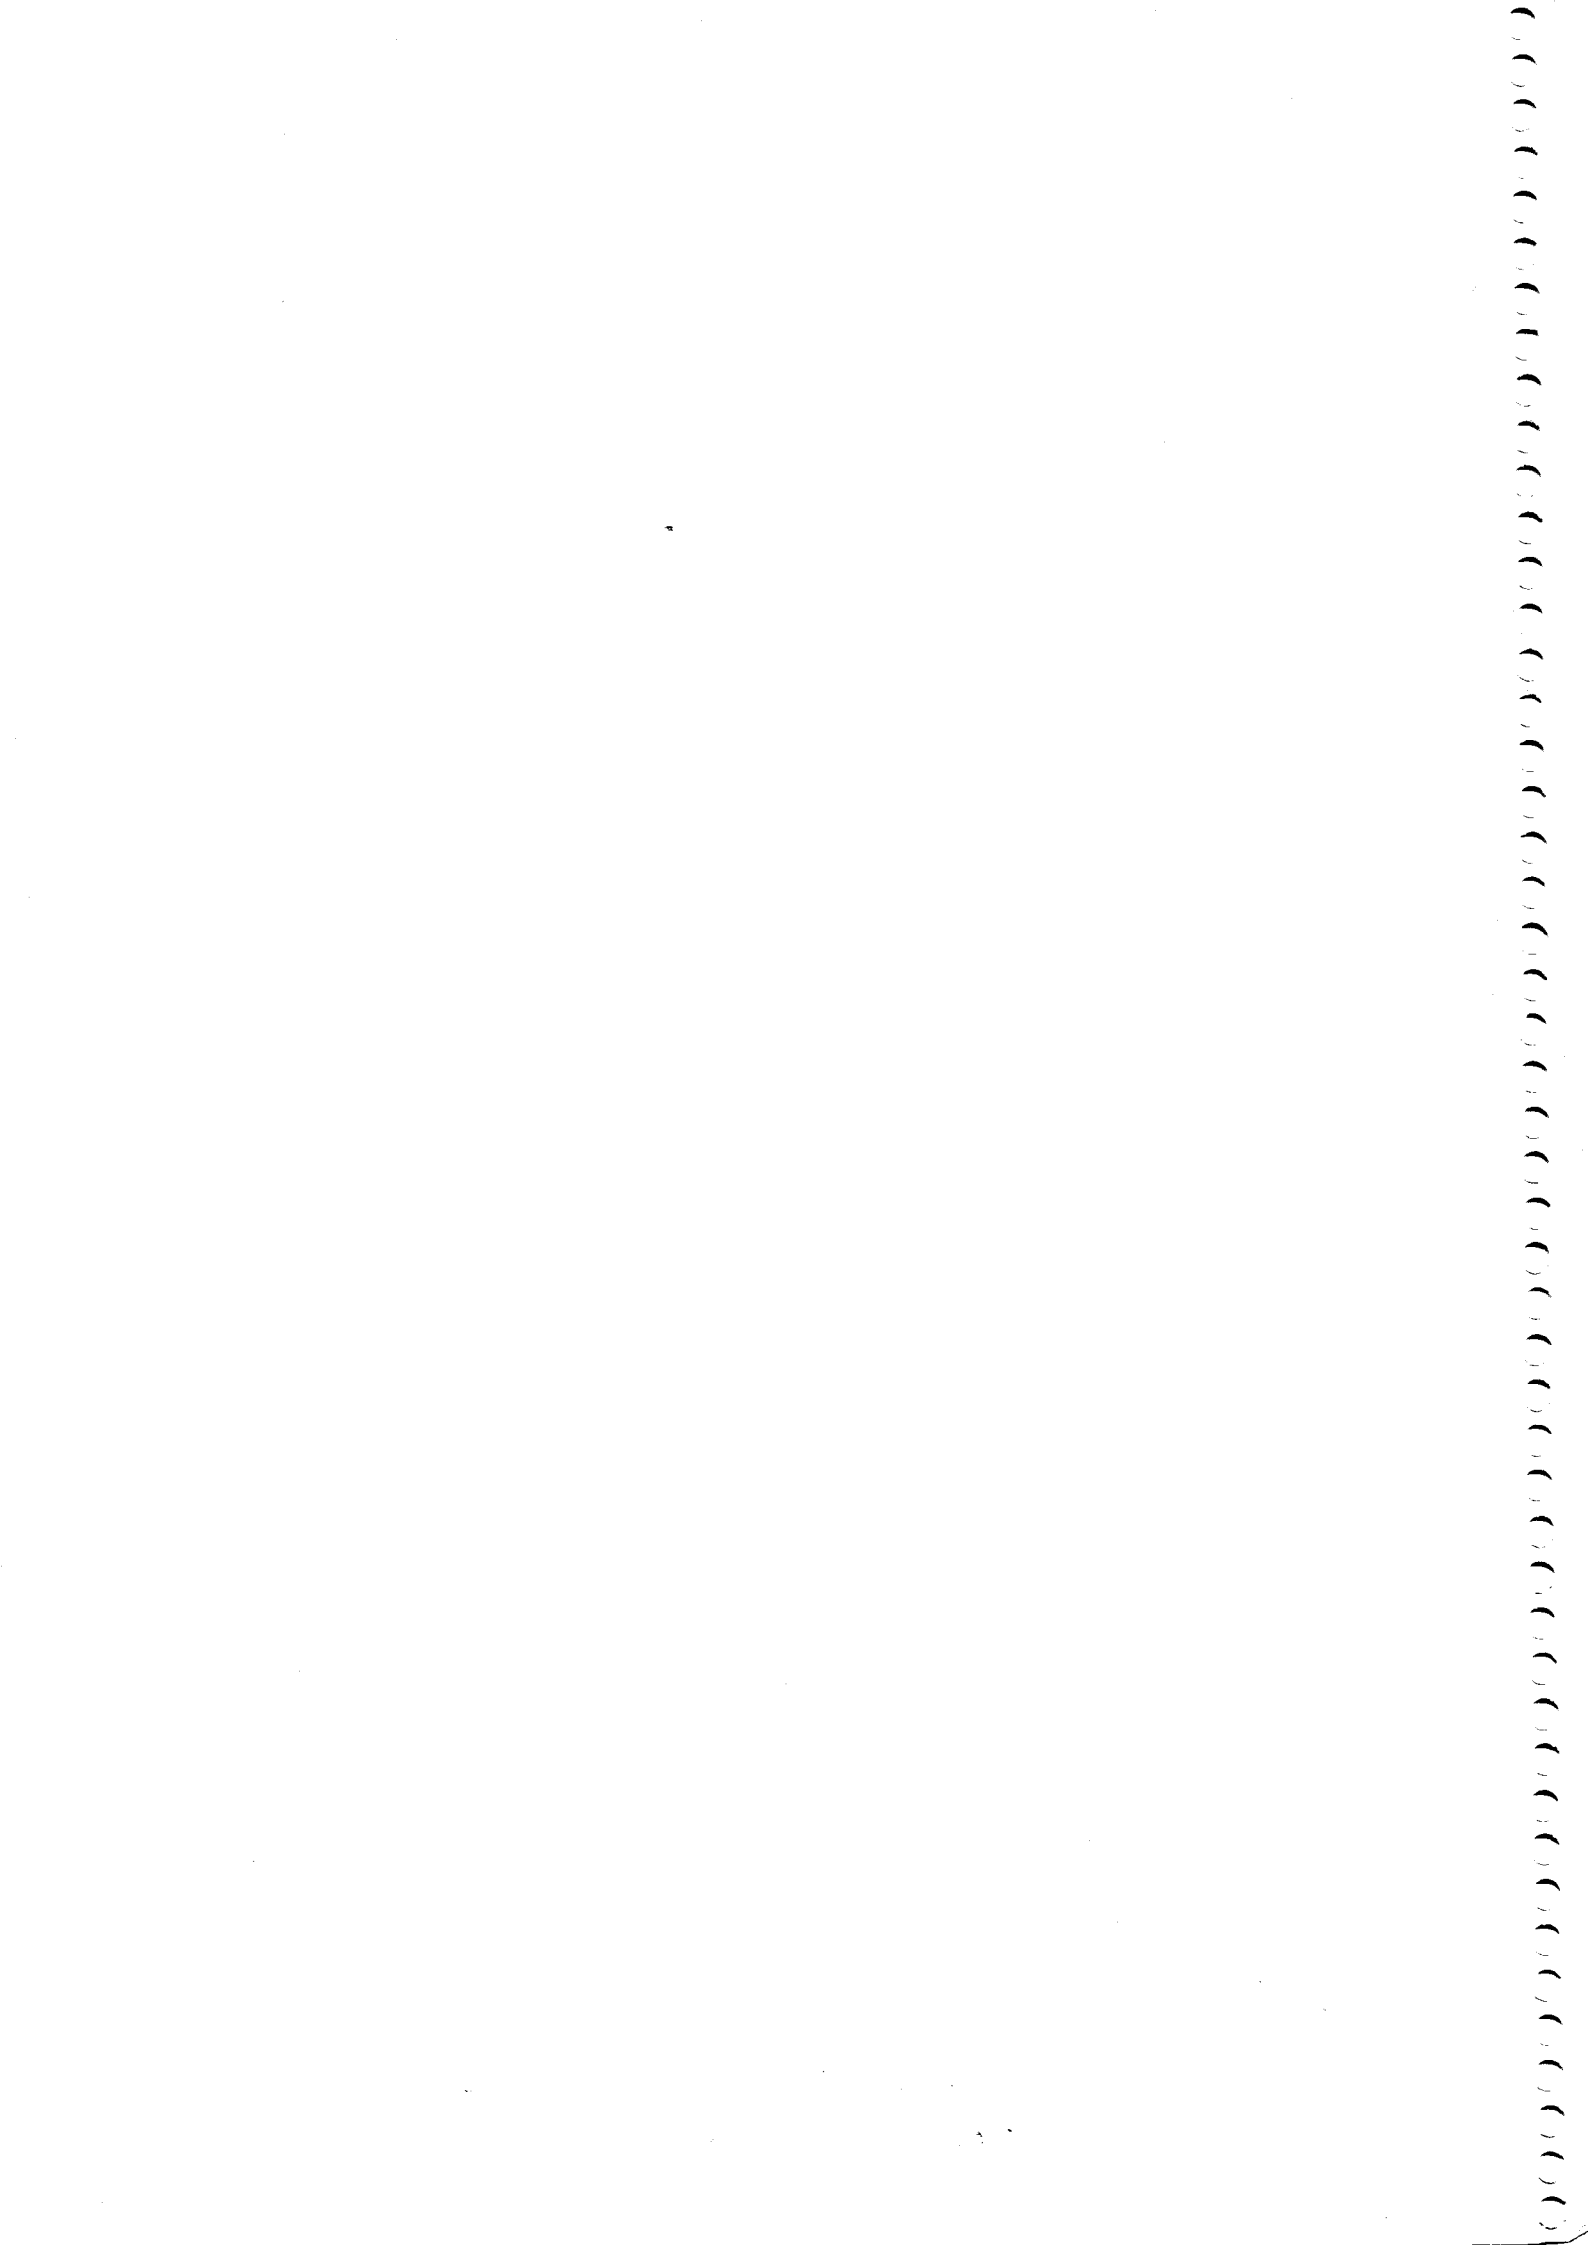
### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE RECIBE LOSOS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR Y NOROCCIDENTAL
- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR.
- CONTROL DE POLVOS.
- RECEPCION DE ESCOMBROS Y LOSOS EN ESCOMBRERA DE OYACOTO

  
Cto. FERNANDO ROSADO  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000093

PROYECTO No. .... FECHA: 2-JULIO-2017 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONQUE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONQUE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA ARREGLA DE PLATAFORMAS SUP Y INFERIOR  
SE CORRIÓ LAS VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS  
MANTENIMIENTO DE ESTADOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 17  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 4  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; REPARACION: CAMION  
MANTENIMIENTO  
Otros: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....


## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

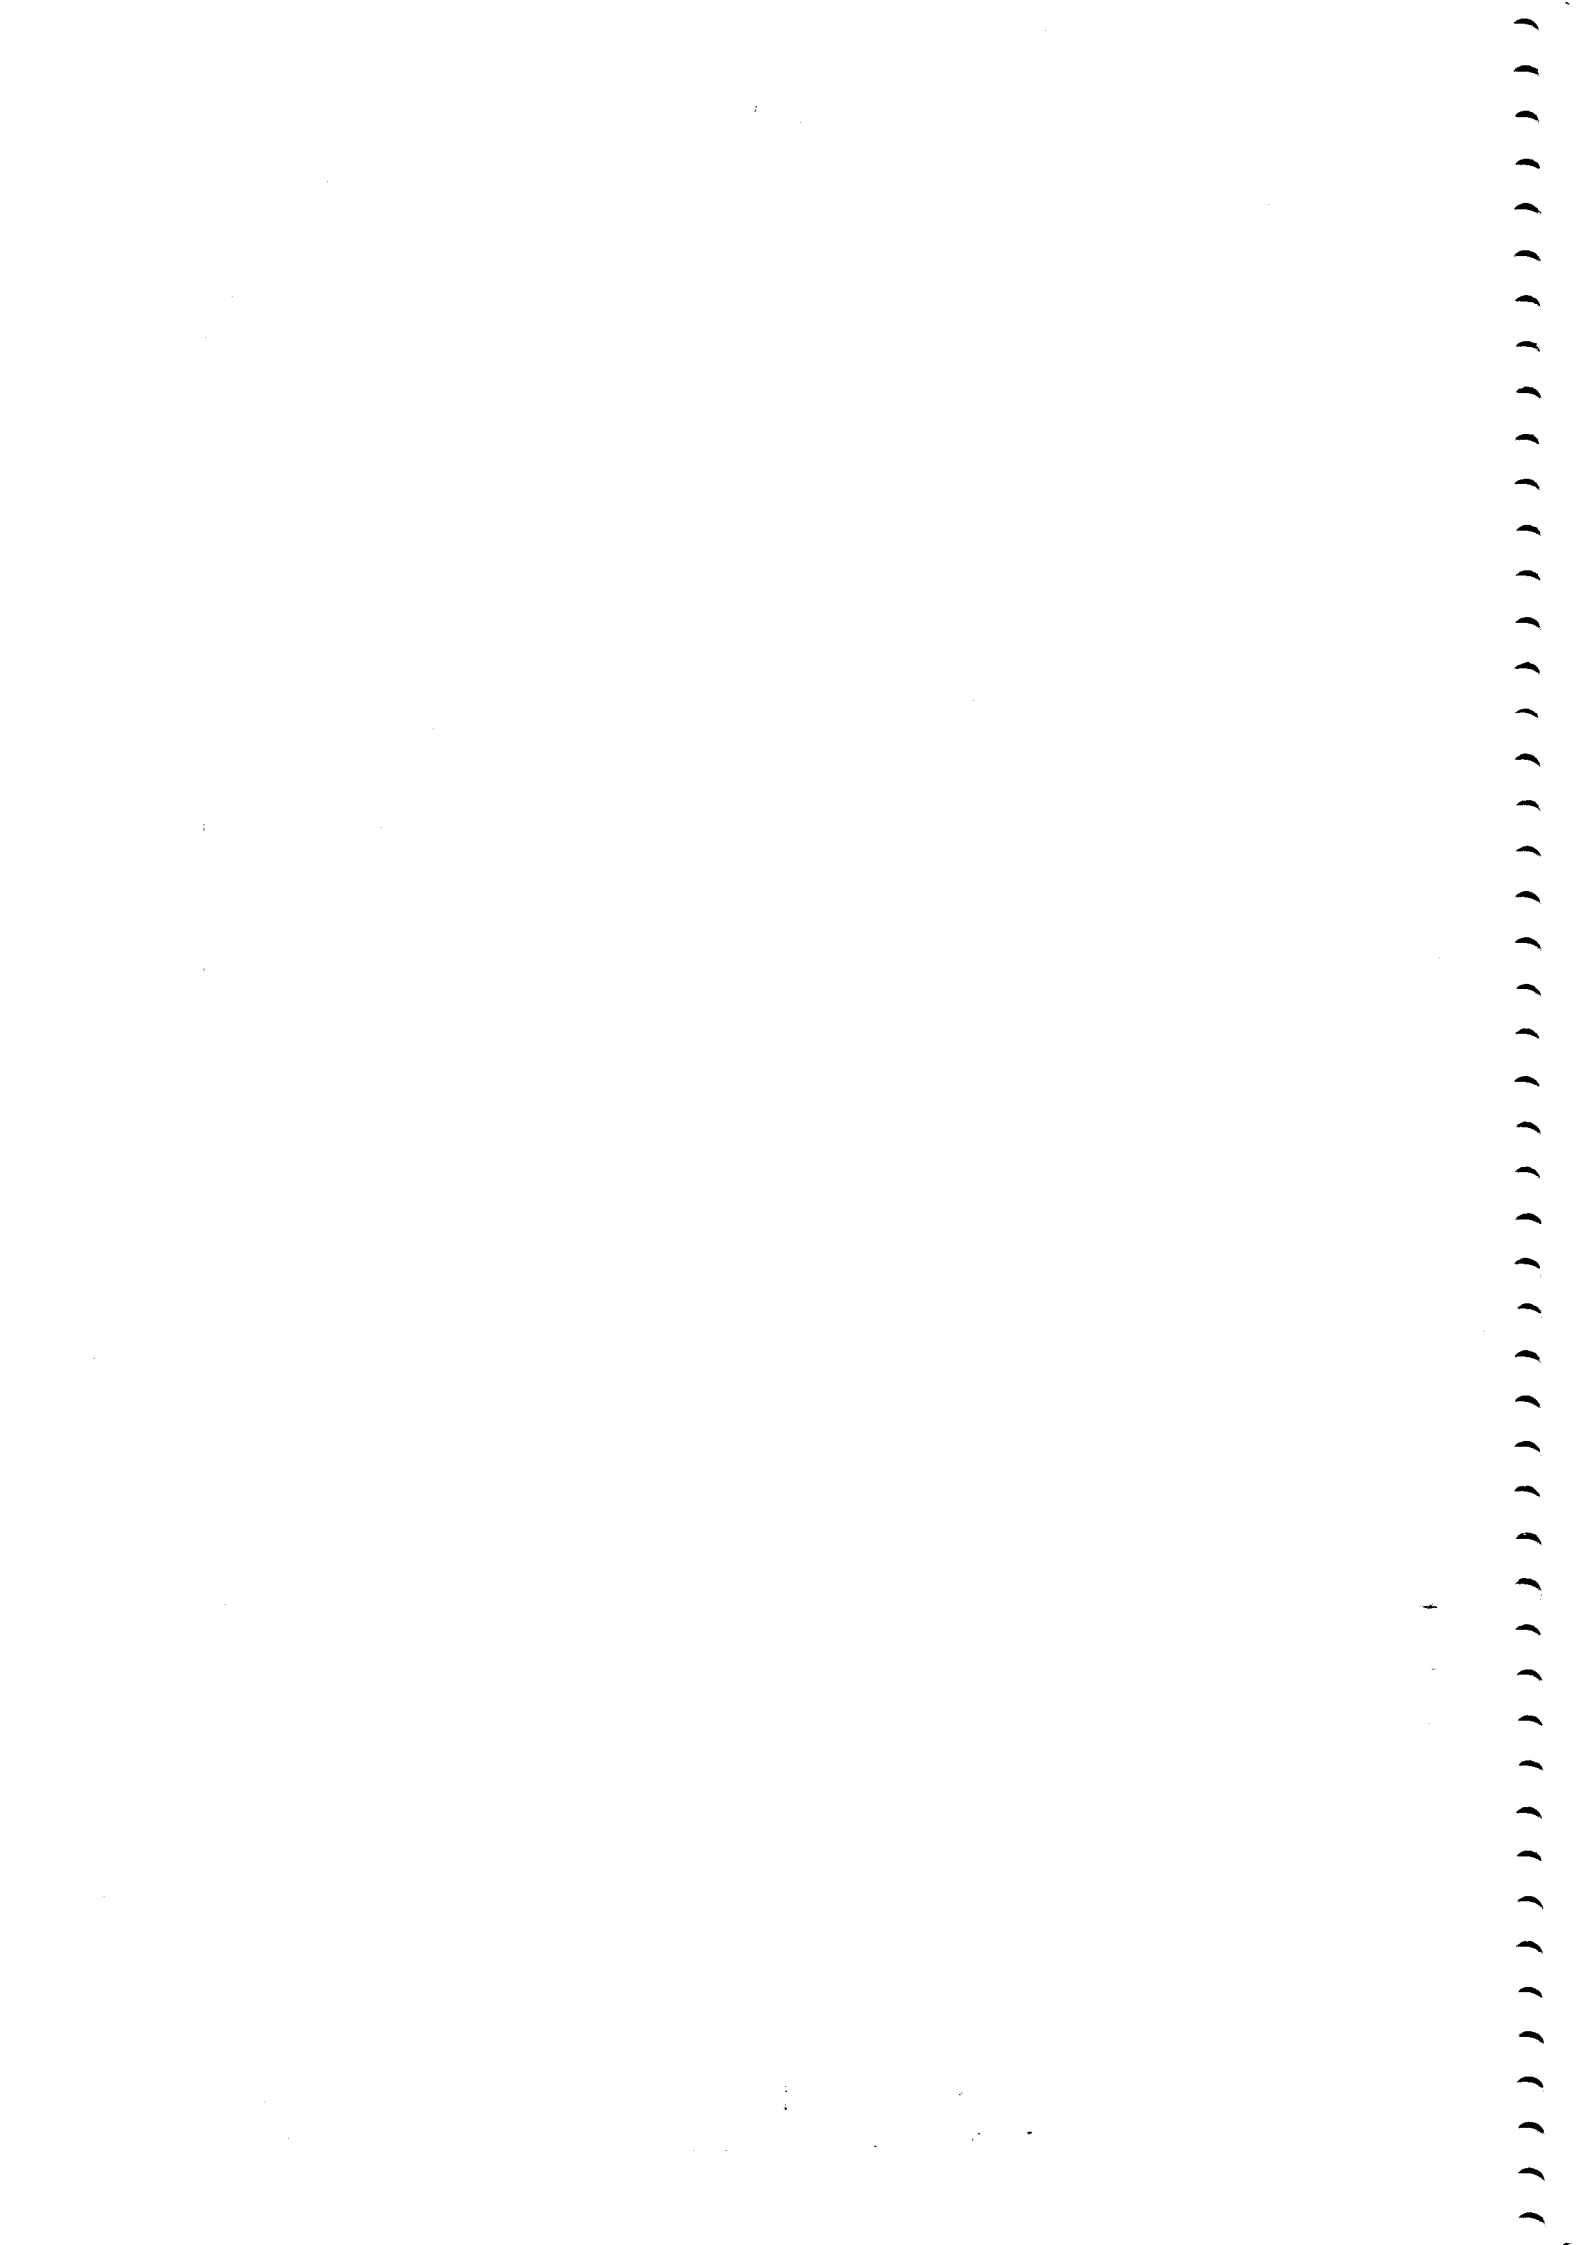
### ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE DIJOSE MATERIAL E PLATAFORMA SUP INFERIOR E INFERIOR.
- MANTENIMIENTO DE VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ESCOMBRERA
- CONTROL DE POLVO.
- LIMPIEZA PERMANENTE DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR

  
ING. FERNANDO F. DUCO  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000097

PROYECTO No. .... FECHA: 1 JULIO 2017 DÍA: SABADO ✓  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRONCHAYASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCHAYASE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**  
RESERVA DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR ALTA Y PARTE BAJA  
LIMPIEZA DE VÍAS  
DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS DE OYACOTO

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1 ; Volquetas .....
TOPOGRAFOS: 1	Rodillos lisos 1 ; Neumáticos .....
OPERADORES: 1	Pata de cabra 1
AYUD. MAQ.: 1	Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMIÓN: CAMION MESECARGADOR
CHOFERES: 2	Otros: .....
MECÁNICOS: 2	En reparación: .....
OTROS: .....	Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	✓	.....	.....	.....	.....
TARDE:	✓	.....	.....	.....	.....
NOCHE:	✓	.....	.....	.....	.....


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE RESERVA LODOS EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR E INFERIOR SUR
- LIMPIEZA DE AV SINAH BOLIVAR
- CONTROL DE POLVOS PERMANENTE
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL SECO Y LODOS EN ESTACION DE OYACOTO.

  
ING. FELIPE ROSALES  
CONTRATISTA

  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
