

Quito, 06 OCT. 2017
Oficio

2043 GG-GP

11 OCT 2017
004146

Hoja de Ruta No. 9702-17
Ticket GDOC No. 132072

Asunto: Información Intervenciones año 2016 y 2017, parroquia de Zámbriza

Licenciada
Susana Castañeda Vera
Concejala del Distrito Metropolitano de Quito
Presente


De mi consideración:

En atención al Oficio No. 000260-SC, mediante el cual solicita se realice un informe detallado y debidamente sustentado, de la inversión realizada por la EPMMOP en la parroquia de Zámbriza durante el año 2016 y la obra planificada para el año 2017; al respecto, informo que en el período en mención se ha ejecutado trabajos de mantenimiento rutinario (bacheo y reposición de adoquines) en distintas calles de la parroquia.

En inicios del año 2017 como consecuencia de la etapa invernal, se ejecutaron trabajos emergentes de limpieza del material en las calles Oe2 (México) y la vía antigua a Zámbriza, así también, se ejecutaron estudios para la rehabilitación vial de las calles Ambato, Manabí, Eugenio de Santa Cruz y Espejo y Guayaquil, mismos que comprendieron un análisis de antecedentes, estudio de suelo, diseño de pavimentos, topografía, diseños geométricos, diseños de señalización, presupuesto y drenajes.

Adjunto a la presente, remito cuadro detalle de las intervenciones y los respectivos informes de trabajo diarios de mantenimiento vial.

Atentamente,



Ing. Juan Pablo Solórzano A.

Gerente General (S)

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA **RECEPCIÓN**

Fecha: **12 OCT 2017** Hora **9h51**

Nº. HOJAS **- 7h -**
Recibido por: **MA**

Adj: Oficio No.000260-SC (1 hoja)
Cuadro detalle (2 hoja)
Informes de Trabajo (4 hojas)

cc: Abg. Diego Cevallos, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Elaborado por:	Ing. José Luis Flores M.	GP	Q
Aprobado por:	Ing. Lorena Izurieta Z.	GP	Q
	Ing. Carolina Rodríguez B.	GOP	Q
	Ing. Lorena Beltrán	GEF	Q
TE-MAT	9702-17		
Hoja de trámite	3147		

sc

SECRETARÍA GENERAL
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
CALLE 12 N° 1010
QUITO - ECUADOR
TEL: (02) 2222 1111
WWW.MUNICIPIOQUITO.GOV.EC



9702

2017 SEP 21 AM 11:18

Lic. Susana Castañeda Vera

CONCEJALA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Quito, 11 de septiembre de 2017

Oficio No 000260-SC

Gdoc: 2017-132072

Ingeniero
Juan Pablo Solórzano
GERENTE (S) EPMMOP - Q
Presente

He recibido en este despacho el oficio No 028485-GAD-ZÁMBIZA, remitido por la señora Maribel Alvarez, Presidenta del Gad Parroquial de Zámbez, en el cual manifiesta su inconformidad con el informe de las intervenciones realizadas por en el año 2016 y planificadas para el año 2017 por la EPMMOP.

En el mencionado documento la Presidenta del Gad señala "... el Ingeniero Juan Pablo Solórzano, Gerente General (s) de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, remite un informe de las intervenciones realizadas por la empresa en el año 2016 y planificadas para el año 2017, encontrándonos con la novedad que en el año 2016 existen tres intervenciones en la parroquia sin contar que una de ellas no es ejecutada en el sector de Zámbez; de la misma manera se verifica en el documento que en el año actual tenemos una intervención de seis estudios de las vías de la parroquia con un valor de 36,303.33 dólares, los mismos que como autoridades no tenemos ninguna idea sobre estas ejecuciones que están en un 10% cumplidas....".

Con este antecedente le solicito, muy comedidamente remitir, a este despacho un informe detallado y debidamente sustentado con la documentación que corresponda, de la inversión realizada por la Empresa que usted dirige en la parroquia rural de Zámbez durante el año 2016 y la obra planificada para el año 2017, esto con el fin de realizar un seguimiento efectivo a esta preocupación de la ruralidad del Distrito.

Cordiales saludos.

Susana Castañeda Vera
CONCEJAL MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Vrc

QUITO	
SECRETARÍA DE GOBIERNO	
RECEBIDO POR	<i>Luis Coronas</i>
FECHA	<i>23/09/2017</i>
HORA	<i>11:45</i>

MANTENIMIENTOS RUTINARIOS PARROQUIA DE ZAMBIZA AÑO 2016 - 2017					
FECHA DE INTERVENCIÓN	NOMBRE VÍA	DESDE	HASTA	TIPO INTERVENCIÓN	
26/02/2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYAQUIL	AMBATO	BACHEO	
02/05/2016	SIN NOMBRE - VÍA QUE CONECTA ZAMBIZA CON COCOTOG	ZÁMBIZA	GARCÍA MORENO	BACHEO	
23/06/2016	GUAYAQUIL	JOSÉ MEJÍA LEQUERICA	ESMERALDAS	ADOQUINADO	
12/11/2016	GUAYAQUIL	BENALCÁZAR	JOSÉ MEJÍA	ADOQUINADO	
07/01/2017	ISIDRO AYORA	GUAYAQUIL	11 FEBRERO	ADOQUINADO	
31/01/2017	ISIDRO AYORA	GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	ADOQUINADO	
24/02/2017	ISIDRO AYORA	GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	ADOQUINADO	
04/04/2017	AMBATO	EUGENIO ESPEJO	MÉXICO (OE2)	BACHEO DÍA	
04/04/2017	GUAYAQUIL	MÉXICO (OE2)	SUCRE	BACHEO DÍA	
04/04/2017	MÉXICO (OE2)	AMBATO	VÍA A COCOTOG	BACHEO DÍA	
11/04/2017	AV. SIMÓN BOLÍVAR	LAS PALMERAS	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	BACHEO	
11/04/2017	11 DE FEBRERO	ESMERALDAS	MANABÍ	ADOQUINADO	
11/04/2017	GUAYAQUIL	BABAHOYO	SUCRE	BACHEO	
11/04/2017	AMBATO	JOSE MEJÍA	CUENCA	BACHEO	
11/04/2017	VÍA A COCOTOG	11 DE FEBRERO	GARCÍA MORENO (COCOTOG)	BACHEO	
27/06/2017	AMBATO	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	SIMÓN BOLÍVAR	BACHEO	
27/06/2017	VÍA DE PASO	ZAMBIZA	LLANO CHICO	BACHEO	
18/07/2017	MÉXICO	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	AMBATO	BACHEO	
18/07/2017	GUAYAQUIL	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	ATAHUALPA	BACHEO	



INTERVENCIONES EPMMOP AÑO 2016 - 2017					
TIPO INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD)	ESTADO	AÑO INTERVENCIÓN	
ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE AMBATO DESDE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE HASTA CALLE MANABÍ	\$6.590,04	EJECUTADO	2015 - 2017	
ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE AMBATO DESDE EUGENIO ESPEJO HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR	\$3.194,04	EJECUTADO	2015 - 2017	
ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE MANABÍ DESDE CALLE GUAYAQUIL HASTA CALLE AMBATO	\$2.532,58	EJECUTADO	2015 - 2017	
ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE EUGENIO ESPEJO DESDE CALLE GUAYAQUIL HASTA CALLE AMBATO	\$3.026,07	EJECUTADO	2015 - 2017	
ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUAYAQUIL DESDE CALLE MANABÍ HASTA CALLE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	\$20.987,60	EJECUTADO	2015 - 2017	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CUNETAS VIÁL - SECTOR ZAMBIZA, AV. SIMÓN BOLÍVAR	161,44	EJECUTADO	2017	
EMERGENCIAS	ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA ANTIGUA A ZAMBIZA	396,73	EJECUTADO	2017	
EMERGENCIAS	ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA CALLE MÉXICO HASTA CALLE AMBATO	250,51	EJECUTADO	2017	
TOTAL =		\$37.139,01			

ACTIVIDAD: REPARACION DE ADOQUINADO

FECHA: sábado, 7 de Enero de 2017

SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M	X				
P M	X				

ADMINISTRACIÓN ZONAL:	NOMBRE	SEÑALADO
	EUGENIO ESPEJO	X
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACIÓN DE LA OBRA: 1 DÍA

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:
 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: X

PERSONAL				EQUIPO	
Nº	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	COBACANGO CHURACO JUAN SALVADOR *	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
2	CUENCA SUAREZ JOSE MIGUEL*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
3	MORALES USHINA MAURICIO RENE*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
4	QUISHPE TUMBAICO HENRY MARCELO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
5	ROMERO CHANGO DANNY PATRICIO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
6	RUSSO MARTINEZ JORGE ERNESTO*	Inspector	07H00-15H30		
7	GRANJA CASTELLANO LUIS	Chofer camion	07H00-15H30	CONTRATO	PCQ9899


CALLES INTERVENIDAS												
Nº	PLANIFICADO	CALLE	Nº VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF. vs EJEC.	Nº REPARACIONES	ARENA (m³)	No. TOTAL ADOQUINES NUEVOS	Nº ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	Nº ADOQUINES RE-UTILIZADOS	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	N	ISIDRO AYORA		GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	30%	1	1	50	50	270	16,00
									TOTALES	50	270	16,00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: cargada de material, transporte de personal, ubicación, levantar adoquin suelto, conformar, compactar, adoquinado, emporado, limpieza, desalojo de escombros

OBSERVACIONES: La programacion del día 07/01/2017 no se cumple por no disponer de volqueta

ORDEN DE TRABAJO Nº: 3484
 ORDEN DE SALIDA Nº: S/N GUIA DE REMISION 778

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS

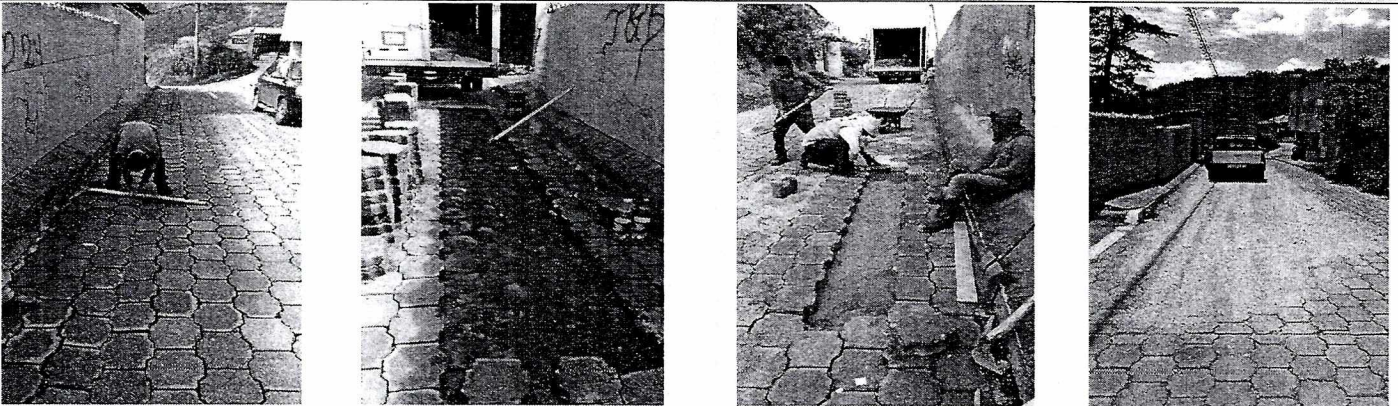

RESPONSABLES

Jorge Russo Martínez
INSPECTOR

SUPERVISOR

Ing. Carlos Calderón
RESPONSABLE DE ZONA NORTE

ACTIVIDAD: REPARACION DE ADOQUINADO

FECHA: martes, 31 de Enero de 2017

SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M	X				
P M	X				

ADMINISTRACIÓN ZONAL:	NOMBRE	ASISTENCIA
	EUGENIO ESPEJO	X
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACION DE LA OBRA: 1 DÍA

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:	
TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:	X

N°	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	COBACANGO CHURACO JUAN SALVADOR *	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
2	CUENCA SUAREZ JOSE MIGUEL*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
3	MORALES USHINA MAURICIO RENE*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
4	QUISHPE TUMBAICO HENRY MARCELO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
5	ROMERO CHANGO DANNY PATRICIO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
6	RUSSO MARTINEZ JORGE ERNESTO*	Inspector	07H00-15H30		
7	GRANJA CASTELLANO LUIS	Chofer camion	07H00-15H30	CONTRATO	PCQ9899


N°	PLANIFICADO	CALLE	N° VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF. vs EJEC.	N° REPARACIONES	ARENA (m³)	No. TOTAL ADOQUINES NUEVOS	N° ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	N° ADOQUINES RE-UTILIZADOS	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	S	ISIDRO AYORA		GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	60%	3	1	50	50	390	22,00
									TOTALES	50	390	22,00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: cargada de material, transporte de personal, ubicación, levantar adoquín suelto, conformar, compactar, adoquinado, emporado, limpieza, desalojo de escombros

OBSERVACIONES:

ORDEN DE TRABAJO N°: 4733
 ORDEN DE SALIDA N°: S/N
 GUIA DE REMISION: 1205

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS

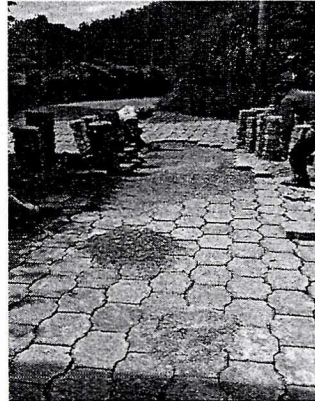

RESPONSABLES

Jorge Russo Martinez
INSPECTOR

Ing. Federico Benavides
SUPERVISOR

Ing. Carlos Calderón
RESPONSABLE DE ZONA NORTE

ACTIVIDAD: BACHEO RUTINARIO (DIURNO)
 SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA

FECHA: martes, 4 de Abril de 2017

ADMINISTRACIÓN ZONAL:	EUGENIO ESPEJO	X
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	
	LOS CHILLOS	
TUMBACO		

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M			X		
P M			X		

DURACIÓN DE LA OBRA: 1 DÍA

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:
 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: X

N°	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	COBACANGO CHURACO JUAN SALVADOR *	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
2	CUENCA SUAREZ JOSE MIGUEL*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
3	MORALES USHÑA MAURICIO RENE*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
4	QUISHPE TUMBAICO HENRY MARCELO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
5	ROMERO CHANGO DANNY PATRICIO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
6	RUSSO MARTINEZ JORGE ERNESTO*	Inspector	07H00-15H30		
7	JUAN ROMERO	Chofer buseta	07H00-15H30	CONTRATO	BUSETA PUJ-0989
8	FAUSTO SORIA	Chofer volqueta	07H00-15H30	LOGISTICA	4204
9	PATRICIO ROMERO	Op Rodillo	07H00-15H30	LOGISTICA	R 44


N°	PLANIFICADO	CALLE	N° VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF. vs EJEC.	N° BACHES	N° ZANJAS	MEZCLA ASFALTICA		VOLUMEN MEZCLA ASFALTICA UTILIZADO (m³)	VOLUMEN EMULSION ASFALTICA UTILIZADO (m³)	SUPERFICIE INTERVENIDA (m²)
									CALIENTE	FRIO			
1	S	AMBATO		EUGENIO ESPEJO	MEXICO	100%	37			X	1,50		30,00
2	S	GUAYAQUIL		MEXICO	SUCRE	100%	29	5		X	4,00		70,00
3	S	MEXICO		AMBATO	VIA COCOTOG	10%	14			X	0,50		10,00
						70%			TOTALES		6		110,00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Transporte de personal, ubicación, barrido, cuadro, imprimación, colocación de mezcla, compactación.

OBSERVACIONES:

ORDEN DE TRABAJO N°: 4130
 ORDEN DE SALIDA N°: GUIA DE REMISION N°: 2429

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS

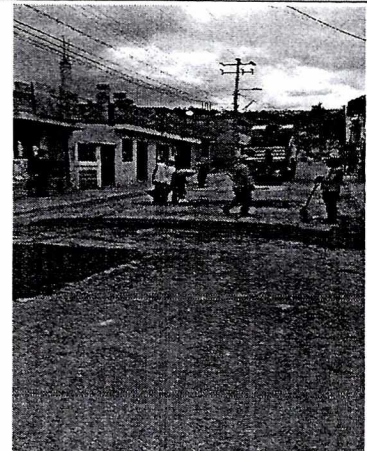

RESPONSABLES

Jorge Russo Martinez
INSPECTOR

Ing. Federico Benavides
SUPERVISOR

Ing. Carlos Calderón
RESPONSABLE DE ZONA NORTE

ACTIVIDAD: BACHEO RUTINARIO Y REPOSICION DE ZANJAS

FECHA: MARTES - 18 - 07 - 2017

SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA, COMITÉ DEL PUEBLO, PINAR BAJO

C I M A	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M	X				
P M	X				

ADMINISTRACIÓN ZONAL:	NOMBRE	PRESENCIA
	EUGENIO ESPEJO	X
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACION DE LA OBRA: 8 HORAS

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:	
TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:	X

Nº	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	ERICK OMAR CUMBAIN PULUPA *	INSPECTOR	7h00-15h30		
2	JESSICA ALEXANDRA TOAQUIZA JUNTA *	PEON	7h00-15h30		
3	JORGE ENRIQUE TROYA ALMEIDA *	PEON	7h00-15h30		
4	EDISON GABRIEL CHUSHKI COLLAGUAZO *	PEON	7h00-15h30		
5	LUIS OSWALDO CHINGO QUIMBITA *	PEON	7h00-15h30		
6	IGNATHAN PATRICIO ALBAN RIOS *	PEON	7h00-15h30		
7	RAUL VILLACIS *	CONDUCTOR	7h00-15h30	CONTRATISTA CAMION	PAA - 1288
8	MANUEL AGAMA *	CONDUCTOR	7h00-15h30	CONTRATISTA VOLQUETA	PBS - 3365
9	JAVIER GUALACATA *	OPERADOR	7h00-15h30	CONTRATISTA RODILLO	R - 2

CALLES INTERVENIDAS

Nº	PLANIFICADO	CALLE	Nº VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF. vs EJEC.	Nº BACHES	Nº ZANJAS	MEZCLA ASFALTICA		VOLUMEN MEZCLA ASFALTICA UTILIZADO (m³)	VOLUMEN EMULSION ASFALTICA UTILIZADO (m³)	SUPERFICIE INTERVENIDA (m²)	
									CALIENTE	FRIO				
1	N	MEXICO	LT 530	INTERSECCION	CALLE AMBATO	100,00		1	X		0,18		2,00	
2	N	GUAYAQUIL	LT 245	INTERSECCION	CALLE ATAHUALPA	100,00		1	X		0,09		1,00	
3	N	CARLOS FORTINES	LT 376	INTERSECCION	CALLE FRANCISCO DE LA TORRE	100,00		1	X		0,13		1,50	
4	N	GASPAR MALDONADO		CALLE CARLOS FORTINES	CALLE JOSE FERNANDEZ	100,00	186		X		5,60		112,00	
									100,00		TOTALES	6,00		116,50


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SE REALIZA EL BACHEO RUTINARIO DE LA CALLE GASPAR MALDONADO Y LA REPOSICION DE TRES ZANJAS EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO

OBSERVACIONES: SE CAMBIA LA PROGRAMACION DEL DIA MIERCOLES 19-07-2017 DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE ADOQUIN EN LA PLANTA DE ASFALTO

ORDEN DE TRABAJO Nº: 7416

GUIA DE REMISION Nº: S001 - 002 - 0004985

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS

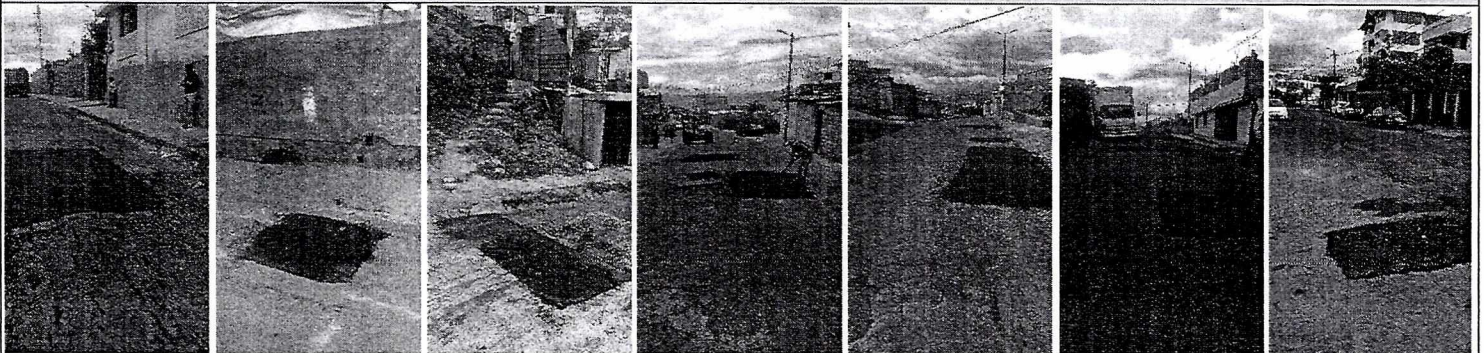

RESPONSABLES

ERICK CUMBAIN P.
INSPECTOR

FERNANDO CARDENAS ORDOÑEZ
ASISTENTE DE PROCESOS 2

ING. CARLOS CALDERON B.
RESPONSABLE ZONA
