

**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO PARROQUIAL
EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
MARTES 6 DE JUNIO DE 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil diecisiete, siendo las 10H30, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones de la Casa Somos de la Administración Zonal Calderón, los miembros de la Comisión de Desarrollo Parroquial: Concejal Eco. Luis Reina y Concejala M. Sc. Susana Castañeda, quien preside la Comisión.

Adicionalmente, se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Abg. Henry Valencia, Administrador Zonal Calderón; Ing. Alfredo de la Cruz e Ing. Gabriel Cueva, funcionarios delegados de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento; Ing. Lorena Izurieta, Gerente de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; Ing. Christian Zaragocín, Gerente de Operaciones y Movilidad de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; Ing. Lorena Beltrán, Gerente de Estudios Técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; Dra. Verónica Cáceres, funcionaria delegada de la Procuraduría Metropolitana; y, Dra. Jenny Romo, Sra. Verónica Rivadeneira y Msc. Julio Valdivieso, funcionarios del despacho de la Concejala Susana Castañeda.

Además, se registra la presencia de los Presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Calderón: Sra. Isabel Bejarano; y, Llano Chico: Sr. Luis Pulupa.

Secretaría constata el quórum reglamentario y da lectura del orden del día, el mismo que se aprueba sin observaciones por lo que se procede con su tratamiento

1.- Aprobación de las actas de las sesiones realizadas el 23 de mayo de 2017 a las 10h00 y 13h30.

Se aprueban las actas de las mencionadas sesiones sin observaciones.

2.- Informe por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas referente a la gestión de proyectos realizados el 2016 y el plan de intervenciones para el año 2017 en las parroquias rurales de la jurisdicción de la Administración Zonal Calderón.

Ing. Lorena Izurieta, Gerente de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas: Realiza la presentación y manifiesta que ésta se dividirá de la siguiente manera:

- Infraestructura Vial:



Estudios de asfaltado de la vía de borde este de la Manzana 19 "Proyecto Ciudad Bicentenario".

Estudios de rehabilitación obra nueva, evaluación y mejoramiento de las obras hidráulicas en las Quebradas Chaquishahuayco y Seca, ubicadas en el Km. 12+100 del Tramo III de la Avenida Simón Bolívar.

Dos reductores de velocidad en la calle John F. Kennedy, sector Carapungo.

Dos reductores de velocidad en la intersección de la calle Francisco Albornoz y Agustín Guerrero, parroquia de Calderón.

Un reductor de velocidad en la calle Pio XII en la parroquia de Calderón, barrio Bellavista.

Un reductor de velocidad en la calle Asturias en el sector de Carapungo, barrio La Morenita.

Un reductor de velocidad en la calle 4 de Octubre, desde la calle Zuleta hasta la calle E 21, barrio San Francisco de Oyacoto.

Un reductor de velocidad en la Avenida Galo Plaza Lazo, desde la calle N16A hasta la calle N16F, sector de Bellavista.

Un reductor de velocidad sobre la calle Ezequiel Landázuri, desde la calle Bonanza hasta la calle Carapungo, sector Carapungo.

Un reductor de velocidad sobre la calle Efrain Armas, desde la calle Saúl Quezada hasta la calle N9.

Mejoramiento vial de la calle OE11J desde Panamericana Norte hasta la calle Geovanni Calles.

Mejoramiento vial de la calle N18 De Los Algarrobos desde el eje longitudinal De Los Eucaliptos hasta la E2F De Las Fresas.

Mejoramiento vial de la calle N18A De Los Tomates, desde el eje longitudinal De Los Eucaliptos hasta la E2F De las Fresas.

Mejoramiento vial de la calle N18B De Las Tunas, desde el eje longitudinal De Los Eucaliptos hasta la E2F De las Fresas.

Mejoramiento vial de la calle N18C De Las Tunas, desde el eje longitudinal De Los Eucaliptos hasta la E2F De las Fresas.

Mejoramiento vial de la calle E2F De Las Fresas desde N18C De Los Eucaliptos hasta N18 De Los Algarrobos.

Mejoramiento vial de la calle eje longitudinal De Los Eucaliptos desde N18A De Los tomates hasta N18B De Las Tunas.

Mejoramiento vial de la calle E8 De Los Narcisos desde inicio del asfalto hasta el final de la calle.

- Mingas:

Minga en el sector Mariana de Jesús (corte de césped 14.826 mts. 2, poda de 20 árboles y limpieza de rebrotes de 60 árboles).

Minga en las calles Francisco Albornoz y Avenida Atahualpa (rasaneo, limpieza de terreno, conformación y compactación vial, desalojo de escombros y control de polvo).

Mingas en la Etapa E y F.

Continúa con la presentación informando sobre más obras de infraestructura vial así como de gestión de tráfico y espacios públicos.

(Esta presentación forma parte del acta como Anexo No. 1).

Concejala Susana Castañeda, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial: Manifiesta que le preocupa que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas se haya dedicado hacer obras que le corresponderían hacer a la Administración Zonal, puesto que se supone que la Empresa se debería encargar de obras de otro tamaño y magnitud. Sin dejar de reconocer la importancia de las intervenciones como señalización, bacheo, semaforización o mantenimiento de parauques estas se consideran obras cotidianas que la empresa no puede dejar de hacer. Manifiesta que en la presentación no se refleja ninguna obra de importancia, que resuelva parte de la problemática de la ruralidad ni en Calderón ni en Llano Chico, más allá de las obras distritales como la ampliación de la Av. Simón Bolívar o el intercambiador de Carapungo que si bien son de beneficio de todos los habitantes de Quito es necesario que se realicen obras para los barrios de estas parroquias.

Ing. Lorena Izurieta, Gerente de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas: Manifiesta que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas es una empresa ejecutora, y que es la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana en forma coordinada con la Administración Zonal correspondiente quien prioriza las obras a realizar y envía a la empresa, la que ejecuta siempre y cuando cumpla con los requisitos de trazado vial, disponibilidad de servicios y consolidación. A la aseveración de que en Calderón no se haya realizado obras de gran magnitud, responde indicando que se acaba de inaugurar la gran obra del intercambiador de Carapungo, con un valor aproximado de \$20'000.000,00.

La Comisión de Desarrollo Parroquial, en sesión ordinaria realizada el martes 6 de junio de 2017 en la Administración Zonal de Calderón, luego de conocer el Informe por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas referente a la gestión de proyectos realizados el 2016 y el plan de intervenciones para el año 2017 en las parroquias rurales de la jurisdicción de la Administración Zonal de Calderón, **resolvió:** solicitar a la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana remita, a la brevedad posible, el registro de requerimientos realizados por las Administraciones Zonales, en coordinación con los 33 GAD parroquiales, para la ejecución de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), de los años 2015, 2016 y 2017.

Concejal Luis Reina: Manifiesta que es conveniente saber el objetivo del apadrinamiento de espacios públicos, puesto que los mismos se encuentran en un estado de deterioro visible. Por otro lado pide explicación de lo sucedido con el puente de la Quebrada Chaquishahuaycu y termina su intervención manifestando que, otra cosa totalmente inexplicable, es la falta de pronunciamiento sobre la construcción del Parque Metropolitano Calderón.

La Comisión de Desarrollo Parroquial, en sesión ordinaria realizada el martes 6 de junio de de 2017 en la Administración Zonal de Calderón, luego de conocer el Informe por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas referente a la gestión de proyectos realizados el 2016 y el plan de intervenciones para el año 2017 en las parroquias rurales de la jurisdicción de la Administración Zonal de Calderón, **resolvió:** solicitar al Administrador Zonal de Calderón, que realice, a la brevedad posible, un informe integral referente al estado del plan especial Parque Metropolitano Calderón.

Sr. Luis Pulupa, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Llano Chico: Manifiesta que el tema de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas es una novela que no acaba jamás, señala que hace un año ya se conversaron estos mismos temas, donde planteó que en las asambleas de presupuestos participativos se encuentren presentes las Empresas Públicas Metropolitanas de Movilidad y Obras Públicas y de Agua Potable y Saneamiento, sin embargo no se ha dado una respuesta efectiva a este planteamiento. Solicita además, al igual que el Concejal Luis Reina se establezca que va a pasar con la calle Carapungo, que es la principal vía de conexión entre la parroquia de Llano Chico y Calderón, además que se constituye en un desfogue de tránsito cuando existen problemas en la Av. Simón Bolívar.

La Comisión de Desarrollo Parroquial, en sesión ordinaria realizada el martes 6 de junio de 2017 en la Administración Zonal de Calderón, luego de conocer el Informe por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas referente a la gestión de proyectos realizados el 2016 y el plan de intervenciones para el año 2017 en las parroquias rurales de la jurisdicción de la Administración Zonal de Calderón, **resolvió:** solicitar a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, remita, a la brevedad posible, un informe detallado referente al proceso de recuperación integral de la vía y el puente de la calle "Carapungo", en el sector de la quebrada Chaquishahuaycu, arteria de interconexión entre la parroquia rural de Llano Chico y el sector de Llano Grande en la parroquia de Calderón.

Sra. Isabel Bejarano, Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Calderón: Manifiesta que quiere dejar constancia que por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas no hay respuesta a la comunidad, señala que esta empresa permanentemente está en etapa de estudios de todo, pero que de ahí pase a concretarse sería un milagro. Señala que una parroquia tan grande como Calderón necesita la intervención de las Empresas Públicas con obras que se vean y no únicamente con estudios y diseños que no concluyen jamás.

Ing. Lorena Izurieta, Gerente de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas: Sobre las diferentes inquietudes presentadas por los presidentes de los GAD parroquiales señala que la calle Atahualpa es una intervención que está ejecutando la EPMOP y que se concluirá acorde a los plazos establecidos en el contrato, referente al bacheo señala que realizarán una coordinación más efectiva con las autoridades parroquiales, sobre la invitación a la parroquia de Llano Chico dice que asistirán el día viernes para explicar la situación de la vía y el puente de la calle Carapungo y finalmente referente al cobro de las obras en la planilla del impuesto predial señala que actúan bajo lo que establece la Ordenanza Metropolitana 092.

3.- Presentación por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento referente a la gestión de proyectos de obra pública realizados el 2016 y el plan de intervenciones para el año 2017 en las parroquias rurales de la jurisdicción de la Administración Zonal Calderón.

Ing. Alfredo De la Cruz, funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento: Manifiesta que realizará su exposición parroquia por parroquia y de manera separada lo que es agua potable y saneamiento de la siguiente manera:

Calderón: Agua Potable.

- Diseño de la línea de conducción Puembo – Calderón y planta de tratamiento.
- Diseño definitivo de la línea de transmisión, tanque de almacenamiento y redes, sector Calderón.
- En construcción redes de agua potable para la Administración Zonal Calderón Etapa 1.
- Proceso de contratación extensión de redes de agua potable para la Administración Zonal Calderón, 2da. Etapa.

Calderón: Saneamiento.

- Concluido el diseño definitivo de la cuenca de la quebrada Carretas.
- Programado el estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo de la ampliación del sistema de alcantarillado para la parroquia Calderón.
- Concluidas redes de alcantarillado para varios sectores de Calderón: barrio El Bosque II – V, pasaje “C” sector La Llanura, calle Buenos Aires, barrio Nueva Vida2, Los Geranios II y descarga de tanque San Juan barrio Colinas del Norte.
- Alcantarillado combinado para el sector de la calle Pucará, parroquia Calderón.
- En construcción alcantarillado para el barrio San Francisco de Oyacoto, 4ta etapa, Calderón.
- Proceso de contratación de la prolongación de la descarga de alcantarillado del barrio San Juan Loma Calderón.
- Alcantarillado para el barrio Colinas del Valle y otros en la parroquia.
- Programadas redes de alcantarillado para la Administración Zonal Calderón, 2da. Etapa.
- Alcantarillado combinado para el barrio La Capilla y calle Coya, Calderón.

Llano Chico: Saneamiento.

- Proceso de contratación de factibilidad y diseño definitivo de las obras de saneamiento de las quebradas San Antonio, Horinaza y Chaquishahuaycu.
- Alcantarillado para varios sectores de la parroquia de Llano Chico.

(Esta presentación forma parte del acta como Anexo No. 2).

Sra. Isabel Bejarano, Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Calderón: Señala que en están teniendo graves problemas con cortes de agua potable sobre todo en los sectores altos de la parroquia.

Sr. Luis Pulupa, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Llano Chico: Señala su preocupación por las descargas de aguas servidas que se realizan los

colindantes a la quebrada de Chaquishahuaycu lo que ha contribuido a la erosión y deterioro del talud.

Concejala Susana Castañeda, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial: Manifiesta que es necesario estrechar la relación entre la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y los GADs Parroquiales, toda vez que las autoridades parroquiales conocen de cerca las demandas de la comunidad.

Ing. Alfredo De la Cruz, funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento: En relación a las dudas planteadas manifiesta que van a realizar una coordinación más cercana con los GADs parroquiales, señala además que actualmente no se puede solucionar el problema de los cortes de agua mientras no se establezca el proyecto definitivo para la zona y puntualiza que este año se realizarán los estudios definitivos para la construcción de canales marginaels de recolección de aguas servidas en la quebrada de Chaquishahuaycu.


4.- Puntos varios.

Sra. Isabel Bejarano, Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Calderón: Solicita se escuche a la comunidad de la parroquia de Calderón y del sector de Marianas quienes están preocupados por la presencia de bares y karaokes en lo que se conoce como zona rosa, lo que está afectando a la convivencia de la vecindad, señala que estos establecimientos están generando inseguridad, en una zona eminentemente residencial, afectando además a los establecimientos educativos cercanos.


Ab. Henry Valencia, Administrador Zonal Calderón: Señala que en los días previos a esta comisión se han reunido en una mesa de trabajo con los representantes de las distintas instancias que tienen que ver con este tema como la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y técnicos de la Administración Zonal para tratar una posible reforma al Plan de Uso y Ocupación de Suelo que estaría facultando estas actividades económicas en la zona. Puntualiza además que estos establecimientos que han estado funcionando allí durante varios años tendrían derechos adquiridos ya que en algún momento se les concedió las respectivas licencias de funcionamiento. Señala que se tiene planificado realizar un operativo para verificar los permisos de funcionamiento de estos locales.

Concejala Susana Castañeda, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial: Señala que este es un tema que se ha tratado previamente en la Comisión y que después de los informes remitidos por la Administración Zonal Calderón en la que se puntualiza que existen varios locales que no tienen cuentan con los permisos o que no los han actualizado es evidente la falta de seguimiento a este tema por lo que considera necesario se realice una convocatoria a una comisión extraordinaria en la que se ponga este como punto del orden del día.

Siendo las 14h45 y habiéndose conocido todos los puntos del orden del día, se clausura la sesión. Firman para constancia de lo actuado, la señora Presidenta de la Comisión y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.



M. Sc. Susana Castañeda Vera
Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Parroquial



Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo
Metropolitano de Quito

Ximena A.
08/06/2017

**A
N
E
X
O**

No.

1

f

ACTIVIDADES

2016 Y 2017

ADMINISTRACIÓN

ZONAL

CALDERÓN

*06 junio 2017
Jen Calderón*

EPMMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRA PÚBLICA

QUITO
ALCALDÍA

REDES SOCIALES: @OBRASQUITO



1800 456 789 opción 3

Dus Reina Ch

X

QUITO

AL

RECUPERACION
QUEBRADA CHAQUISHAHUYCU

Intervenciones ejecutadas 2016-2017

EPMMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



1. Parroquia Calderón: Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
ESTUDIOS ASFALTADO	CONSTRUCCIÓN " VÍA DE BORDE ESTE, MANZANA 19", PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO".	5.000,00	2016 ✓
ESTUDIOS REHABILITACION (OBRA NUEVA)	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN LAS .QUEBRADAS CHAQUISHAHUAYCO Y QUEBRADA SECA, UBICADAS EN EL KM 12+100 DEL TRAMO III DE LA <u>AV. SIMÓN BOLÍVAR</u>	33.625,55	2016 ✓
TOTAL		38.625,55	

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
	DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE JOHN F. KENNEDY SECTOR CARAPUNGO	2.520,00	2016
	DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE DERBY, ENTRADA HOSPITAL DOCENTE, PARROQUIA CALDERÓN	1.880,00	2016
	DOS REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO ALBORNÓZ Y AGUSTÍN GUERRERO, PARROQUIA DE CALDERÓN	1.800,00	2016
	UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE PIO XII EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN, BARRIO BELLAVISTA	772,21	2016
REDUCTORES DE VELOCIDAD	UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE ASTURIAS EN EL SECTOR CARAPUNGO, BARRIO LA MORENITA	772,21	2016
	UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE, DESDE LA CALLE ZULETA HASTA LA CALLE E21, BARRIO SAM FRANCISCO DE OYACOTO	1.500,00	2016
	UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA GALO PLAZA LASSO, DESDE LA CALLE N16A HASTA LA CALLE N16F, SECTOR DE BELLAVISTA	1.800,00	2016
	UN REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE EZEQUIEL LANDÁZURI, DESDE LA CALLE BONANZA HASTA LA CALLE CARAPUNGO, SECTOR CARAPUNGO	1.200,00	2016
	UN REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE EFRAIN ARMAS, DESDE LA CALLE SAÚL QUEZADA HASTA LA CALLE N9	772,21	2016
TOTAL		13.016,63	



**CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE EFRAÍN
ARMAS, DESDE LA CALLE SAÚL QUEZADA HASTA LA CALLE N9**

Handwritten signature or mark.

Calderón: Infraestructura Vial

BACHEO 2016 - 2017					
MES	COSTO	m3	# CALLES	# BACHES	
ENERO	\$223,55	15,5	5	330	
FEBRERO	\$229,14	26	15	368	
MARZO	\$46.848,39	246,48	42	2107	
ABRIL	\$41.927,10	215	32	4729	
MAYO	\$30.694,36	152	43	1576	
JUNIO	\$38.422,11	177	63	2339	
JULIO	\$37.506,08	160	56	1269	
AGOSTO	\$33.348,33	168	45	1163	
SEPTIEMBRE	\$12.383,98	68	31	1269	
OCTUBRE	\$27.428,37	141	35	2061	
NOVIEMBRE	\$51.914,75	259	49	2646	
DICIEMBRE	\$28.036,36	130	53	2186	
ENERO	\$17.367,74	47	58	1883	
FEBRERO	\$21.458,34	73	56	1562	
MARZO	\$29.078,00	105	71	2962	
ABRIL	\$23.113,15	94	53	1555	
TOTAL	\$439.979,75	2077	707	30005	

Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN	ÁREA INTERVENCIÓN (m2)
MEJORAMIENTOS VIALES (LONG. DE INTEVENCIÓN 1.760,00 m)	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE11J DESDE PANAMERICANA NORTE HASTA GIOVANNI CALLES	62.930,00	2016	4340
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18 DE LOS ALGARROBOS DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS	6.090,00	2016	420
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18A DE LOS TOMATES DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS	8.120,00	2016	560
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18B DE LAS TUNAS DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS	10.150,00	2016	700
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18C DE LOS EUCALIPTOS DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS	12.180,00	2016	840
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE E2F DE LAS FRESAS DESDE N18C DE LOS EUCALIPTOS HASTA N18 DE LOS ALGARROBOS	18.270,00	2016	1260
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS DESDE N18A DE LOS TOMATES HASTA N18B DE LAS TUNAS	5.075,00	2016	350
	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE E8 DE LOS NARCISOS DESDE INICIO DEL ASFALTADO HASTA FIN DE LA CALLE	111.650,00	2016	7700
TOTAL		234.465,00		16.170

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MINGA	MINGA EN EL SECTOR MARIANA DE JESÚS (corte de césped 14.826 m2., poda de 20 árboles y limpieza de rebrotes de 60 árboles)	8.352,35	2016
	MINGA EN LAS CALLES FCO ALBORNOZ Y AV. ATAHUALPA (rasaneo, limpieza de terreno, conformación y compactación vial, desalojo de escombros y control de polvo)	9.945,66	2016
	MINGA ETAPA E Y F	7.394,09	2016
TOTAL		25.692,10	

[Handwritten mark]



MINGA CALLES FRANCISCO ALBORNOZ, RASANTEO DE LA AV. ATAHUALPA

Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
LIMPIEZA DE VÍAS	Limpieza de quebrada - Calderón, ETAPA E	230,59	2017
	Limpieza de material en la vía , Calles Eloy Alfaro y Fernando Ayarza	57,42	2017
	Limpieza de material en la vía (piedras y lodo), Calles Geovanny Calles y Padre Luis Vaccari	45,72	2017
TOTAL		333,73	

Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA	Limpieza cuneta vial - Sector Carapungo, AV. SIMÓN BOLÍVAR	49,44	2016
TOTAL		USD 49,44	

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
DERROCAMIENTO	DERROCAMIENTO MURO CALLE JUAN CRUZ	520,78	2016
TOTAL		USD 520,78	

Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
EMERGENCIAS DE INTERVENCIÓN VIAL	Atención emergencia - Limpieza de material en la vía, CALLES AMALIA URIGUEN Y PEDRO CABEZAS	126,93	2017
	Atención emergencia - Limpieza de material en la vía, CALLE DE LOS FUNDADORES Y VICENTE ROCAFUERTE	107,65	2017
	Atención emergencia - Limpieza de material , CALLE ALVAREZ TENORIO Y BRISAS DEL NORTE	43,42	2017
	Atención emergencia - Limpieza de material petreo en la vía, PANAMERICANA NORTE KM 15 1/2	97,11	2017
	Atención emergencia - deslizamiento en la vía, AV. CARAPUNGO	816,97	2016
	Atención emergencia - limpieza de material en la vía, CALLE CARAPUNGO	2630,09	2016
	Atención emergencia - limpieza de escombros en la vía - Sector San Juan de Calderón, CALLE PIO XII	1537,99	2016
	Atención emergencia - Limpieza y señalización de bordillo y vereda, PANAMERICANA NORTE	1149,06	2016
	Atención emergencia - limpieza material sobre la vía producto de deslave - Sector Oyacoto	1149,06	2016
	Atención emergencia - limpieza de deslizamiento de material sobre la vía - Sector Calderón , PANAMERICA NORTE	41,2	2016
	Atención emergencia - limpieza material pétreo sobre la vía - Sector Calderón, CALLE DUCHICELA Y GIOVANNY CALLES	49,44	2016
	Atención emergencia - limpieza de escombros en la vía , CALLE CARLOS MANTILLA Y DE LOS CIPRESES	24,72	2016
	Atención emergencia - limpieza deslizamiento de tierra sobre la vía, CALLE CARAPUNGO	65,92	2016
TOTAL		7.839,56	

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
SEÑALIZACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	FRANCISCO ALBORNOZ Y AGUSTÍN GUERRERO SECTOR MARIANITAS	352,50	2017
	AV. GALO PLAZA LASSO, RÍO ZAMORA Y CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA	150,00	2017
	CALLE CARLOS FORTINES DESDE EL PASAJE A HASTA EL PASAJE C	235,00	2017
	CALLE A, B, C, D, E, J, H, I, J, URB URABA SECTOR CARRETAS	474,23	2017
	CALLE IBERIA	248,54	2017
	N-76 Y PANAMERICANA NORTE	141,00	2017
	CALLE CALISTO MUZO, DESDE LA PANAMERICANA NORTE Y BOLIVAR	248,54	2017
	CALLE CALIXTO MUZO DESDE LA CALLE BOLIVAR HASTA LA CALLE LUISA GOMEZ	587,80	2017
	CALLE EFRAÍN ALVAREZ Y SAUL QUEZADA	243,43	2016
	CALLES JORGE PIEDRA, PIO XII Y EFRAIN ARMAS	243,43	2016
	CALLES FRANCISCO LA TORRE, LANDÁZURI, BONANZA Y 4 DE OCTUBRE	610,00	2016
	FRANCISCO ALBORNOS Y GEOVANNY CALLES	2.030,40	2016
	FRANCISCO ALBORNOS Y GEOVANNY CALLES A LA HEMANO MIGUEL	799,00	2016
	TOTAL		6363,87

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	AV GALO PLAZA LASSO, CALLE CACHANA Y CALLE RÍO BERMEJO	175,74	2017
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PASO CEBRAS, CEDA EL PASO, PARE EN AV GALO PLAZA LASSO CALLE QUIJOS HASTA LA CALLE TULABUG	360,96	2017
	CALLE SAN CAMILO Y CALLE SAN ALFONSO	199,8	2017
	CALLE LOS QUINDES Y CALLE FLOR DE ZABALA	235	2017
	CALLE GALO PLAZA DESDE LA CALLE RÍO MACARÁ HASTA LA CALLE CUMBRO	141	2017
	PROLONGACION AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL REDONDE DE CARCELEN HASTA CIUDAD BICENTENARIO	273,31	2017
	DESDE LA CALLE LIZARDO GARCÍA HASTA EL BARRIO MONSERATH	215,25	2017
	CALLE PIRCABAMBA	141	2017
	CALLE N76, PANAMERICANA NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA AVSIMÓN BOLIVAR	983,62	2017
	CALLE PRINCESA PACHA Y GARCÍA MORENO, SECTOR CARAPUNGO	464,32	2017
	INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO	1281	2016
	CALLE GALO PLAZA, SECTOR CALDERÓN	470	2016
	AVENIDA GEOVANNI CALLES Y LUIS VACARI	325,00	2016
INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO	200,00	2016	



Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
	PARROQUIA CALDERÓN	2.050,00	2016
	AV. GIOVANNI CALLES DESDE LA CALLE LUIS VACARI HASTA PAI MARIANITAS	2.500.00	2016
	PARROQUIA CALDERON GIOVANNI CALLES (LAS PALMERAS)	740.00	2016
	AV GIOVANNI CALLES SECTOR CARAPUNGO	243,43	2016
	CALLE E11 DESDE LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER N69,OE11J HASTA LA CALLE A	610	2016
	CALLE FIDEL MARTINEZ,HERMAMIGUEL HASTA CALLE PIO XII	185,3	2016
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	AV. GARCÍA MORENO	286,43	2016
	CALLE FRANCISCO ALBORNOZ	243,43	2016
	CALLE PIOXI SECTOR BELLAVISTA	243,43	2016
	CALLE EFRAÍN ALVAREZ Y SAUL QUEZADA	185,3	2016
	CALLES JORGE PIEDRA,PIO XII Y EFRAIN ARMAS	243,43	2016
	EN LA CALLE CARLOS MANTILLA, SECTOR DE CARAPUNGO	185,3	2016
	CALLE EFRAÍN ALVAREZ Y SAUL QUEZADA	243,43	2016
	CALLES FRANCISCO LA TORRE, LANDÁZURI, BONANZA Y 4 DE OCTUBRE	610	2016

(Handwritten signature)

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	CALLE CARLOS MANTILLA, SECTOR DE CARAPUNGO	94,02	2016
	FRANCISCO ALBORNOS Y GEOVANNY CALLES	2077,4	2016
	FIDEL MARTINES BARRIO ZABALA	188	2016
	FRANCISCO ALBORNOS Y GEOVANNY CALLES	1269	2016
	FRANCISCO ALBORNOS Y GEOVANNY CALLES A LA HERMANO MIGUEL	799	2016
	FIDEL MARTINES BARRIO ZABALA	169,2	2016
	ESCUELA NICOLAS JIMENEZ MARIANITAS DE CALDERÓN	282	2016
	LEONARDO MURIALDO Y GUACAMOS	752	2016
	CALLE PÍO XII Y CARLOS MANTILLA CALDERON	376	2016
	VITERI SAN CAMILO Y SAN JORGE CALDERÓN	517	2016
TOTAL		16794,10	





Señalización calle Leónidas Puebla

FB

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN VERTICAL CANALIZADORES, FLECHAS, PARES, CEBRAS, CEDAS, LETRAS, DESPACIO. PARROQUIA CALDERÓN	1.200,00	2016
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PARE, VELOCIDAD MÁXIMA. SECTOR CALLE CARLOS TOLEDO Y CALLE CARLOS MANTILLA	292,00	2016
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PARES, VELOCIDAD MÁXIMA . SECTOR EN LA CALLE CARLOS MANTILLA, CARAPUNGO	292,00	2016
	SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL INFORMATIVA SOBRE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR	31.600,00	2016
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PARE, NO ESTACIONAR, ZONA ESCOLAR, REDUCTOR DE VELOCIDAD, VELOCIDAD ZONA ESCOLAR EN CALLE SAN ALFONSO Y SAN CAMILO	1277,72	2017
TOTAL		34.661.72	



Señalización vertical

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
DERRIBOS	REPARACIÓN DERRIBO SEMAFÓRICO EN PANAMERICANA NORTE-ENTRADA A LLANO GRANDE-SECTOR COCA COLA	2345,36	2016
	REPARACIÓN DERRIBO SEMAFÓRICO EN GIOVANNY CALLES-DUCHICELA	635,22	2016
	REPARACIÓN DERRIBO SEMAFÓRICO EN AV. PADRE LUIS VACCARI Y RIO CAYAMBE	641,84	2016
	REPARACIÓN DERRIBO SEMAFÓRICO EN GEOVANNY CALLES Y ARENAL	3130,46	2016
	REPARACIÓN DE REGULADOR, INSTALACIÓN BREAKER, REVISIÓN CABLEADO Y CONEXIONES, DIRECCIONAMIENTO DE SEMÁFOROS EN FRANCISCO ALBORNOZ Y URIGEN , MARIANITAS	286,05	2016
	LEVANTAMIENTO DERRIBO SEMAFÓRICO EN PANAMERICANA NORTE Y JARDINES DE CARCELÉN	1760,07	2017
	RETIRO DERRIBO ELEMENTOS DESTRUÍDO POR DERRUMBE EN PANA NORTE – COL. JAVERIANO	1077,87	2017
TOTAL		9.876,87	

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	MANTENIMIENTO DE BÁCULOS EN PANAMERICANA NORTE Y SIMÓN BOLÍVAR	1377,34	2016
	MANTENIMIENTO DE CABLEADO AÉREO EN PANAMERICANA NORTE Y SIMÓN BOLÍVAR	285,6	2016
	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS EN PANAMERICANA NORTE Y SIMÓN BOLÍVAR	1066,38	2016
	MANTENIMIENTO DE CONTROLADOR DE TRÁFICO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EN PANAMERICANA NORTE Y SIMÓN BOLÍVAR	286,05	2016
	MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE COLORES SEMÁFOROS EN GEOVANNY CALLES Y ARENAL	81,13	2016
	CABLEADO RESPECTIVO DE SEMÁFOROS RESTRUCTURADOS EN LEONIDAS PUEBLA Y FRANCISCO ALBORNOZ (ESCUELA NICOLAS JIMENEZ)	286,05	2016
	DIRECCIONAMIENTO DE SEMÁFORO 3/200 SENTIDO SUR-NORTE EN GEOVANNY CALLES Y ARENAL	530,6	2016
	SUSTITUCIÓN DE FOCOS FLUORESCENTES A LED, TOTAL 8 MÓDULOS EN LIZARDO BECERRA Y CARAPUNGO	530,6	2016
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BÁCULO, EXTENSIÓN Y SEMÁFORO 1/300+2/200 EN PANAMERICANA NORTE Y ENTRADA A COCA COLA	2061,35	2016
	MANTENIMIENTO DE CRUCE SEMAFÓRICO EN LIZARDO BECERRA Y CARAPUNGO	81,13	2016

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 SEMÁFOROS 3/200 SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE Y ORIENTE-OCCIDENTE EN LUIS VACARI Y CAYAMBE	1774,5	2016
	MANTENIMIENTO, EN COLORES DE SEMÁFORO EN LIZARDO BECERRA Y CARAPUNGO	530,6	2016
	RETIRO DE SEMAFORO 3/200 INCANDESCENTE EN 9 DE AGOSTO Y DUCHICELA	530,6	2016
	SUSTITUCIÓN DE LOGO CON RELES DE ESTADO SÓLIDO Y REPOTENCIA DE SEMÁFOROS INCANDESCENTES A LED EN LIZARDO BECERRA Y CARAPUNGO	530,6	2016
	MANTENIMIENTO DE CRUCE SEMAFÓRICO EN GEOVANNY CALLES Y LUIS VACARI	81,13	2016
	MANTENIMIENTO DE CANASTILLA PARA BÁCULO EN PANAMERICANA NORTE-SECTOR COCA COLA	81,13	2016
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DERRIBO, LIMPIEZA DE CANASTILLA DE BÁCULO, EXTENSIÓN Y UN SEMÁFORO EN PANAMERICANA NORTE- SECTOR COCA COLA	286,05	2016
	MANTENIMIENTO DE INTERSECCIÓN EN LUIS VACARRI Y GEOVANNI CALLES	530,6	2016
	MANTENIMIENTO DE FALLA EN TARJETA DE VOLTAJE EN ESCUELA NICOLAS JIMENEZ (MARIANITAS)	81,13	2016
	MANTENIMIENTO DE ARMARIO Y CABLEADO DE CAMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA A CARAPUNGO	286,05	2016

[Handwritten signature]

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	MANTENIMIENTO DE POSTE Y CÁMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA A CARAPUNGO	286,05	2016
	PROGRAMACIÓN DE EQUIPO LOGO EN ENTRADA A LA COCA COLA (SECTOR LLANO GRANDE)	530,6	2016
	CAMBIO DE PROGRAMACIÓN EN TIEMPOS EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA A LA COCA COLA	530,6	2016
	MANTENIMIENTO DE DUCTERIA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA A CARAPUNGO	81,13	2016
	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS EN FRANCISCO DE ALBORNOZ Y AMALIA URIGUEN (CALDERÓN)	81,13	2016
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA EN ENTRADA A CARAPUNGO	81,13	2016
	MANTENIMIENTO DE CRUCES EN PANAMERICA NORTE	81,13	2016
	CAMBIO DE LAMPARA QUEMADA SENTIDO SUR NORTE EN 9 DE AGOSTO Y DUCHICELA	530,6	2016
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA PARA CÁMARA CCTV EN PANAMERICA NORTE-INGRESO A CARAPUNGO	81,13	2016
	CABLEADO DE ARQUETA HASTA POSTE EN PANAMERICANA NORTE INGRESO A CARAPUNGO	286,05	2016
	MANTENIMIENTO DE CRUCE EN PANAMERICA NORTE	81,13	2016
	MANTENIMIENTO PARA HABILITAR CÁMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE INGRESO A CARAPUNGO	81,13	2016
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GIOVANNI CALLES – VACARI	530,6	2016

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAD EN CARLOS MANTILLA Y JOSE ANDRADE CALDERÓN	530,6	2016
	DIRECCIONAMIENTO DE UN SEMÁFORO EN GIOVANNI CALLES Y CACHA	530,6	2016
	REPLANTEO E INICIO DE CRUCE PELIKAN EN PANAMERICANA NORTE SECTOR YAMBAL	286,05	2016
	CHEQUEO DE CABLEADO DE SEMÁFORO EN GEOVANNY CALLES Y LUIS VACCARI	81,13	2017
	REVISIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS EN GEOVANNY CALLES Y LUIS VACCARI	81,13	2017
	CHEQUEO DE CRUCES SEMAFÓRICOS EN MARIANITAS	81,13	2017
	CHEQUEO DE CRUCE EN GARCÍA MORENO Y 28 DE JUNIO	81,13	2017
	EMBANDERADO SE REPARA CORTOCIRCUITO EN LUIS VACCARI Y RIO CAYAMBE	81,13	2017
	MANTENIMIENTO EL CRUCE EN AV. LUIS VACCARI Y RIO CAYAMBE	81,13	2017
	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CON CNT EN PANA NORTE – INGRESO COL.JAVERIANO	81,13	2017
	COORDINACIÓN POR TRABAJOS DE LA EMPRESA ELECTRICA EN GEOVANY CALLES Y DUCHICELA	81,13	2017
	INSPECCIÓN DE INTERSECCIÓN PARA REUBICACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS EN PANAMERICANA NORTE YAMBAL	81,13	2017

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	INSPECCIÓN DE INTERSECCIÓN PARA REUBICACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS EN 9 DE AGOSTO Y CACHA	81,13	2017
	LEVANTAMIENTO DE DERRIBO EN PANAMERICANA NORTE-ENTRADA A YAMBAL	286,05	2017
	RETIRO DE BÁCULO EN PANAMERICANA NORTE-ENTRADA A YAMBAL	286,05	2017
	INSTALACIÓN DE SEMAFORO PEATONALES EN YAMBAL CARAPUNGO	286,05	2017
	INSPECCIÓN DE CRUCES SEMAFÓRICOS EN PANAMERICANA NORTE Y GARCÍA MORENO	81,13	2017
	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CON CNT EN CORREDOR PANAMERICANA	81,13	2017
	CONEXIÓN CORRESPONDIENTES A LA CAMARA CCTV EN AV. PANAMERICANA Y ENTRADA A CARAPUNGO	286,05	2017
	COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE REPUESTOS EN PANA NORTE-JARDINES DE CARCELEN	530,6	2017
	RETIRO DE REGULADOR EN CACHA-9 DE AGOSTO	286,05	2017
	HABILITACIÓN DEL SERVICIO EN CACHA – 9 DE AGOSTO	286,05	2017
REPOSICIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL EN PANAMERICANA NORTE YAMBAL	286,05	2017	
REPARACIÓN DE CABLE UTP DE CAMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE-INTERCAMBIADOR CARAPUNGO	286,05	2017	
CAMBIO DE TABLERO G.O.I.A. POR UN TABLERO DE LOGO EN 9 DE AGOSTO - CACHA	286,05	2017	
INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ACOMETIDA EN GEOVANNY CALLES - ARENAL	286,05	2017	
COLOCAR E INSTALAR TABLERO G.O.I.A. EN 9 DE AGOSTO - CACHA	286,05	2017	

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	MANTENIMIENTO EN CABLE DE ACOMETIDA EN GEOVANNI CALLES - ARENAL	286,05	2017
	RETIRO DE REGULADOR G.O.I.A. EN 9 DE AGOSTO - CACHA	286,05	2017
	COLOCACION E INSTALACION DE COLUMNA VEHICULAR, SOPORTE DOBLE Y 2 SEMAFORO 3/200 EN PANAMERICANA NORTE (JARDINES DE CARCELEN)	530,6	2017
	INSTALACIÓN BÁCULO TRONCOCÓNICO EN PANA NORTE ENTRADA A YAMBAL	286,05	2017
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS SEMAFÓRICOS EN GEOVANNY CALLES – EL ARENAL	286,05	2017
	REVISION DE COMUNICACIÓN EN CAMARA CCTV RECONEXION DE COMUNICACIÓN EN ENTRADA CARAPUNGO PANAMERICANA NORTE	286,05	2017
	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE CAMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE – ENTRADA A CARAPUNGO	286,05	2017
	RESET DE LA INTERSECCIÓN EN PAMERICANA NORTE – JARDINES DE CARCELEN	81,13	2017
	INSTALACION DE 1 SOPORTE SENCILLO, 2 SEMAFOROS PEATONALES EN PANAMERICANA NORTE – JARDINES DE CARCELEN	286,05	2017
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INTERSECCIÓN EN GIOVANNI CALLES – ARENAL	286,05	2017
	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN SEMÁFOROS PEATONALES. EN PANAMERICANA NORTE JARDINES CARCELÉN	286,05	2017
	INSPECCIÓN DE INTERSECCIÓN Y CAMBIO DE HOJA DE DIAGRAMA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS PENDIENTE REPARACIÓN DE CANASTILLA SEMÁFORO VEHICULAR GRUPO 4 GIRO EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA LLANO GRANDE	81,13	2017
	SUPERVISIÓN CON GRUPO 5 REVISIÓN DE CÁMARA CCTV EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA A CARAPUNGO	286,05	2017
CONFIGURACIÓN DE CÁMARA CCTV QUEDA FUNCIONANDO EN PANA NORTE ENTRADA A CARAPUNGO	81,13	2017	



Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	REPARACIÓN DE MODULO ABIERTO COLOR VERDE EN AV PANAMERICANA NORTE ENTRADA A COCA COLA	81,13	2017
	COORDINACIÓN CON EEQ EN GEOVANNY CALLES-ARENAL	81,13	2017
	COORDINACIÓN CON EEQ EN PANAMERICANA NORTE-ENTRADA ALA COCA COLA	81,13	2017
	COORDINACIÓN CON EEQ EN PANAMERICA NORTE-ENTRADA A LLANO GRANDE	81,13	2017
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GIOVANNI CALLES – ARENAL	286,05	2017
	CHEQUEO DE ENERGIA ELECTRICA EEQTRABAJANDO EN EL PUNTO EN RACINES Y GARCIA MORENO (CARAPUNGO)	81,13	2017
	DIRECCIONAMIENTO GARCIA MORENO (CARAPUNGO)	81,13	2017
	INSTALACION DE CAMARAS DE FOTO MULTAS PRUEBAS Y CHEQUEO EN PANAMERICANA NORTE Y JAVERIANO	81,13	2017
	INSTALACION DE CAMARAS DE FOTO MULTAS PRUEBAS Y CHEQUEO EN PANAMERICANA NORTE Y GARCIA MORENO	81,13	2017
	REPARACION COMPLETADA DEL CABLE DE CONEXIÓN EN GEOVANNY CALLE Y LUIS VACCARI	286,05	2017
	RESET REGULADOR MF2 EN GEOVANNY CALLES Y CACHA	81,13	2017
	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CON CNT EN GARCIA MORENO Y PANAMERICANA NORTE	81,13	2017
	INSPECCIÓN DEL REGULADOR EN PANAMERICANA NORTE – ENTRADA A YAMBAL	81,13	2017
	INSPECCIÓN DEL REGULADOR EN PANAMERICANA NORTE – INTERCAMBIADOR DE CARCELEN	81,13	2017
REVISIÓN GRUPO 1,2 EN GARCIA MORENO-CARAPUNGO	81,13	2017	



Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SEMAFÓRICOS	RESET A LA TARJETA 4TI EN PANA NORTE Y ENTRADA LLANO GRANDE	81,13	2017
	CABLEADO DE GRUPOS SEMAFÓRICOS EN ILALO CACHA SECTOR CALDERÓN	286,05	2017
	CONEXIÓN DE SEÑAL DE ÁMBAR Y ROJO DEL REGULADOR DE TRÁFICO PARA EL EQUIPO DE FOTO MULTAS. EN PANA NORTE GARCÍA MORENO	81,13	2017
	SUPERVISIÓN CON PERSONAL DE EMPRESA DE FOTO MULTAS. EN AV. PANAMERICANA NORTE Y GARCÍA MORENO	81,13	2017
	SUPERVISIÓN CON PERSONAL DE EMPRESA DE FOTO MULTAS. EN AV. PANAMERICANA NORTE – JAVERIANO	81,13	2017
	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CRUCE EN GEOVANNY CALLES –ARENAL	81,13	2017
	INSPECCIÓN DE SEMÁFORO QUEMADO EN GEOVANNY CALLES –ARENAL	81,13	2017
	INSPECCIÓN DE SEMÁFORO SIN ENERGÍA EN FRANCISCO ALBORNOZ-LEONIDAS PUEBLA	81,13	2017
	INSPECCIÓN DE SEMÁFORO SIN ENERGÍA EN GEOVANNY CALLES – ARENAL	81,13	2017
	RESET Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN GEOVANNY CALLE Y ARENAL	81,13	2017
	CHEQUEO DE TIEMPOS PARA CAMBIO DE PROGRAMACION EN GEOVANNY CALLE Y LUIS VACCARI	286,05	2017
	CHEQUEO DE TIEMPOS PARA CAMBIO DE PROGRAMACION EN PANA NORTE Y COCA COLA	286,05	2017
	PROGRAMACION DE LOGO PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA Y MEJORA DE TIEMPOS EN PANAMERICANA NORTE ENTRADA DE LA COCA COLA LLANO GRANDE	286,05	2017
	INSTALACION DE SEMAFORO DE BACULO DAÑADO POR GOLPE EN GEOVANNY CALLES Y CACHA	286,05	2017
	SUPERVISIÓN CAMBIO SEMÁFOROS POR BACULO IMPACTADO EN GEOVANNY CALLES CACHA	286,05	2017
SUPERVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE NUEVOS TIEMPOS EN PANA NORTE ENTRADA A COCA COLA	286,05	2017	
TOTAL		16.274,46	

Calderón: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	IMPLEMENTACIÓN DE INTERSECCIÓN 9 DE AGOSTO Y CACHA	8.902,19	2017
	IMPLEMENTACIÓN DE INTERSECCIÓN EN PANAMERICANA NORTE-ENTRADA YAMBAL	6.649,25	2017
	IMPLEMENTACIÓN DE INTERSECCIÓN EN LA GIOVANNY CALLES Y LUIS VACCARI	101.480,26	2017
TOTAL		117.031,70	

A



CRUCE SEMAFÓRICO CALLES 9 DE AGOSTO Y CACHA

Handwritten signature or mark.

Espacios Públicos

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
TRANSFORMACIÓN ESPACIO URBANO	PUENTES PEATONALES (MANTENIMIENTO), CALDERÓN, PANAMERICANA NORTE	2.281,00	2016
	MOBILIARIO URBANO, INTERCAMBIADOR CARAPUNGO, BASES PARA ESCULTURAS	138,00	2016
TOTAL		2.419,00	

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
JUEGOS INFANTILES	LA PAMPA - Juegos Infantiles (Parq. con Sello Propio)	12.065,63	2016
	CARAPUNGO (PARQUE DE LA E) Juegos Infantiles (Columpios)	3.256,89	2016
	LINEAL CARAPUNGO Juegos Infantiles (Columpios)	2.171,26	2016
	LA BATEA B Juegos Infantiles (Columpios)	2.171,26	2016
	LA PAMPA Juegos Infantiles (Columpios)	1.085,63	2016
	SAN JOSÉ CALDERON Juegos Infantiles (Columpios)	2.171,26	2016
	CENTRAL DE OYACOTO Juegos Infantiles (Columpios)	1.085,63	2016
TOTAL		24.007,56	

AS

Espacios Públicos

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
APADRINAMIENTOS	PARQUE DEL SECTOR MANZ A3 (CONVENIO CON DIRECTIVA MANZANA A3)	27.366,00	2017
	PARQUE DEL SECTOR MANZ A5 (CONVENIO CON DIRECTIVA MANZANA A5)	23.673,00	2017
	PARQUE DEL SECTOR MANZ B10 (CONVENIO CON DIRECTIVA MANZANA B10)	22.056,00	2017
	PARQUE DEL SECTOR MANZ C6 (CONVENIO CON DIRECTIVA MANZANA C6)	10.721,00	2017
TOTAL		83.816,00	

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
PILETAS	CARAPUNGO ETAPA E (24 INTEVENCIONES)	4480,00	2016 - 2017
	LA BATEA (4 INTERVENCIONES)	930,00	2016
TOTAL		5.410,00	

Espacios Públicos

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
ARBORIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO (VIVEROS)	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN- Arborización	40.784,94	2017
	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-Jardinería	48.514,96	2017
PODA, CORTE DE CÉSPED (SANEAMIENTO - CORRECCIÓN)	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-Poda técnica	6.282,20	2017
	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-Corte de césped	20.908,80	2017
	SAN JUAN DE CALDERÓN	2.032,50	2016
REHABILITACIÓN DE PARQUES ZONALES, SECTORIALES Y PARROQUIALES	CARAPUNGO MANZANA A9 (Construcción de aceras internas y adoquinado de aceras externas)	2.000,00	2017
	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE LA E (CARAPUNGO)	20.330,00	2016
	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE LA JUVENTUD	3.200,00	2016
EMERGENCIAS DE ESP. PÚBLICOS	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	1.950,00	2017
TOTAL		146.003,40	

X



INTERVENCIONES EJECUTADAS EPMMOP 2016 - 2017



**EQUINOCCIAL
LA
DELICIA**

**NORTE
EUGENIO
ESPEJO**

Llano
Chico

CALDERON

Calderon

**DELEGACION
AEROPUERTO**

TUMBACO

SIMBOLOGIA	
RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD	● EJECUTADO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO	■ EJECUTADO
GESTIÓN DE TRÁFICO	● EJECUTADO
EJE VIAL	—
LIMITE ZONA ADMINISTRATIVA	□
LIMITE PARROQUIAL	□



INTERVENIONES EPMMOP PARROQUIA CALDERON PERIODO 2016-2017
NO INCLUYE OBRAS DISTRIALES


COMPONENTE	PROYECTO	MEDIDA	UNIDAD	COSTO (USD)	
INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTO	OBRA NUEVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	2	ESTUDIO	38.625,55	
	REDUCTORES DE VELOCIDAD	9	INTERVENCIONES	13.016,63	
	MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO)	12	REDUCTORES		
		30005	No. BACHES INTERVENIDOS	439979,75	
	MEJORAMIENTO VIAL (MINGAS Y MEJORAMIENTOS)	2077	M3		
		11	INTERVENCIONES	260.157,1	
		8,7	Km.		
	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	1	MURO	520,78	
		3	INTERVENCIONES	333,73	
	EMERGENCIAS	1	INTERVENCIONES	49,44	
		13	EMERGENCIAS	7.839,56	
TOTAL INTERVENCIONES VIALES				320.542,79	
ESPACIO PÚBLICO	TRANSFORMACION ESPACIOS URBANOS (MOBILIARIO URBANO)	2	INTERVENCIONES	2.419,00	
	AREAS RECREATIVAS (JUEGOS INFANTILES)	7	INTERVENCIONES	24.007,56	
		2.001	m2		
	AREAS DEPORTIVAS	1	CANCHA		
		1.750,49	m2	92.206,92	
	ADMINISTRACION DE PARQUES	4	APADRINAMIENTO	83.816,00	
		2.080	m2		
	ORNAMENTACION (PILETAS)	2	PILETAS	5.410,00	
		395	m2		
	AREAS VERDES (ARBORIZACIONES, PODAS, REHABILITACIONES PLAZAS)	34.157	m2		
		14	REHABILITACIONES	146.003,40	
TOTAL INTERVENCIONES ESPACIO PUBLICO				353.862,88	
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	588,46	M2	19.819,10	
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	5	INTERVENCIONES	34.661,72	
		7	DERRIBOS	7.038,93	
	SEMAFORIZACIÓN	105	MANTENIMIENTOS	28.552,79	
		3	INSTALACIONES	117.031,70	
	TOTAL DE INTERVENCIONES GESTION DEL TRAFICO				207.104,24
	TOTAL				881.509,91

2. Intervenciones parroquia Llano Chico Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
EMERGENCIA	Atención emergencia - limpieza de material en la vía - Quebrada Chaquiscahuayco	816,97	2016
	Atención emergencia - limpieza material pétreo en la vía - Sector Quebrada de Chaquishcaguayco	1.892,07	2016
	Atención emergencia - limpieza material sobre la vía - Sector Llano Chico	49,44	2016
	Atención emergencia - limpieza de escombros en la vía, Av. SIMÓN BOLÍVAR	82,40	2016
	Atención emergencia - limpieza de material en la vía, AV. SIMÓN BOLÍVAR.	284,13	2016
	Atención emergencia - limpieza deslizamiento de material sobre la vía , VÍA A LLANO CHICO	49,44	2016
	Atención emergencia - limpieza material en la vía, AV.SIMON BOLIVAR	30,09	2017
	Atención emergencia - Limpieza de árbol caído - material pétreo en la vía - Bella Aurora, CALLE LOS NOGALES	89,27	2017
	Desbroce - Rameado de talúd - Bella Aurora, CALLE EL ANGEL	19,20	2017
	Atención emergencia - Limpieza material en la vía, AV. SIMON BOLIVAR	35,33	2017
	Limpieza de escombros, CORREDOR PERIFERICO NORTE	121,81	2018
	Limpieza de escombros, AV, SIMON BOLIVAR	157,66	2017
	Atención emergencia - Limpieza material en la vía, CORREDOR PERIFERICO NORTE	62,23	2017
	Atención emergencia - Limpieza de material en la vía, AV. SIMON BOLIVAR	113,44	2017
	Atención emergencia - Limpieza material, CALLE CARAPUNGO	106,92	2017
Atención emergencia - Limpieza material en la vía, CORREDOR PERIFERICO NORTE	67,94	2017	
Atención emergencia - Limpieza de material, AV. SIMON BOLIVAR	102,50	2017	
Limpieza de escombros, Av. Simón Bolívar	25,69	2017	
Atención emergencia - Limpieza de material en la vía, Av. Simón Bolívar	66,34	2017	
TOTAL		4172,87	



Llano Chico

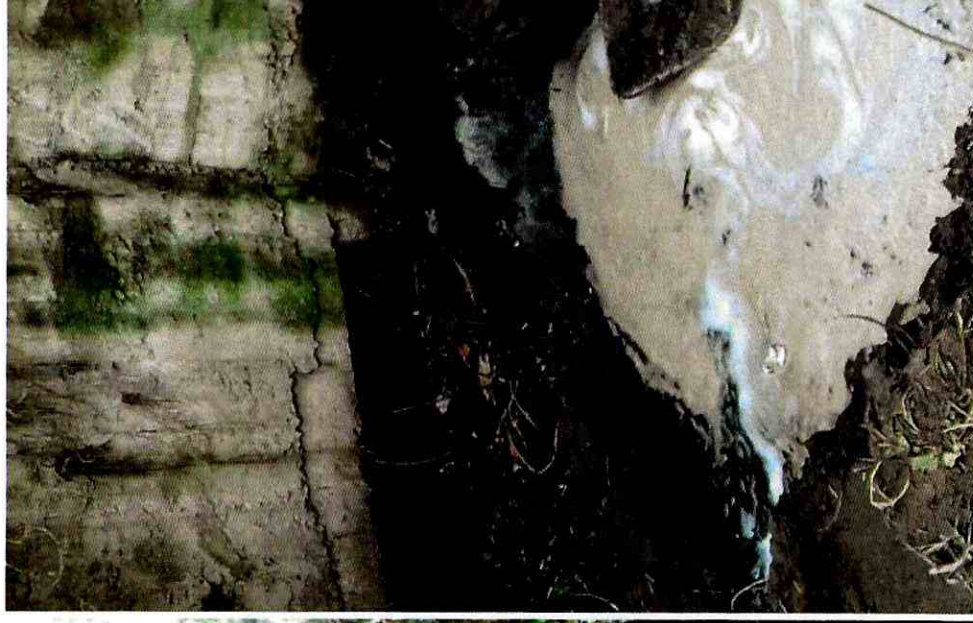

LIMPIEZA DE DIQUE EN EL CRUCE DE VÍA, SECTOR LLANO CHICO

Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
OBRA CIVIL	Limpieza de material pétreo - Quebrada Chaquishaguayco, CORREDOR PERIFÉRICO NORTE	24,72	2016
	Limpieza de deslave de material - Quebrada Chaquishaguayco, CORREDOR PERIFÉRICO NORTE	4,12	2016
TOTAL =		28,84	

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
LIMPIEZA VIAL	Limpieza de cruce de vía -rameado, Calle 17 de septiembre	482,81	2017
	Limpieza de quebrada (apoyo a EPMAAPS), Calle Alfonso Tufiño	57,03	2017
	Limpieza de escombros Av. Simón Bolívar (5 intervenciones)	1.237,98	2017
	Limpieza de escombros, Corredor periférico norte	41,59	2017
TOTAL		1.819,11	

X

Llano Chico: Infraestructura Vial

BACHEO 2016 - 2017				
MES	COSTO	m3	# CALLES	# BACHES
ENERO	\$894,18	6	2	130
FEBRERO	\$196,14	3	2	10
MARZO	\$772,56	4	1	130
ABRIL	\$4.249,08	22	5	269
MAYO	\$3.086,24	16	3	141
JUNIO	\$6.365,37	33	6	533
JULIO	\$5.230,13	23	11	826
AGOSTO	\$3.842,35	17	6	258
SEPTIEMBRE	\$2.098,10	13	3	151
OCTUBRE	\$2.937,18	15	4	125
NOVIEMBRE	\$7.417,27	35	9	549
DICIEMBRE	\$4.147,04	19	7	247
ENERO	\$2.755,94	13	5	360
FEBRERO	\$5.027,28	22	10	628
MARZO	\$4.234,88	19	8	426
ABRIL	\$3.201,52	12	6	395
TOTAL	\$56.455,26	272	88	5178

Llano Chico: Gestión de Tráfico

PROYECTO	ACTIVIDAD	INTERVENCIONES	COSTO (USD)	AÑO EJECUCIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DMQ	SEÑALIZACION HORIZONTAL DE FLECHAS,PASO CEBRAS,LINEAS GARCÍA MORENO SECTOR COCOTOG	2	629,48	2017
TOTAL			629,48	



X

Llano Chico: Espacio Público

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)
ARBORIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO (VIVEROS)	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, PARROQUIA LLANO CHICO-Jardinería	7.060,00
	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-Jardinería	
PODA, CORTE DE CÉSPED (SANEAMIENTO - CORRECCIÓN)	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, PARROQUIA LLANO CHICO, corte de césped	17.940,00
	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, PARROQUIA LLANO CHICO, poda	
EMERGENCIAS	INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, PARROQUIA LLANO CHICO	2.800,00
TOTAL		27.800,00


Llano Chico

INTERVENCIONES EPMMOP PARROQUIA LLANO CHICO PERÍODO 2016-2017				
NO INCLUYE OBRAS DISTRITALES				
COMPONENTE	PROYECTO	MEDIDA	UNIDAD	COSTO (USD)
INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO)	5168	No. BACHES INTERVENIDOS	56.455,26
		272	m3	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	LIMPIEZA VIAL	8	INTERVENCIONES	1.819,41
		2	INTERVENCIONES	28,84
		19	EMERGENCIAS	4.172,87
TOTAL INTERVENCIONES VIALES				62.476,38
ESPACIO PUBLICO	AREAS VERDES	4	INTERVENCIONES	25.000,00
ESPACIO PUBLICO	EMERGENCIAS	1	INTERVENCIONES	2.800,00
TOTAL INTERVENCIONES VIALES				27.800,00
SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	133,93	m2	629,48
TOTAL DE INTERVENCIONES GESTION DEL TRAFICO				629,48
TOTAL				90.905,86

A

Obras Distritales Adm. Calderón


INVERSIÓN TOTAL 2016 USD 79.695.535,64

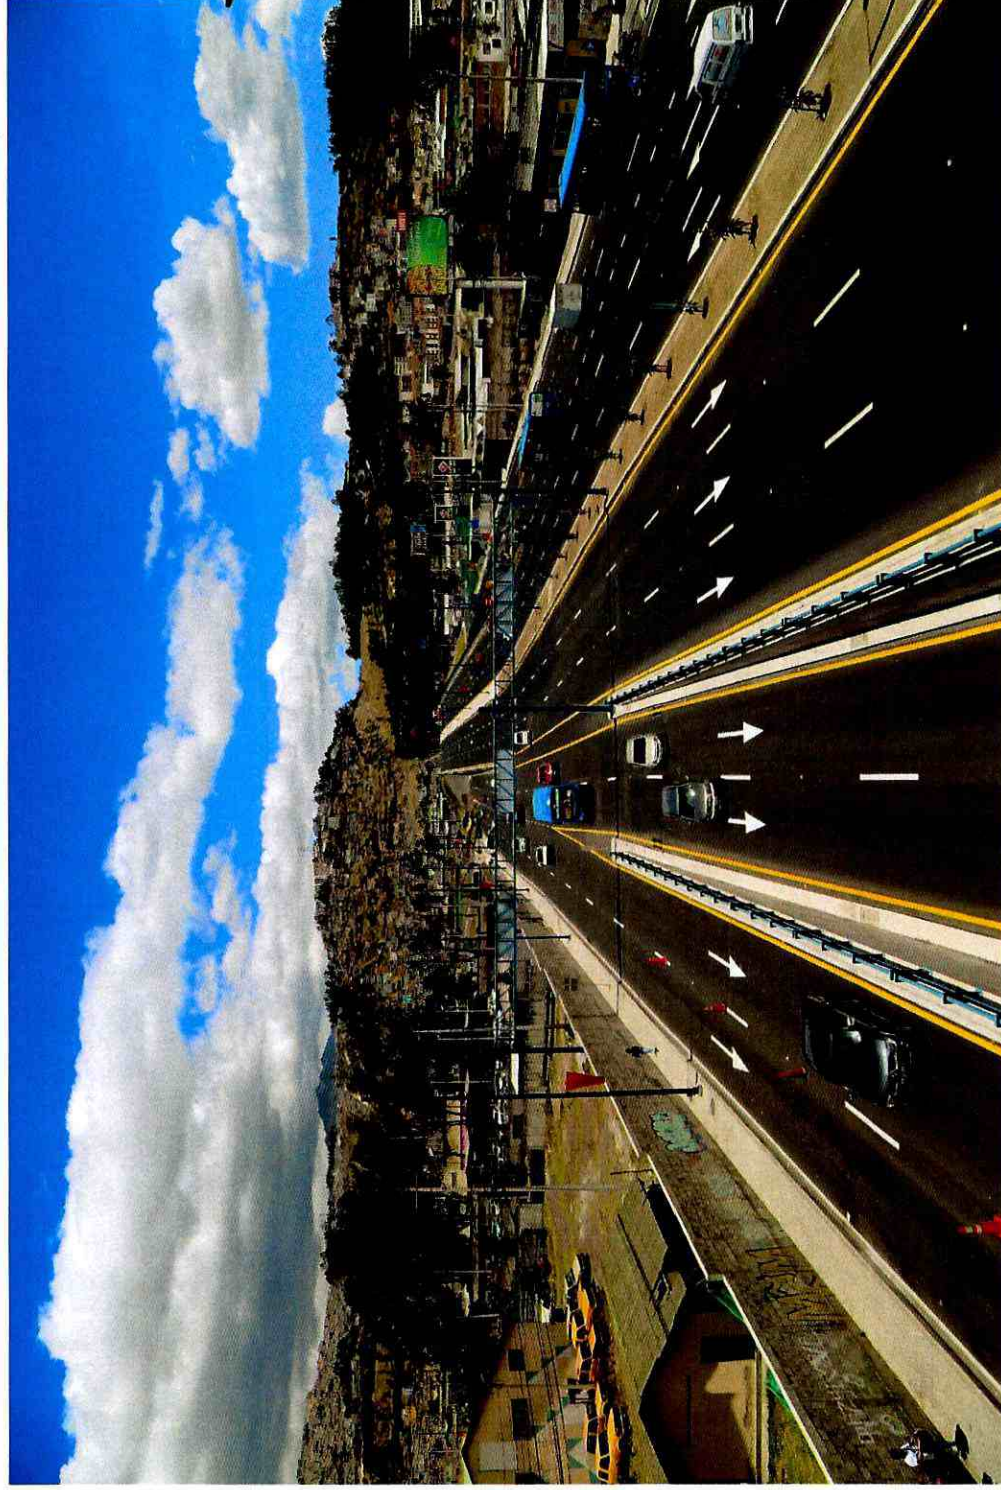

Programa: Red vial, Conectividad Accesibilidad

PROYECTO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO DEVENGADO 2016	ESTADO
INFRAESTRUCTURA VIAL	EMERGENCIA	Obras de estabilización del talud oriental, encauzamiento de la salida de la alcantarilla metálica y restitución occidental de la quebrada Chaquishahuaycco	722.829,04	Ejecutado

Obras Distritales

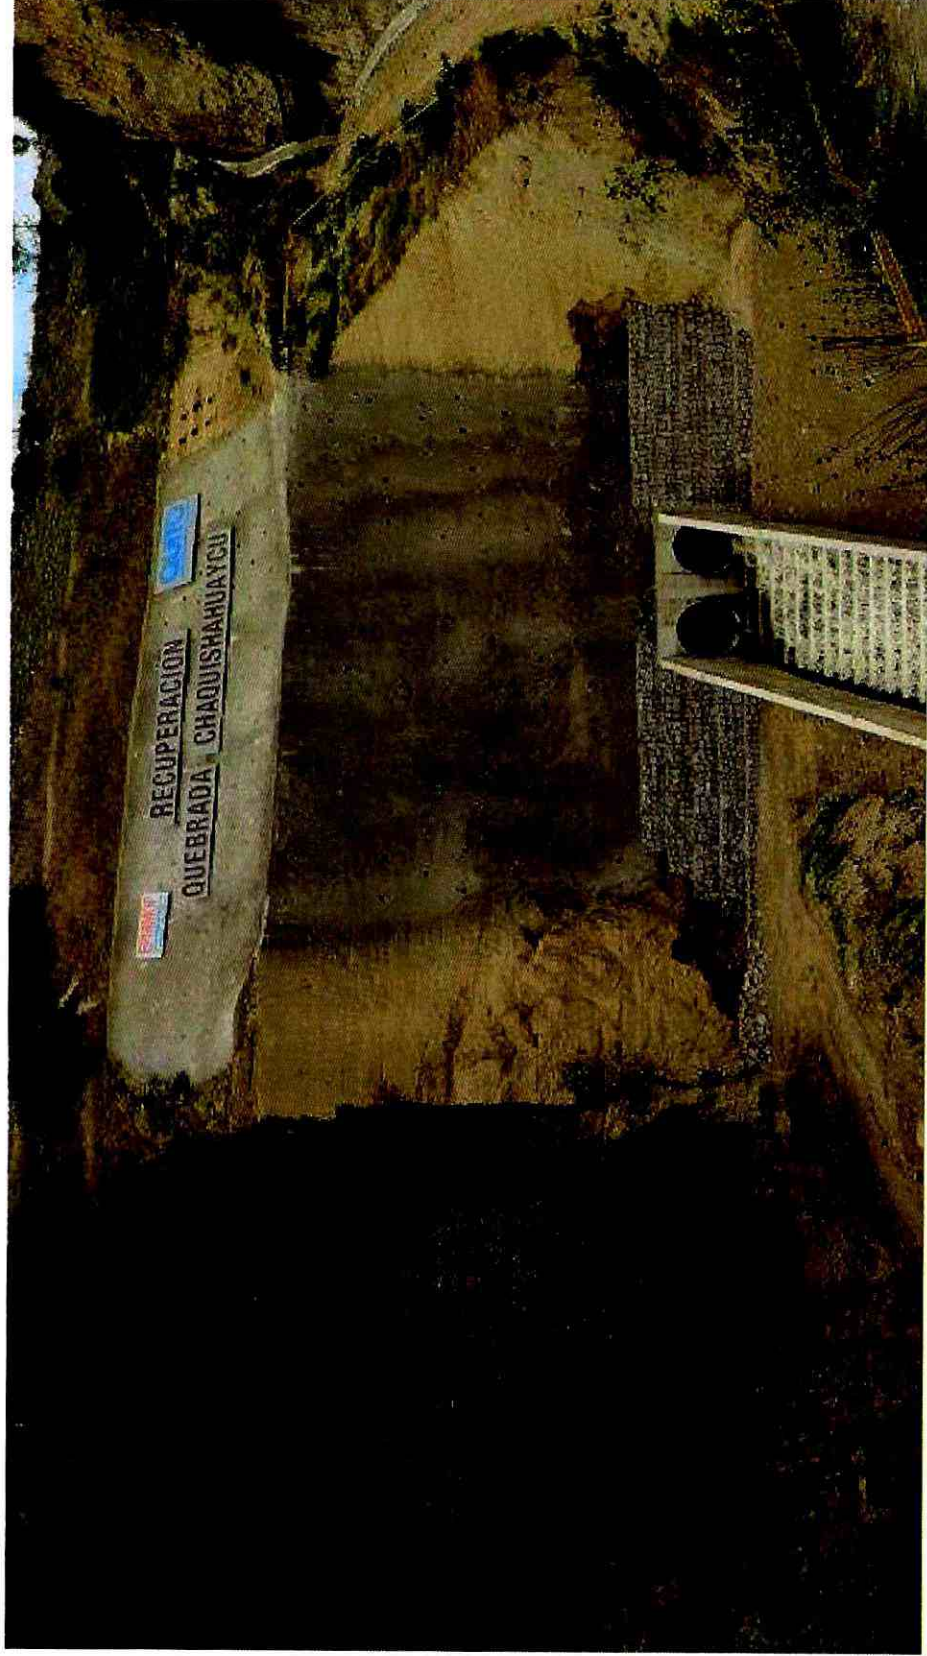

[Handwritten signature]

Programa: Sistema Integrado de Transporte Público

PROYECTO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO REFERENCIAL - OBRA (USD)	PARROQUIA	ESTADO
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD	GESTIÓN PARA LA MOVILIDAD	INTERCAMBIADORES A DESNIVEL	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR CARAPUNGO	20.619.000,00	CALDERÓN	EJECUTADO

Programa: Red vial, Conectividad y Accesibilidad


PROYECTO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO DEVENGADO 2016	ESTADO
INFRAESTRUCTURA VIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL OBRA NUEVA	ASFALTADO	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR (CORREDOR NOR-ORIENTAL)	58.195.706,60	EN EJECUCIÓN

Programa: Gestión de Tráfico

SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL INFORMATIVA SOBRE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR TRAMO ENTRE PANAMERICANA NORTE Y QUEBRADA SAGUANCHI	158.000,00	EJECUTADO

Obras Distritales Prolongación Av. Simón Bolívar

Estado de la Obra Ed.

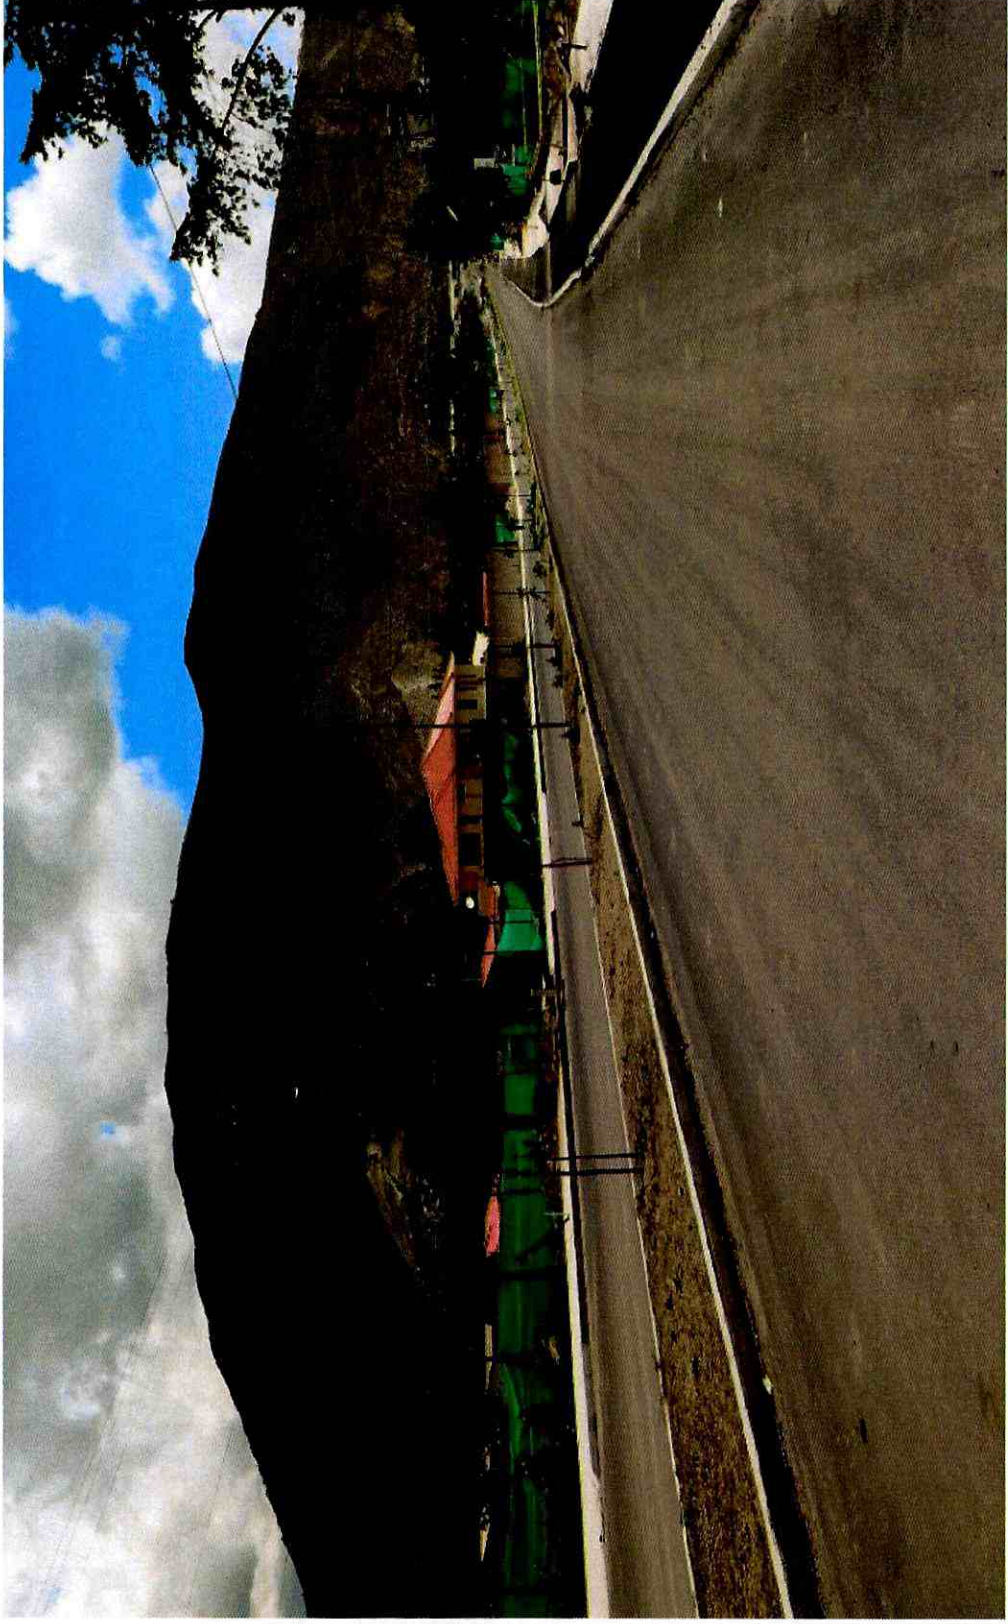

EP

QUITO

ALCALDÍA

EPMMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Intervenciones en ejecución 2017



Calderón: Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)
INFRAESTRUCTURA VIAL OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE ATAHUALPA FASE 1	515.977,14
	TOTAL	515.977,14

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	% AVANCE
OBRA CIVIL	Construcción cunetas viales - Calle Carapungo	1300,00	10%
	TOTAL	1.300,00	



X


Calderón: Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	% AVANCE
MEJORAMIENTOS	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CARAPUNGO DESDE OE11 HASTA OE13 LINARES	112.247,21	70%
TOTAL		112.247,21	

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)
REHABILITACION VIAL	ESTUDIO PARA LA RESTITUCIÓN DEL PASO ELEVADO PEATONAL SOBRE LA PANAMERICANA NORTE INGRESO A LA "BOTA"	5.000,00
	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PANAMERICANA NORTE DESDE Oe11J HASTA ABSC. 3+900.	25.000,00
TOTAL		30.000,00

Calderón

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)
SEMAFORIZACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA INTERSECCIÓN EN LUIS VACCARI Y GEOVANNI CALLES	101.480,26
TOTAL		101.480,26

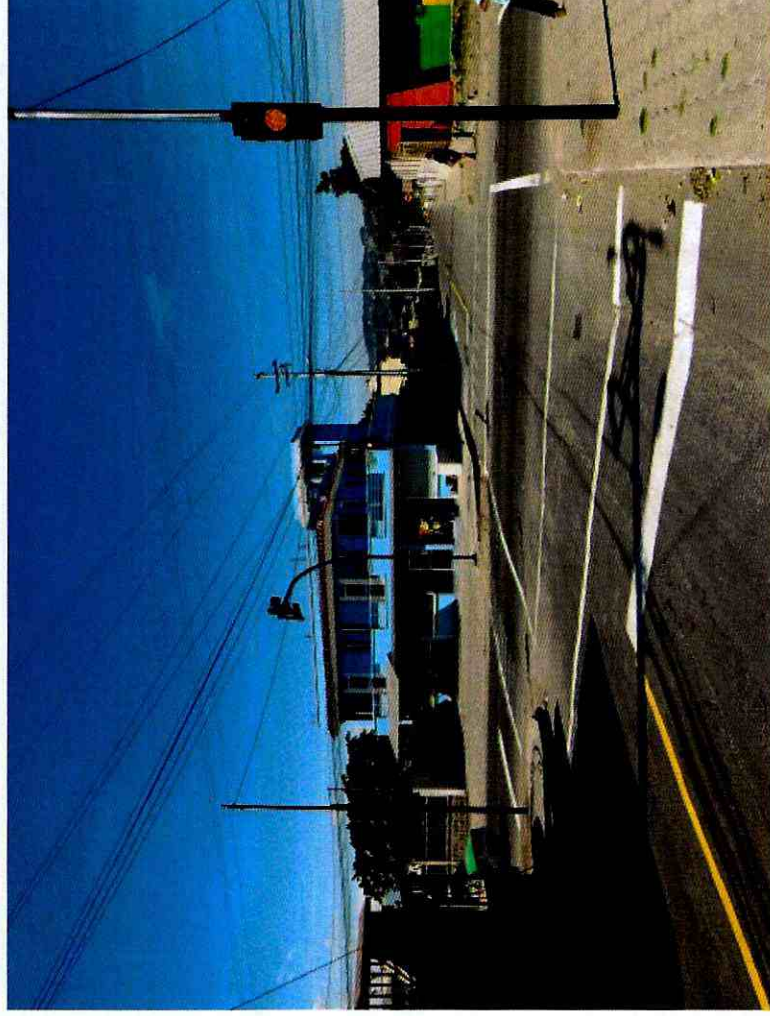

X


Calderón

INTERVENCIONES EPMMOP PARROQUIA CALDERÓN PERÍODO 2017 EN EJECUCIÓN

COMPONENTE	PROYECTO	MEDIDA	UNIDAD	COSTO (USD)
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL	OBRA NUEVA (ADOQUINADO, ASFALTADOS, PUENTES VEHICULARES)	1	INTERVENCIONES	515.977,14
		805,58	m	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2	ESTUDIOS	30.000,00
SEMAFORIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	SEMAFORIZACION	1	INTERVENCIÓN	101.480,26
TOTAL INTERVENCIONES VIALES				647.457,40
TOTAL				647.457,40


Llano Chico: Infraestructura Vial

PROYECTO	ACTIVIDAD	COSTO (USD)	% AVANCE
OBRA CIVIL	Trabajos de "Refaccionamiento de cunetas viales sector Llano Grande-Llano Chico -Quebrada Chaquishahuayco	13.625,61	10%
TOTAL		13.625,61	

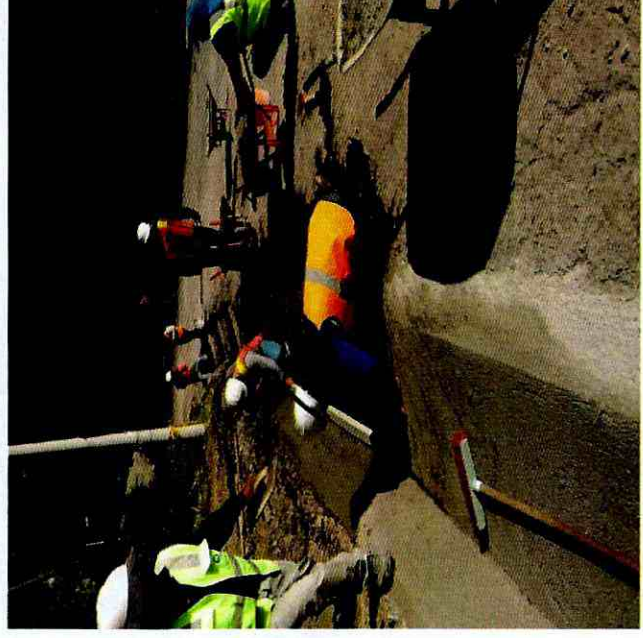

Programa: Obras Distritales (En Ejecución)

PROYECTO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	PRESUPUESTO REFERENCIAL – OBRA (USD)	ESTADO
INFRAESTRUCTURA VIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL OBRA NUEVA	ASFALTADO	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR (CORREDOR NOR-ORIENTAL)	2017	<i>Costo Total</i> 108,096,871.8	EN EJECUCIÓN

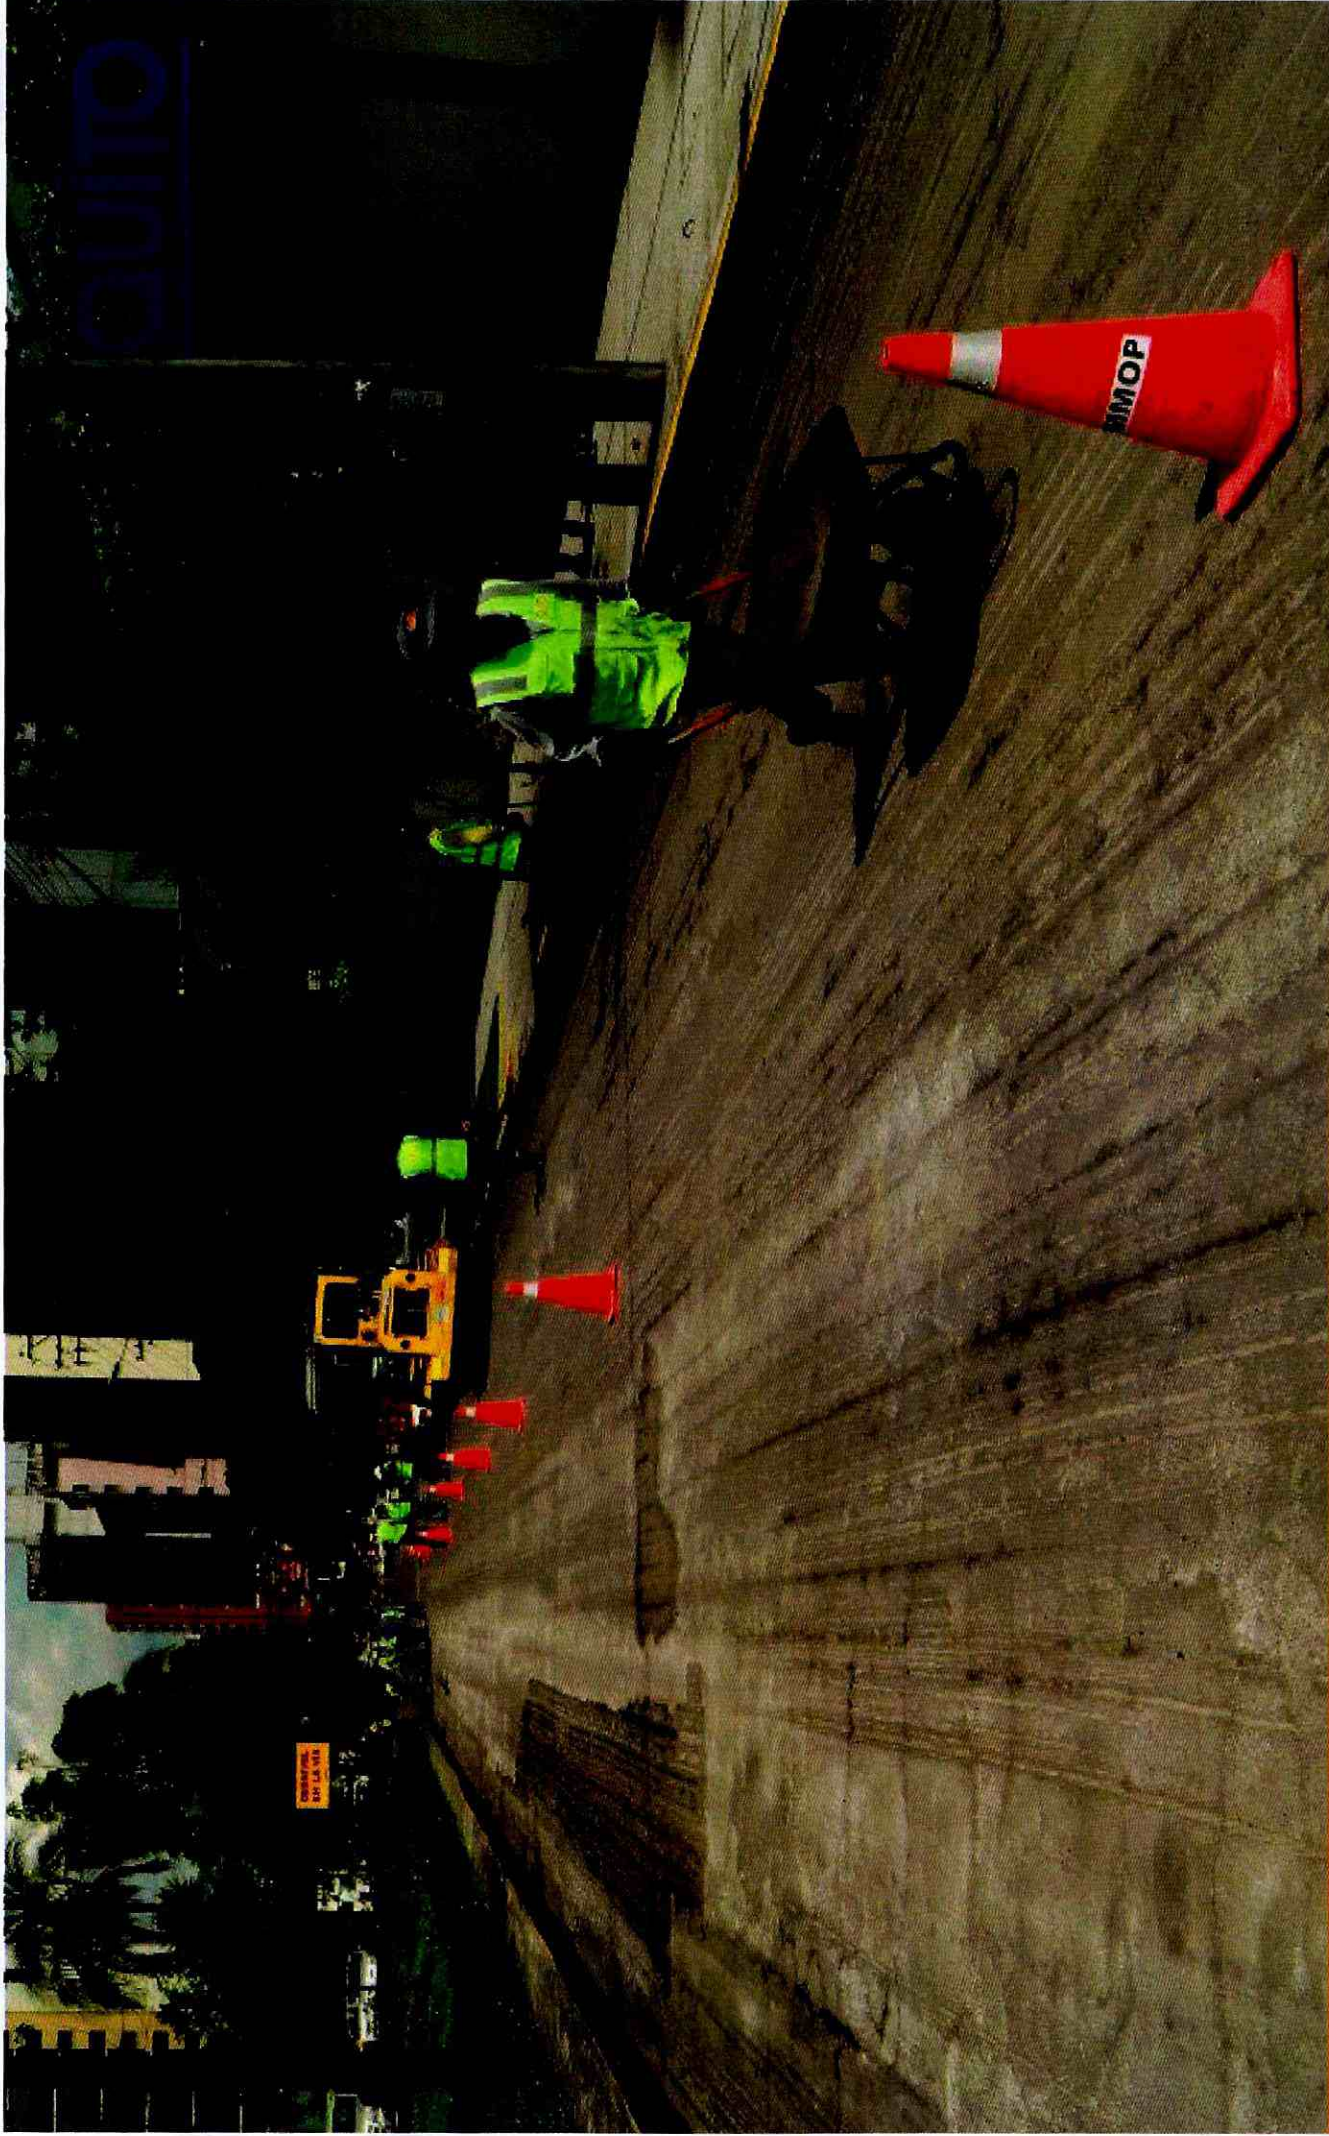

EPMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS


Intervenciones por ejecutar

X

Calderón: Infraestructura Vial

COSTO APROX. TOTAL USD
4.890.972,21

TRATAMIENTO														COSTOS APROXIMADOS (USD)									
No.	Calle	Desde	Hasta	Barrio	Parroquia	Longitud Aprox. (m)	Ancho (m)	Pendi. (%)	Barrio Regularizado	Trazado Vial	Afectaciones	Agua Potable	Alcantarillado	Red Eléctrica	Capa de rodadura existente	Mant.	Tratamiento Provisional (Asfalto en Frío)	Mantenimiento	Tratamiento Provisional (Asf. En Frío)	Tratamiento Definitivo			
1	Carapungo	17 de Septiembre X:5016 86.82 Y:9986 068.45	Absc. 2+068	El Carmen 1, Redin 2, Llano Grande.	Calderón	2.068,00	8,00	1%	Si	Si	No	Si	Si	No	Asfalto	Mantenimiento rutinario (bacheo)	No aplica	5.782,13		672.789,33			
2	García Moreno	Carapungo N:5070 90.97 Y:9987 204.45	Pulupa N:509300,7 9 Y:9985811, 41	4 Esquinas, Redin 2, El carmen 2, La Candelaria, Alta, San Juan, Loma Alto 1.	Calderón	2.850,00	10,00	4%	Si	Si	No	Si	Si	Si	Asfalto	Mantenimiento rutinario (bacheo)	No aplica	9.960,75		1.159.000,00			
3	Vicente Rocafuerte	Derby N:5069 48.35 Y:9989 928.49	Cacha N:507663.4 8 Y:9990429, 36	Pamela Cristina, Churo Loma y Vitcabamba	Calderón	880,00	12,00	1%	Si	Si	No	Si	Si	Si	Tierra (Suelo natural)		Si aplica		126.720,00				
4	Vicente Rocafuerte	Madrid N:5075 43.95 Y:9991 122.64	Carlos Mantilla N:507543.9 5 Y:9991122, 64	San Juan	Calderón	430,00	12,00	9%	Si	Si	No	Si	Si	Si	Tierra (Suelo natural)		Si aplica		61.920,00				
5	Panamericana Norte	Oe11J N:5052 73.81 Y:9988 004.78	Abscisa 3+900 N:508997.0 3 Y:9988824, 66+	Centro Administrativo	Calderón	3.900,00	18,00	0%	Si	Si	No	Si	Si	Si	Asfalto	Mantenimiento rutinario (bacheo)	No aplica			2.854.800,00			
LONGITUD TOTAL (m)						10.128,00															15.742,88	188.640,00	4.686.589,33

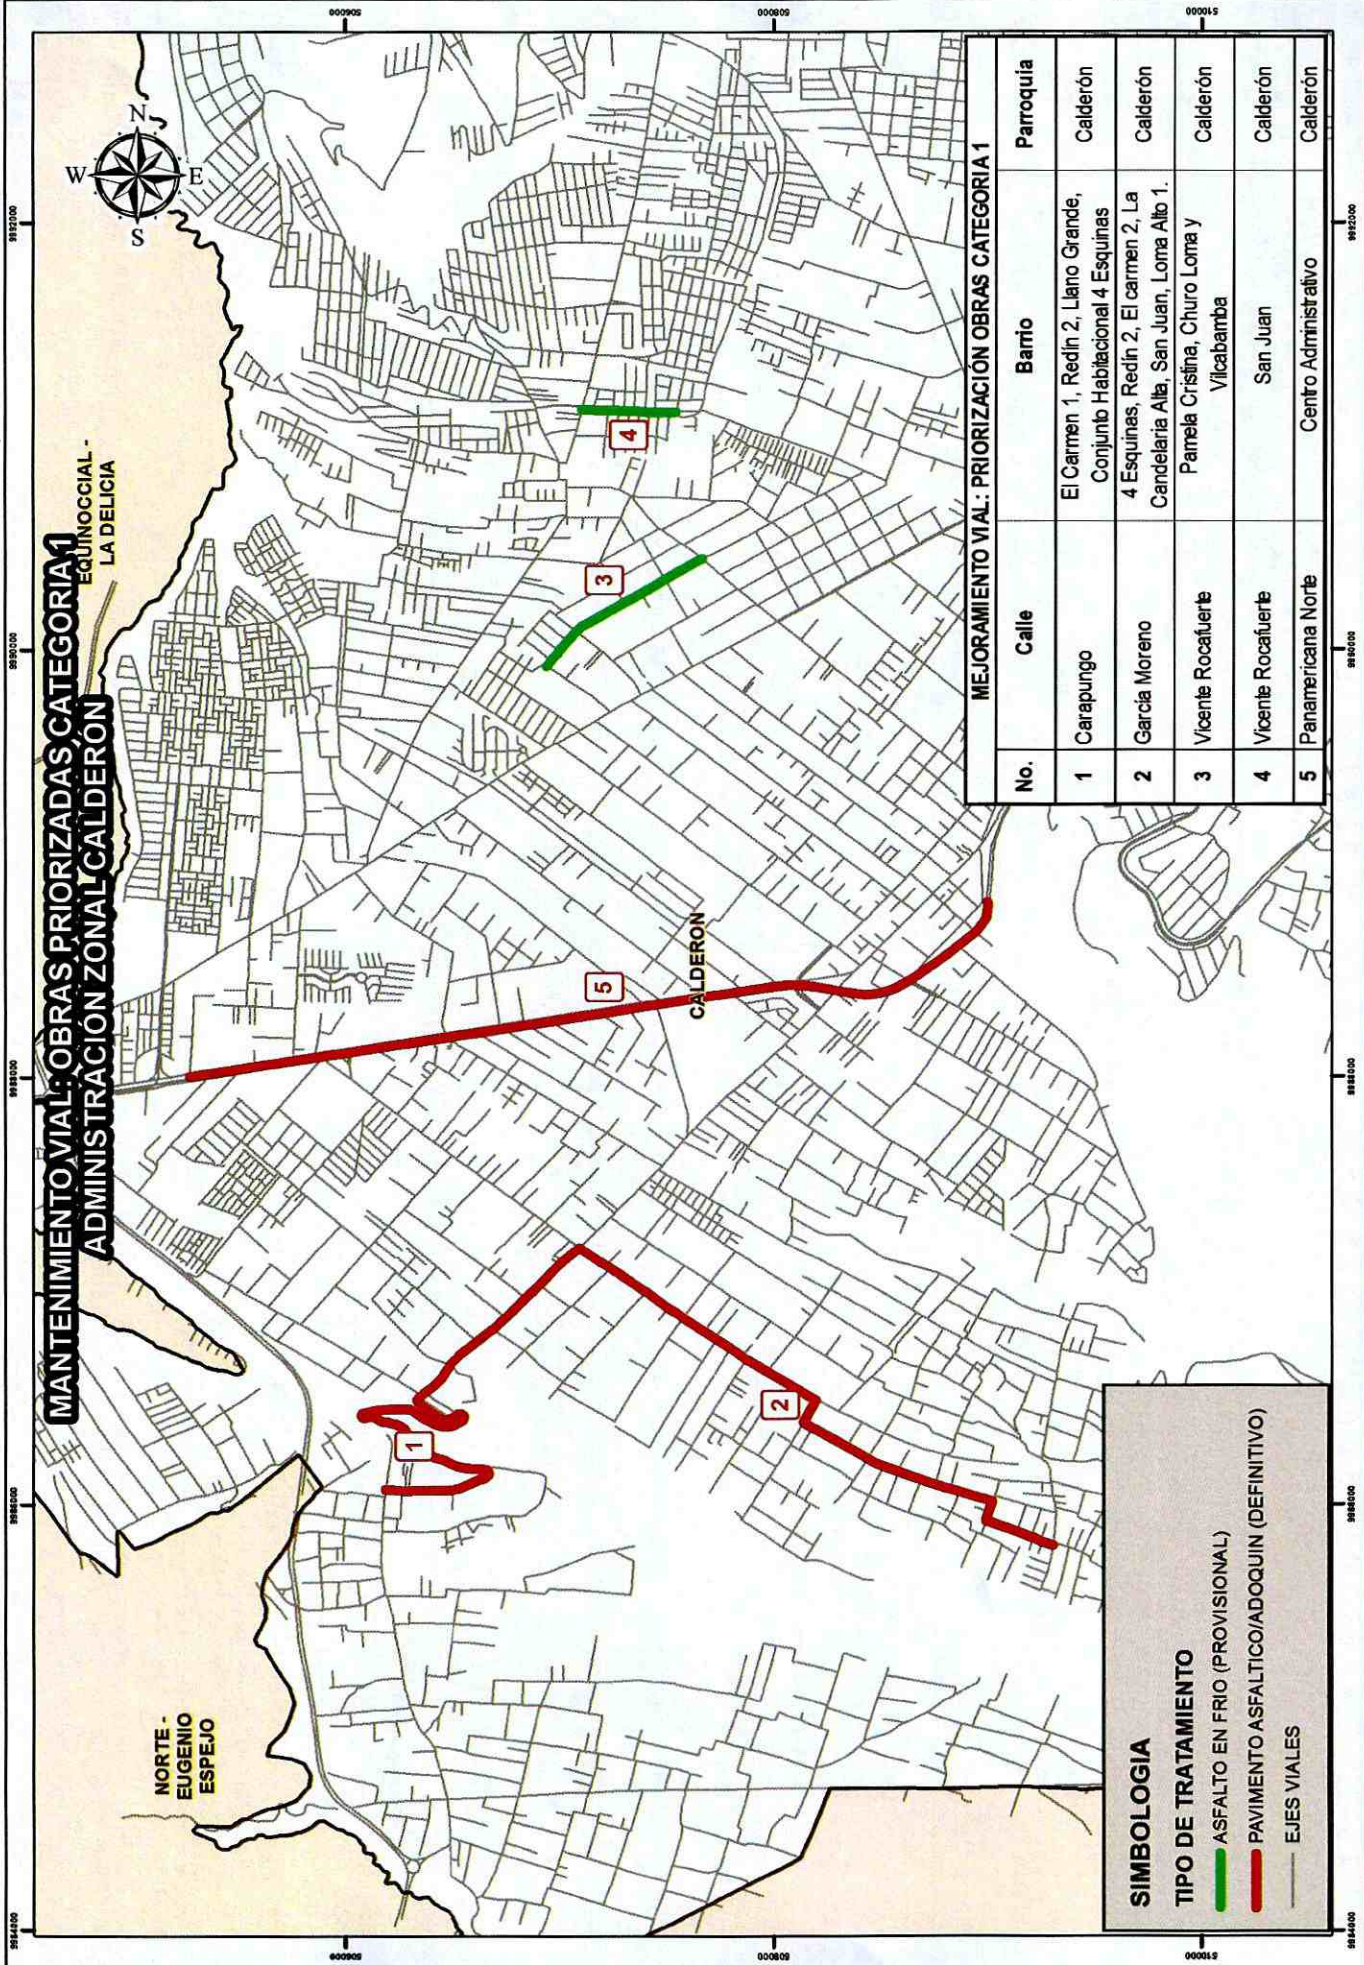

MANTENIMIENTO VIAL - OBRAS PRIORIZADAS CATEGORIA 1
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

MEJORAMIENTO VIAL: PRIORIZACIÓN OBRAS CATEGORIA 1

No.	Calle	Barrio	Parroquia
1	Carapungo	El Carmen 1, Redin 2, Llano Grande, Conjunto Habitacional 4 Esquinas	Calderón
2	García Moreno	4 Esquinas, Redin 2, El Carmen 2, La Candelaria Alta, San Juan, Loma Alto 1.	Calderón
3	Vicente Rocafuerte	Pamela Crisina, Churo Loma y Vilibamba	Calderón
4	Vicente Rocafuerte	San Juan	Calderón
5	Panamericana Norte	Centro Administrativo	Calderón

SIMBOLOGIA

TIPO DE TRATAMIENTO

- ASFALTO EN FRIO (PROVISIONAL)
- PAVIMENTO ASFALTICO/ADOQUIN (DEFINITIVO)
- EJES VIALES

X

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

No.	Nombre del Proyecto	Tareas	Costo (\$)	Año 2017				Año 2018													
				2do Cuatrimestre		3er Cuatrimestre		1er Cuatrimestre		2do Cuatrimestre											
				May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		
1	Carapungo	Contratación de estudios	-																		
		Contratación de Obra	-																		
		Ejecución de Obra	\$ 672.789,33																\$ 672.789,33		
2	García Moreno	Contratación de estudios	-																		
		Contratación de Obra	-																		
		Ejecución de Obra	\$ 1.159.000,00																\$ 1.159.000,00		
3	Vicente Rocafuerte	Tratamiento Provisional (asfalto en frío)	\$ 126.720,00										\$ 126.720,00								
		Tratamiento Provisional (asfalto en frío)	\$ 61.920,00											\$ 61.920,00							
5	Panamericana Norte	Contratación de estudios	-																		
		Contratación de Obra	-																		
		Ejecución de Obra	\$ 2.854.800,00																\$ 2.854.800,00		
				\$ 188.640,00																\$ 4.686.589,33	

Azul	Estudios Administración Directa
Morado	Ejecución de obra por Administración Directa
Verde	Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café	Contratación de Obra
Rojo	Contratación de Estudios y Obra
Amarillo	Ejecución de obra por Contrato

**A
N
E
X
O**

No.

2

f

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

INVERSIONES EN ESTUDIOS Y OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PERÍODO 2016-2017



ZONA	PARROQUIA	TIPO OBRA / ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD	
Calderón	A	Agua potable	Estudios de agua potable	Programados				5.873.857
				Diseño de la línea de conducción Puenbo-Calderón y planta de tratamiento.	15/10/2017	10/10/2018		1.100.000
				Diseño definitivo de la línea de transmisión, tanque de almacenamiento y redes, sector Calderón.	15/07/2017	10/07/2018		500.000
							1.846.962	
							1.600.000	

ZONA	PARROQUIA	TIPO	OBRA / ESTUDIO	ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
Calderón	A								
Obras de agua potable									
En construcción									
Extensión de redes de agua potable para la Administración Zonal Calderón Etapa 1:						21/11/2016	24/06/2017	93%	136.962
Proceso de contratación									
Extensión de redes de agua potable para la Administración Zonal Calderón, 2da. Etapa.						15/09/2017	14/12/2017		110.000
									5.873.857
									246.962



ZONA	PARROQUIA	TIPO OBRA / ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
	Calderón	Saneamiento					5.873.857
		Estudios de saneamiento					4.026.895
		Concluidos					263.979
			Diseño definitivo de la cuenca de la quebrada Carretas.	07/08/2015	29/12/2016	100%	68.479
		Programados					
			Estudios de prefactibilidad, Factibilidad y Diseño definitivo de la ampliación del sistema de alcantarillado para la parroquia Calderón.	15/06/2017	10/06/2018		195.500

✗

ZONA	PARROQUIA	TIPO	OBRA / ESTUDIO	ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
	Calderón		Sanearamiento						5.873.857
			Obras de sanearamiento						4.026.895
			Concluidas						3.762.916
			Redes de alcantarillado para varios sectores de Calderón:						
			Barrio El Bosque II-IV, pasaje "C" sector La Llanura, calle Buenos Aires, barrio Nueva Vida 2, Los Geranios II y descarga tanque San Juan barrio Colinas del Norte.			02/02/2016	27/11/2016	100%	507.342
			Alcantarillado combinado para el sector de la calle Pucará, parroquia Calderón.			06/10/2016	15/05/2017	100%	419.802

X

ZONA	PARROQUIA	TIPO OBRA / ESTUDIO	ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
Calderón		Saneamiento						5.873.857
		Obras de saneamiento						4.026.895
		En construcción						
				Alcantarillado combinado para el barrio San Francisco de Oyacoto, 4ta. Etapa. Calderón.	07/04/2017	02/04/2018	15%	185.902
		Obras de saneamiento						
		Proceso de contratación						
				Prolongación de la descarga de alcantarillado del barrio San Juan Loma. Calderón.	13/08/2017	09/02/2018		359.870
				Alcantarillado para el barrio Colinas del Valle y otros, parroquia Calderón.	15/07/2017	12/11/2017		110.000



2

ZONA	PARROQUIA	TIPO	OBRA/ ESTUDIO	ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
Calderón	A		Saneamiento						5.873.857
			Obras de saneamiento						4.026.895
			Programadas						
			Redes de alcantarillado		para la Administración Zonal	15/07/2017	10/06/2018		1.495.000
			Calderón, 2da. Etapa.						
			Alcantarillado combinado		para el barrio La Capilla y	15/09/2017	12/06/2018		685.000
			calle Coya. Calderón.						



ZONA	PARROQUIA	TIPO	OBRA / ESTUDIO	ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
	Llano Chico	Alcantarillado	Estudios de saneamiento						374.207
			En Proceso de contratación						374.207
			Estudio de factibilidad y Diseño definitivo de las obras de saneamiento de las quebradas San Antonio, Horinaza y Chaquiscahuaycu. Llano Chico.			15/08/2017	12/04/2018		95.800
			Obras de saneamiento Programadas						278.407
			Alcantarillado para varios sectores de la parroquia Llano Chico.			17/10/2017	14/07/2018		278.407

Handwritten signature or mark.

ZONA	PARROQUI	TIPO	OBRA / ESTUDIO	ESTADO	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO (%)	MONTO TOTAL USD
	A				INVERSIÓN TOTAL EN LA AZ CALDERÓN 2016 - 2017				6.248.064



X

GRACIAS

