

QUITO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD **EMSEGURIDAD**

www.emseguridad-q.gob.ec

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA
PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA**

EP EMSEGURIDAD

**Ing. Jorge Arguello
GERENTE GENERAL**

Quito, 24 de agosto de 2017

QUITO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017

PRESUPUESTO	VALOR	AVANCE
CODIFICADO	19,062,012.61	
CERTIFICADO	12,018,942.73	63.05%
COMPROMETIDO	10,924,882.24	57.31%
DEVENGADO	5,285,691.54	27.73%
PROGRAMÁTICO		42.74%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017

(Sin considerar el valor del Fondo de Emergencia)

PRESUPUESTO	VALOR	AVANCE
CODIFICADO	17,254,260.96	
CERTIFICADO	11,600,830.44	67%
COMPROMETIDO	10,548,729.18	61%
DEVENGADO	5,008,340.68	29%
PROGRAMÁTICO		42.74%

NO SE INCLUYE MONTO DEL FONDO DE EMERGENCIA

Por ser un valor que se utiliza de acuerdo a los eventos presentados en el DMQ, y su saldo por lo tanto es acumulativo de un período a otro

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017 POR PROYECTO

PROYECTO	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
		CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
PREVENCIÓN SITUACIONAL	37.99%	3,691,938.34	1,286,043.80	34.83%	982,799.92	26.62%	696,200.43	18.86%
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	62.53%	1,100,854.55	729,459.01	66.26%	634,382.37	57.63%	485,978.64	44.15%
REDUCCIÓN DE RIESGOS	54.50%	4,611,388.25	3,676,250.86	79.72%	3,440,545.20	74.61%	1,373,531.49	29.79%
ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	32.92%	4,387,108.18	2,520,986.76	57.46%	2,405,328.95	54.83%	1,030,242.09	23.48%
APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	33.35%	3,412,309.30	2,300,988.70	67.43%	2,078,466.31	60.91%	990,764.88	29.04%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19.28%	804,614.16	455,293.28	56.59%	333,496.04	41.45%	137,446.78	17.08%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	58.33%	1,053,799.83	1,049,920.32	99.63%	1,049,863.45	99.63%	571,527.23	54.23%
TOTAL POA 2017	42.70%	19,062,012.61	12,018,942.73	63.05%	10,924,882.24	57.31%	5,285,691.54	27.73%

PROYECTO: PREVENCIÓN SITUACIONAL

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
ALARMAS COMUNITARIAS INSTALADAS	INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA EL METRO DE QUITO (15AC)	0.00%	25,650.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ALARMAS EN LOS MERCADOS DEL DMQ (21AC)	0.00%	36,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD. (Mantenimiento 1.201 AC. Servicio de Telecomunicaciones)	58.33%	128,255.43	92,928.53	72.46%	92,928.53	72.46%	61,137.08	47.67%
ESPACIOS PUBLICOS PROTEGIDOS CON SISTEMAS DE SEGURIDAD URBANA	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS	45.00%	15,000.00	14,736.46	98.24%	14,736.46	98.24%	4,912.14	32.75%
	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD. (Servicio, Mantenimiento 5EP)	19.44%	68,847.00	1,254.00	1.82%	156.68	0.23%	156.68	0.23%
	READECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS. (11EP)	87.00%	272,663.38	265,550.41	97.39%	265,550.41	97.39%	164,967.63	60.50%
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE, BARRIO NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANÍ	3.18%	1,011,500.00	32,194.11	3.18%	32,194.11	3.18%	-	0.00%
	ESPACIO PUBLICO RECUPERADO ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLOS, BARRIO 6 DE JUNIO, PARROQUIA CONOCOTO	0.00%	720,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	ESPACIO PUBLICO RECUPERADO ADMINISTRACION ZONAL CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN	0.00%	20,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	ESPACIO PUBLICO RECUPERADO ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO, PARROQUIA TUMBACO	0.00%	35,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	REGENERACIÓN URBANA DE LA ZONA SAN BLAS-LA TOLA	98.00%	506,500.00	455,480.38	89.93%	455,480.38	89.93%	400,250.54	79.02%

PROYECTO: PREVENCIÓN SITUACIONAL

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA INSTALADOS	IMPLEMENTACION DE CAMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD, MONITOREADAS POR EL ECU 911. (Adquisición, instalación, fiscalización 15 cámaras Parque Metropolitano).	0.00%	422,000.00	302.48	0.07%	-	0.00%	-	0.00%
	SOTERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADOS. (Tumbaco)	100.00%	13,680.00	9,066.40	66.27%	9,066.40	66.27%	9,066.40	66.27%
CIRCUITO CERRADO DE TV CON INTEGRACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS INSTALADAS	FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TV EN ESPACIOS PUBLICOS. (Adquisición e instalación 4 cámaras CCTV Tumbaco)	50.25%	27,930.00	27,440.00	98.25%	-	0.00%	-	0.00%
	IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TV FASE II PARA MERCADOS DEL DMQ. (CCTV en 10 mercados Fase II)	51.25%	272,916.00	271,113.67	99.34%	-	0.00%	-	0.00%
	MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TV MERCADOS FASE I Y II. (21 mercados)	75.00%	6,600.00	6,580.83	99.71%	3,290.42	49.85%	3,290.42	49.85%
NÓMINA DE PERSONAL	NÓMINA DEL PERSONAL	58.33%	109,396.53	109,396.53	100.00%	109,396.53	100.00%	52,419.54	47.92%

PROYECTO: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA LA DELICIA	0.00%	338,675.00	1,747.20	0.52%	1,747.20	0.52%	1,747.20	0.52%
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA DE CALDERÓN	100.00%	467,000.00	467,000.00	100.00%	392,374.42	84.02%	336,750.91	72.11%
EQUIPAMIENTO CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA CALDERÓN	98.75%	62,252.53	57,252.53	91.97%	54,870.65	88.14%	54,870.65	88.14%
ATENCIÓN A CIUDADANOS VÍCTIMAS DE ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS CEJ DEL DMQ	ASESORÍA Y PATROCINIO DE CASOS REPORTADOS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA DEL DMQ.	55.55%	210,801.60	181,333.86	86.02%	163,264.68	77.45%	81,551.64	38.69%
NÓMINA DE PERSONAL	NÓMINA DEL PERSONAL	58.33%	22,125.42	22,125.42	100.00%	22,125.42	100.00%	11,058.24	49.98%

PROYECTO: REDUCCIÓN DE RIESGOS

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
1 SISTEMA DE SIRENAS ELECTRÓNICAS DE LARGO ALCANCE FUNCIONANDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS Y FRECUENCIA (ARCOTEL) PARA LAS SIRENAS ELECTRÓNICAS DE LARGO ALCANCE	19.44%	9,408.52	7,076.52	75.21%	274.00	2.91%	274.00	2.91%
1 PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS INSTALADOS EN 10 PASOS DEPRIMIDOS	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE ALERTA TEMPRANA - MONITOREO Y ALERTA DE INUNDACIONES EN PASOS DEPRIMIDOS EN EL DMQ.	7.00%	402,372.00	44,352.00	11.02%	44,352.00	11.02%	-	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN EN EL COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID, BARRIO LA MARÍN, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO	80.83%	264,567.00	252,567.00	95.46%	226,119.11	85.47%	62,253.22	23.53%
	MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ DEL PUEBLO BARRIO UNIÓN Y PROGRESO ENTRE COMITÉ DEL PUEBLO Y LA BOTA PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	100.00%	422,000.00	410,000.00	97.16%	406,445.76	96.31%	406,410.19	96.31%
	MURO DE CONTENCIÓN EN SAN SALVADOR Y EL TEJAR BARRIO SAN SALVADOR EL TEJAR PARROQUIA SAN JUAN	95.00%	290,000.00	282,186.80	97.31%	247,939.84	85.50%	112,416.63	38.76%
	MURO DE CONTENCIÓN EN LA ARGELIA, BARRIO LUCHA DE LOS POBRES PARROQUIA LA ARGÉLIA	100.00%	202,060.00	188,600.38	93.34%	188,600.37	93.34%	188,600.37	93.34%
	MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LEONIDAS PROAÑO-SAN BARTOLO, PARROQUIA LA ARGELIA	100.00%	267,500.00	259,757.73	97.11%	259,757.73	97.11%	259,757.61	97.11%
	MURO DE REVESTIMIENTO PARA TALUD - CALLE NECOCHEA Y AV. MARISCAL SUCRE, BARRIO PANECILLO, PARROQUIA SAN JUAN	0.00%	252,536.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

PROYECTO: REDUCCIÓN DE RIESGOS

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES	PASO PEATONAL SOBRE EL RÍO MACHÁNGARA BARRIO EL ROSARIO - LA VICENTINA PARROQUIA ITCHIMBIA-PUENGASÍ	100.00%	268,500.00	253,343.07	94.35%	245,709.72	91.51%	196,580.20	73.21%
	PASO PEATONAL EN EL BARRIO LA VAQUERÍA, PARROQUIA AMAGUAÑA	70.00%	252,567.00	243,587.36	96.44%	243,587.36	96.44%		0.00%
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	OBRAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE INUNDACIONES, EN EL TRAMO DE LA ANTIGUA QUEBRADA CAUPICHO DEL RIO MACHANGARA -SECTOR EL BEATERIO - PRIMERA ETAPA	0.00%	145,900.00		0.00%		0.00%		0.00%
	ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y DISIPADORES DE ENERGÍA EN EL BARRIO EL CALZADO – 1 MAYO, PARROQUIA SAN BARTOLO, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	8.00%	706,941.74	703,824.03	99.56%	703,824.03	99.56%		0.00%
	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y DISIPADORES DE ENERGÍA DE LOS BARRIOS AYMESA Y ASISTENCIA SOCIAL (PLYWOOD)-QUEBRAD CAPULÍ - PARROQUIA QUITUMBE, ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	18.00%	233,200.00	229,891.71	98.58%	226,083.03	96.95%		0.00%

PROYECTO: REDUCCIÓN DE RIESGOS

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN: COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID Y EL HOGAR DE VIDA 2, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (CRUCE VIAL) CALLE ALONSO DE VILLANUEVA-BARRIO AYMESA, ASISTENCIA SOCIAL (PLYWOOD)- PARROQUIA QUITUMBE Y EL PUENTE PEATONAL DE 85M SOBRE LA QUEBRADA LA VAQUERÍA-PARROQUIA AMAGUAÑA	100.00%	40,000.00	38,936.70	97.34%	38,936.70	97.34%	38,936.70	97.34%
	DISEÑO Y ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE MURO Y RECONSTRUCCIÓN EN EL BARRIO LA COLMENA ALTA, PARROQUIA LA LIBERTAD	0.00%	12,000.00	12,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	DISEÑO Y ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD (AV. 24 DE MAYO - PARQUE URBANO LA CUMANDA)	0.00%	11,000.00	11,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	DISEÑO Y ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD (BARRIO EL PLACER) PARROQUIA SAN JUAN.	0.00%	11,000.00	11,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	DISEÑO Y ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD (PARROQUIA PUENGASI CALLE CLEMENTE SÁNCHEZ DE ORELLANA)	0.00%	11,000.00	11,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL SECTOR LADERAS DE SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN DEL MDMQ	95.00%	142,000.00	139,104.00	97.96%	139,104.00	97.96%	-	0.00%
	ESTUDIOS DE LOS DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LADERAS Y TALUDES DE LOS SECTORES EL CALZADO Y TERRANOVA	83.33%	125,400.00	125,400.00	100.00%	116,747.75	93.10%	-	0.00%
	ESTUDIOS INTEGRALES DE AMENAZA POR INESTABILIDAD DE TALUDES E INUNDACIONES EN UN TRAMO DEL RÍO MACHÁNGARA (ANTIGUA QUEBRADA CAUPICHO), EN EL SECTOR DEL BEATERIO	27.50%	144,340.00	144,338.76	100.00%	144,338.76	100.00%	-	0.00%

PROYECTO: REDUCCIÓN DE RIESGOS

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
BIENES Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS	IMPLEMENTACIÓN DE UNA CASA SISMO PARA EL DMQ	100.00%	25,581.60	20,070.40	78.46%	20,070.40	78.46%	-	0.00%
	PRIORIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS	100.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EJECUTADA	DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA QUITO LISTO	100.00%	241,870.00	158,570.01	65.56%	59,010.25	24.40%	50,752.54	20.98%
NÓMINA DE PERSONAL	NÓMINA DEL PERSONAL	58.33%	129,644.39	129,644.39	100.00%	129,644.39	100.00%	57,550.03	44.39%

PROYECTO: ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO	ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS. (Prendas protección personal, kit alimentos, adquisición 2 retroexcavadoras y 2 volquetas de 8 M3, 4 remolques para 3 retroexcavadoras y 1 minicargadora para uso del COE-M para uso del COE-M)	15.34%	1,807,751.65	418,112.29	23.13%	376,153.06	20.81%	277,350.86	15.34%
		30.30%	658,956.00	563,528.80	85.52%	542,704.12	82.36%	5,104.12	0.77%
	MANTENIMIENTO A LOS REFUGIOS TEMPORALES DEL DMQ (Albergues en las AZ: Eugenio Espejo, Calderón, Los Chillos y Eloy Alfaro)	100.00%	25,946.05	25,899.03	99.82%	25,899.03	99.82%	25,899.03	99.82%

PROYECTO: ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
COE METROPOLITANO OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGOS	8.33%	7,000.00	7,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	DOTAR DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COE METROPOLITANO. (Insumos, materiales, Kit para ferias, prendas de protección, materiales de oficina, Convenio FUNDIPOV)	29.36%	84,974.52	44,277.40	52.11%	21,036.30	24.76%	18,193.32	21.41%
	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MANDO MOVIL COE-M. (Adecuación de Sivimovil para implementar y mantenimiento del Centro de Mando Móvil. Adquisición de vehículo. Drone para monitoreo desde Sivimovil)	0.00%	277,776.00	14,560.00	5.24%	-	0.00%	-	0.00%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA DEL COE-M	29.17%	65,000.00	28,829.00	44.35%	24,329.00	37.43%	12,529.37	19.28%
ENLACES DE DATOS DE INTERCONEXIÓN DEL ECU 911 OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	IMPLEMENTACION DE NUEVAS CÁMARAS PARA MONITOREO DEL ECU 911	0.00%	4,500.00	3,572.80	79.40%	-	0.00%	-	0.00%
	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE INTERCONEXIÓN PARA CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911	58.33%	870,000.00	830,003.48	95.40%	830,003.48	95.40%	444,515.05	51.09%
NÓMINA DE PERSONAL	NÓMINA DEL PERSONAL	58.33%	585,203.96	585,203.96	100.00%	585,203.96	100.00%	246,650.34	42.15%

PROYECTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
CENTRO DE GESTIÓN ZOOSANITARIA	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN ZOOSANITARIA DEL SUR	57.50%	517,900.00	400,548.80	77.34%	363,872.75	70.26%	17,984.60	3.47%
APOYO LOGÍSTICO A LA POLICÍA METROPOLITANA	VIDEO WALL	0.00%	299,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Equipos buzos, Equipamiento grupo de rescate y de rescate canino, escolta y seguridad motorizada Alcaldía, 25 Vehículos unipersonales, Mantenimiento, combustible, seguros para automotores	38.10%	928,207.94	766,694.49	82.60%	668,336.32	72.00%	325,121.83	35.03%
	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES MÓVILES. (Adquisición de vehículo)	0.00%	216,800.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	READECUACIÓN DE 8 UNIDADES OPERATIVAS ZONALES DE LA POLICÍA METROPOLITANA (ALBERGUES)	61.25%	110,000.00	97,560.36	88.69%	97,560.36	88.69%	-	0.00%

PROYECTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
APOYO LOGÍSTICO AL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y ENTIDADES MUNICIPALES	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	8.33%	3,000.00		0.00%	-	0.00%		0.00%
	DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. (Adquisición equipos informáticos, prendas de protección y accesorios de seguridad industrial, 4 vehículos para AZ Los Chillos, Tumbaco, Calderón, La Mariscal. Mantenimiento, combustible, seguros para automotores. Adecuación infraestructura Dirección de Gestión Riesgos. Bienes y servicios para funcionamiento. Convenio FUNDIPOV	32.58%	618,938.29	391,577.69	63.27%	334,451.49	54.04%	318,594.86	51.47%
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. (Servicio de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, Soporte técnico y mantenimiento a los sistemas de control, centro de cómputo, respaldos, control accesos, Mantenimiento de equipos y fibra óptica CCTV Barrio Quito Tenis, Tumbaco.	20.83%	137,558.16	100,393.63	72.98%	84,672.79	61.55%	47,543.31	34.56%
	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	8.33%	10,000.00	3,429.66	34.30%	3,429.66	34.30%	3,429.66	34.30%
	SOCIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA, GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD HUMANA. (Coordinación eventos, ferias, rendición cuentas. Material publicitario, publicaciones. Venta o arriendo de espacios publicitarios)	12.24%	45,000.00	28,862.77	64.14%	28,862.77	64.14%	28,699.50	63.78%

PROYECTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
			CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
APOYO LOGÍSTICO A LA POLICÍA NACIONAL	BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS PARA USO DE LA POLICÍA NACIONAL	58.33%	45,000.00	41,600.44	92.45%	41,600.44	92.45%	41,600.44	92.45%
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL	11.11%	51,874.68	46,951.46	90.51%	46,878.69	90.37%	18,983.71	36.60%
	RENOVACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA UPC SUB CIRCUITO LA LIBERTAD, BARRIO LA CANTERA, PARROQUIA LA LIBERTAD	100.00%	39,330.00	33,669.17	85.61%	19,100.92	48.57%	19,100.92	48.57%
NÓMINA DE PERSONAL	NÓMINA DEL PERSONAL	58.33%	389,700.23	389,700.23	100.00%	389,700.12	100.00%	169,706.05	43.55%

OPERACIÓN EP EMSEGURIDAD

PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	% AVANCE PROGRAMÁT	PRESUPUESTO						
				CODIFICADO	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OPERACIÓN EP EMSEGURIDAD	BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA		262,772.00	138,031.51	52.53%	51,161.69	19.47%	51,159.46	19.47%
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	41.67%	21,700.00	19,315.94	89.01%	13,796.90	63.58%	12,807.46	59.02%
		BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	33.37%	391,331.68	226,843.66	57.97%	218,075.25	55.73%	32,867.95	8.40%
		EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	16.67%	20,000.00	20,000.00	100.00%	9,836.70	49.18%	9,836.70	49.18%
		MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	15.91%	97,307.00	51,102.17	52.52%	40,625.50	41.75%	30,775.21	31.63%
		MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	8.08%	11,503.48	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	NÓMINA DE PERSONAL	PAGO DE REMUNERACIONES	58.33%	1,053,799.83	1,049,920.32	99.63%	1,049,863.45	99.63%	571,527.23	54.23%
TOTAL POA 2017			42.74%	19,062,012.61	12,018,942.73	63.05%	10,924,882.24	57.31%	5,285,691.54	27.73%

PROYECTO

A decorative horizontal arrow pointing to the right. The arrow's body is composed of several overlapping, semi-transparent colored segments: red, green, purple, blue, orange, and red. The arrow's tip is a solid green triangle. The text 'PREVENCIÓN SITUACIONAL' is centered within the white space of the arrow's body, enclosed in a thin red border.

PREVENCIÓN SITUACIONAL

ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO CUENDINA - AMAGUAÑA

ANTES



DESPUÉS



ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO LA ESPERANZA – QUINCHE

ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS



ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO – LA BATEA



ANTES

DESPUÉS



ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO - LA COLMENA

ANTES



DESPUÉS



ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO – LA GATAZO

ANTES



DESPUÉS



ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO – PUEBLO SOLO PUEBLO



ANTES

DESPUÉS



ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO – SAN JUAN

ANTES



DESPUÉS




REGENERACIÓN URBANA DE LA ZONA SAN BLAS-LA TOLA" UBICADO EN LA AV. PICHINCHA

ANTES



DESPUÉS

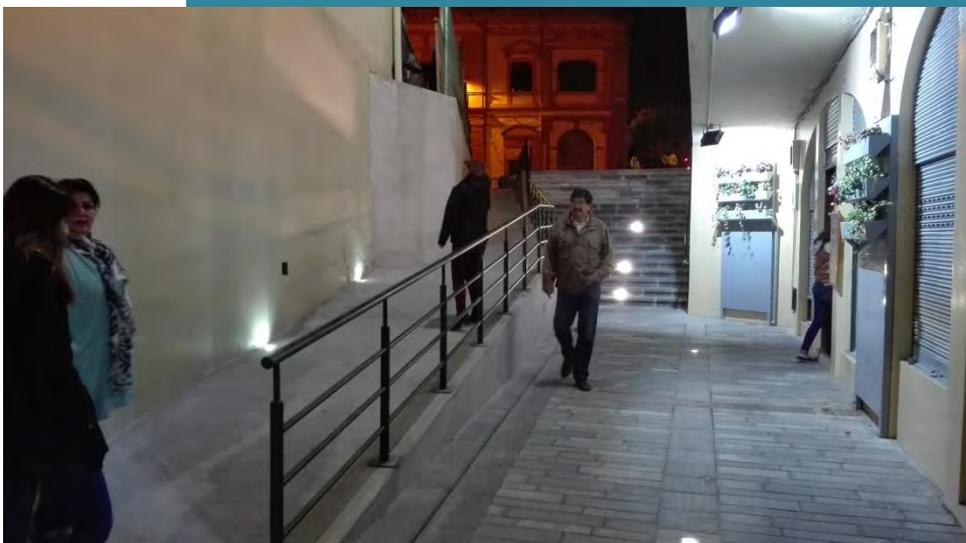

PROYECTO



**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL**

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA DE CALDERÓN BARRIO SIERRA HERMOSA, PARROQUIA CALDERÓN

La inauguración del CEJ de Calderón fue realizada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de marzo de 2017.



Ubicación:

Calles Geovanni Calles y Luis Vaccari.

Área total de intervención:

1.712,18 m²

Distribución de los espacios:


- Auditorio
- Legal
- Mediación
- Promoción de derechos
- Circulo infantil
- Trabajo Social
- Patrocinio Legal
- Sala de Terapias, Sala de Trabajo Grupal



ATENCIÓN A CIUDADANOS VÍCTIMAS DE ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA DEL DMQ

La EP EMSEGURIDAD a través de la contratación de abogados patrocinadores que laboran en los Centros de Equidad y Justicia del DMQ, brinda atención gratuita a la ciudadanía en trámites relacionados con: pérdida de documentos, violencia intrafamiliar, asesoría legal, certificados comisaría de la mujer, contravenciones, asesoramiento a la niñez y adolescencia.

CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA	TOTAL USUARIOS ATENDIDOS
QUITUMBE	743
CALDERON	1.780
TUMBACO	587
CAI TRES MANUELAS	2.037
LA MARISCAL	544
PUELLARO	316
NANEGALITO	416
LA DELICIA	1.254
LOS CHILLOS	873
TOTAL	8.550



PROYECTO



REDUCCIÓN DE RIESGOS

MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ DEL PUEBLO, BARRIO UNIÓN Y PROGRESO ENTRE COMITÉ DEL PUEBLO Y LA BOTA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO

ANTES



DESPUÉS



MURO DE CONTENCIÓN EL TEJAR, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN

ANTES



DESPUÉS



MURO DE CONTENCIÓN SAN SALVADOR, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN

ANTES



DESPUÉS



MURO DE CONTENCIÓN EN LA ARGELIA, BARRIO LUCHA DE LOS POBRES, PARROQUIA LA ARGÉLIA

ANTES



DESPUÉS



MURO DE CONTENCIÓN - BARRIO LEONIDAS PROAÑO-SAN BARTOLO, PARROQUIA LA ARGELIA

ANTES



DESPUÉS



MURO DE CONTENCIÓN - BARRIO LEONIDAS PROAÑO-SAN BARTOLO, PARROQUIA LA ARGELIA

ANTES



DESPUÉS



MURO DE CONTENCIÓN EN EL COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID, BARRIO LA MARÍN, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO



ANTES

ACTUAL



PASO PEATONAL SOBRE EL RÍO MACHÁNGARA, BARRIO EL ROSARIO - LA VICENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA-PUENGASÍ

ANTES



DESPUÉS



PASO PEATONAL, BARRIO LA VAQUERÍA PARROQUIA AMAGUAÑA

ESTADO ACTUAL



ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y DISIPADORES DE ENERGÍA BARRIO EL CALZADO-1 MAYO, PARROQUIA SAN BARTOLO, A.Z ELOY ALFARO

ANTES



ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y DISIPADORES DE ENERGÍA BARRIO EL CALZADO-1 MAYO, PARROQUIA SAN BARTOLO, A.Z ELOY ALFARO

ACTUAL



OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y DISIPADORES DE ENERGÍA DE LOS BARRIOS AYMESA Y ASISTENCIA SOCIAL (PLAYWOOD) PARROQUIA QUITUMBE

ANTES



ACTUAL

CASA SISMO

Implementación de una Casa Sismo para Ferias de Seguridad, el contrato se firmó el 16 de febrero de 2017, el bien fue entregado a la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.



ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Deslizamientos de tierra

LIMPIEZA EN VÍAS



GUAPULO



QUEBRADA EL QUINDE AV. LIBERTADORES



HUNDIMIENTO – ANA MARÍA



ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

De Enero a Mayo de 2017, se han atendido en el Distrito Metropolitano de Quito **59 emergencias**, con una utilización del Fondo Rotativo de **USD.67.137,96**, de conformidad con el siguiente detalle

UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATIVO DE ENERO A JULIO 2017

UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATIVO 2017	TOTAL USD
ALIMENTACION VESTIMENTA Y MEDICINA	8.419,25
MENAJE DE CASA	42.079,65
BIENES INMUEBLES	753,09
CONSULTORÍAS, OBRAS MENORES, MATERIALES, CUADRILLAS DE EMERGENCIA	15.885,97
GASTO TOTAL	67.137,96

DESCRIPCIÓN	N° EVENTOS O EMERGENCIAS
Total mensajes entregados (EVENTO)	9
Primera atención + Menaje de Casa + bienes inmuebles (materiales o mano de obra)	1
Primera atención + Menaje de Casa	17
Primera atención	31
Cuadrillas de emergencia	1
Total de Emergencias	59
Total de familias atendidas	78
Total de personal apoyado en eventos SIS	22
Apoyo de alimentos para el personal que integra el SIS (Evento)	4

ATUCUCHO (09-03-2017)



SAN ROQUE (12-03-2017)



ATUCUCHO - CALLE 26 Y CALLE J (23-03-2017)



SANTA ANITA DE COTOCOLLAO – (25-03-2017)



LADERAS DEL CISNE – ATUCUCHO (31-03-2017)



SANTOSPAMBA (08-04-2017)




TURUBAMBA DE MONJAS (11-04-2017)



TOLONTAG (18-04-2017)



LOS LIBERTADORES (26-04-2017)

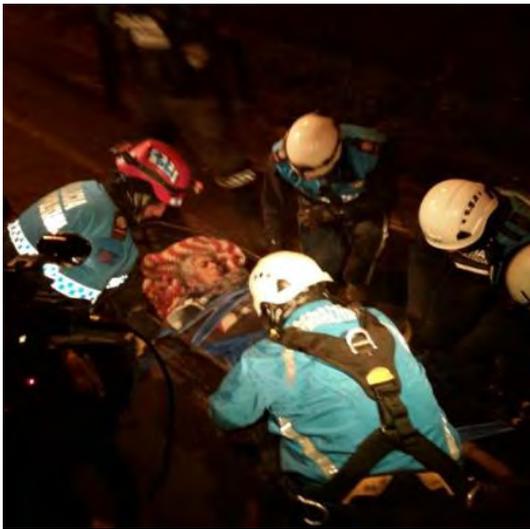

SAN SEBASTIÁN (10-05-2017)



PROYECTO



**APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD**

APOYO LOGÍSTICO A LA POLICÍA METROPOLITANA

El 23 de Marzo de 2017, el Alcalde del DMQ realizó la entrega de 25 Vehículos Unipersonales para uso de la Policía Metropolitana en el control del espacio público.



APOYO LOGÍSTICO A LA POLICÍA METROPOLITANA

- El 30 de diciembre de 2016 se suscribió el contrato para la adquisición de equipo de buceo, mismo que comprende: Bote inflable - Motor fuera de borda, cámara sumergible - Tanque de oxígeno, consola, linterna, regulador de tanque de oxígeno - Visor, traje, guantes, botas - Cuchillo, cuerda dinámica, cuerda estática, polea, mosqueto, chaleco, capucha, aleta, y cinturón - Tabla espinal rígida. Se han realizado las pruebas técnicas y se encuentra en proceso de recepción.



- Se suscribió el 19 de junio de 2017 el contrato para la readecuación de las 8 Unidades Operativas Zonales de la Policía Metropolitana (ALBERGUES): Unidad Multiuso Eloy Alfaro, Quitumbe, Cumbayá, Los Chillos, Calderón, La Y, La Tola, y La Delicia

APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

Adquisición de 4 vehículos para las Jefaturas de Seguridad de las Administraciones Zonales: los Chillos, Tumbaco, Calderón, La Mariscal



APOYO LOGÍSTICO A LA POLICÍA NACIONAL

Renovación y remodelación de la Unidad de Policía Comunitaria UPC Circuito La Libertad 3 (LA CANTERA), Contrato suscrito el 20 de octubre de 2016. La obra se encuentra finalizada, y se ha recibido del mobiliario para su equipamiento.

