



ANEXO 3

PLANO GENERAL DEL ASENTAMIENTO

- 547 -
Quinientos cuarenta y siete


ITEM	RUBROS	UNIDAD	CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS		TIEMPO DE EJECUCIÓN EN 8 AÑOS									
			CANTIDAD	P. TOTAL %	A EJECUTAR	01	02	03	04	05	06	07	08	
001	REPLANTEO DE LOTES Y CIES VÍAS.	Ob.	1.00	1,629.03	100.00									
002	BORDELOS.	m.	453.84	8,807.91										
003	ALCANTARILLADO.	m ² .	685.78	11,877.87										
004	ALCANTARILLADO.	m ³ .	528.08	8,394.28										
005	AGUA POTABLE.	m.	384.84	1,888.63	100.00									
006	ALCANTARILLADO.	m ² .	1,581.74	25,626.58										
007	ENERGÍA ELÉCTRICA.	Ob.	1.00	7,875.84										
			TOTAL=	59,207.13										

CORTES DE VIAS

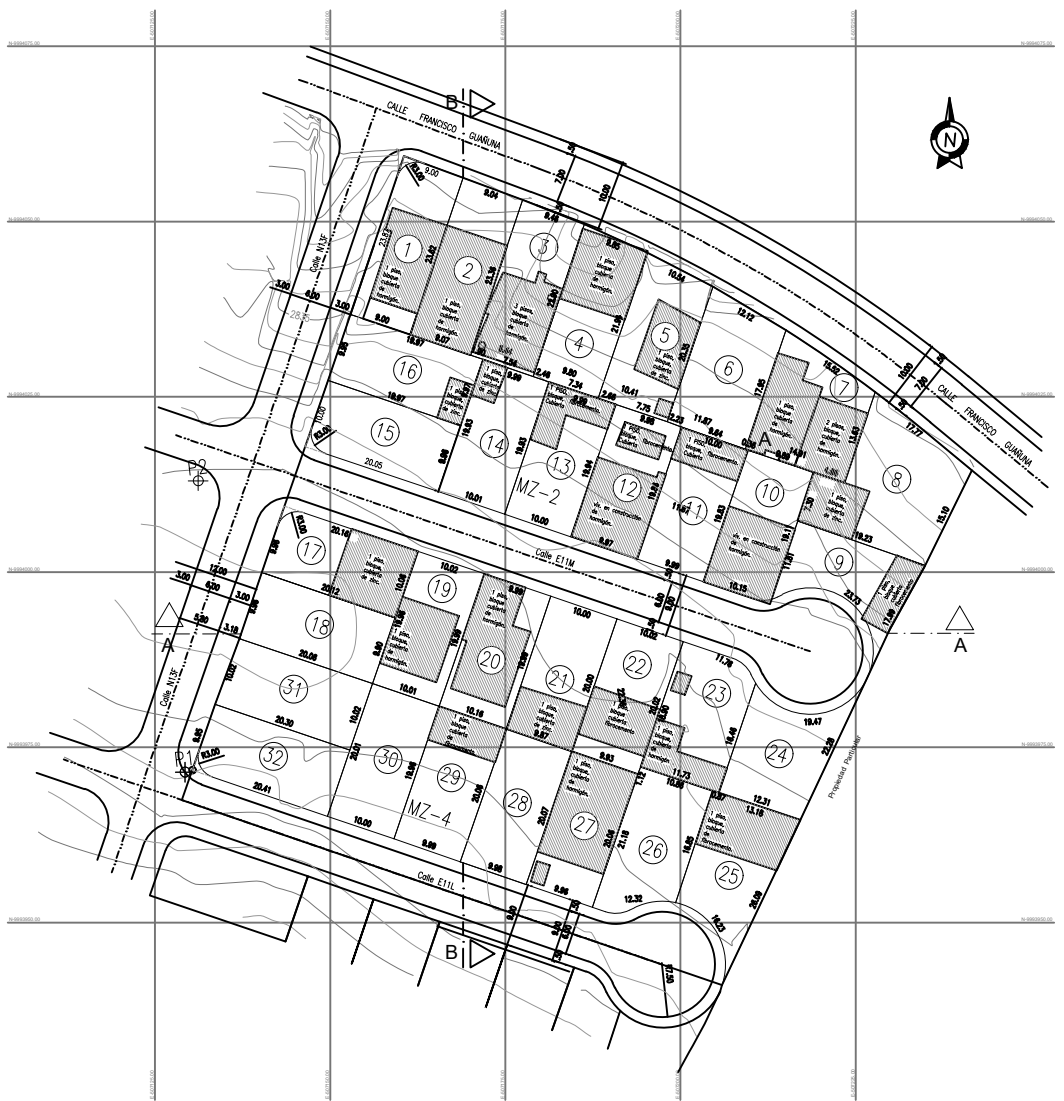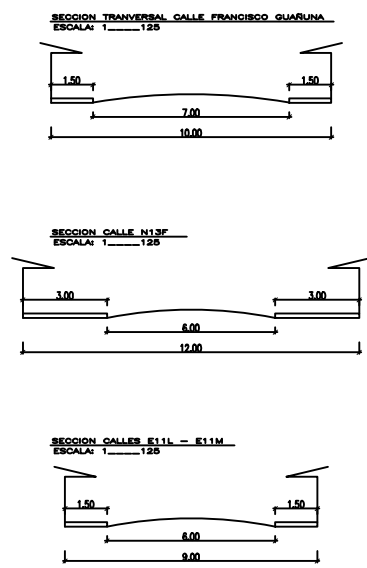

IMPLANTACION GENERAL DE TOPOGRAFIA
ESCALA: 1:500

CORTE LONGITUDINAL A-A'




CORTE LONGITUDINAL B-B'



Nº	AREA (m2)	CUADRO DE ÁREAS Y LINDEROS			
		NORTE (m)	SUR (m)	ESTE (m)	OESTE (m)
1	211.45	9.00	9.00	23.62	23.87
2	213.08	9.64	9.07	23.36	23.62
3	218.69	9.46	9.44	22.90	23.36
4	220.13	9.85	9.85	21.94	22.90
5	220.66	10.54	10.41	20.35	21.94
6	228.18	12.12	11.87	17.95	20.35
7	237.12	15.52	14.81	13.43	17.95
8	319.89	17.77	18.23	15.10	25.59
9	179.54	19.23	23.75 en L.D.	17.99	11.81
10	197.46	9.89	10.15 en L.D.	19.11	19.83
11	198.28	10.00	9.99	19.83	19.86
12	198.68	9.98	9.97	19.86	19.94
13	199.35	9.99	10.00	19.94	19.93
14	199.32	9.99	10.01	19.93	19.93
15	197.81	19.97	20.05	9.86	10.00
16	198.69	19.97	19.97	9.97	9.95
17	199.72	20.16	20.12	10.06	9.96
18	199.51	20.12	20.06	9.90	9.96
19	199.94	10.02	10.01	19.99	19.96
20	201.42	9.99	10.16	19.99	19.99
21	198.61	10	9.87	20.00	19.99
22	200.05	10.02	9.99	20.02	20
23	217.40	11.76 en L.D.	11.73	16.46	18.90
24	204.08	19.47 en L.D.	23.31	22.28	16.46
25	227.32	13.18	16.23 en L.D.	26.09	16.85
26	212.41	10.86	12.32 en L.D.	16.85	21.18
27	199.52	9.93	9.96	20.06	20.07
28	199.21	9.97	9.98	20.07	20.06
29	201.67	10.16	9.99	20.06	19.96
30	200.41	10.01	10.00	19.96	20.01
31	202.20	20.06	20.3	10.02	10.02
32	200.92	20.30	20.41	9.99	9.95

CUADRO DE COORDENADAS GPS' WGS 84			
PTO	NORTE	ESTE	COTA
PTO 1	9.993.971,45	507.129,30	2.837,45
PTO 2	9.994.013,02	507.131,14	2.838,18

UBICACIÓN:

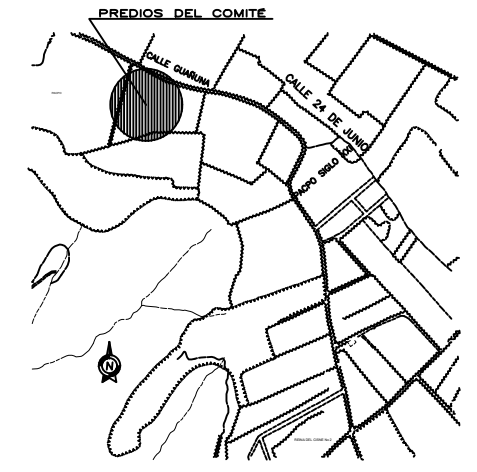

CUADRO DE ÁREAS		
DESCRIPCIÓN	ÁREA (m2.)	%
Nº DE LOTES	032	
ÁREA ÚTIL:	6,702.72	83.77%
ÁREA DE VIAS Y PASAJES:	1,298.23	16.23%
ÁREA TOTAL DE LEVANTAMIENTO:	8,000.95	100.00%
ÁREA ESCRITURA:	8,086.66	

NÚMERO PREDIAL	5784199
CLAVE CATASTRAL	14514-01-021

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO
ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO
COMITÉ PROMEJORAS LOS ANGELES II SEGUNDA ETAPA
Ubicación: PARRQUIA CALDERÓN-SECTOR SAN JUAN-CALLE FRANCISCO GUASUNA

CONTIENE:

- UBICACIÓN
- PLANTA GENERAL DE TOPOGRAFÍA
- CUADRO DE ÁREAS
- CUADRO DE ÁREAS Y LINDEROS
- CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS
- CUADRO DE COORDENADAS
- CORTES DE VIAS

REPRESENTANTE: Bna. Maribel Díaz M. G.L. 1203736771

PROFESIONAL: ARQ. FRANCISCO CIFUENTES P. CONSEJUPY 1008-05-846219

ESCALA: INDICADAS

FECHA: DICIEMBRE-2018

CARTOGRAFIA DAYC

LEV. TOP. GEOREF.

PROC. DATOS:

ARCHIVO DIGITAL:

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL/OPORT METODOLOGIA DESENYO DE UNO DE LOS SECTORES DE INGENIERIA

ESCALA: INDICADA

Arq. Froo. Cifuentes.

Arq. Froo. Cifuentes.

1

SELLOS MUNICIPALES:
