

ANEXO – 4


**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA
TECNICA**



REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS
EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 segunda fase y Oyacoto, durante el periodo 1 al 30 de Abril del 2017 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES.

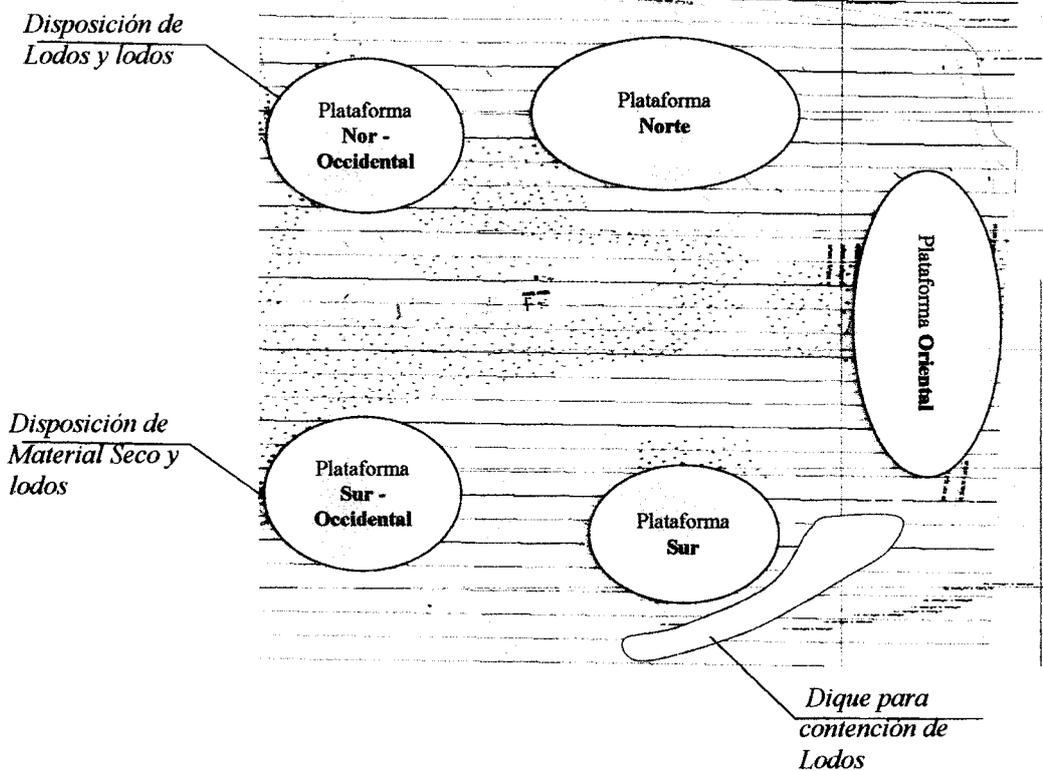

La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que escurren de la plataforma Sur- Occidental.



Se procedió con la apertura de ventanas y mejoramiento de Vías de acceso en las plataformas superiores Nor y sur Occidentales de la escombrera, con el fin de mejorar y acelerar la recepción y disposición de material que ingresa. Tomando en cuenta la importancia de generar estabilidad en las plataformas, se trabaja generando drenajes tanto transversales como longitudinales en relación a los canales y cunetas activas que evitarán posibles empozamientos de aguas durante el invierno.

El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1,00 hasta 1.20 metros de espesor, debidamente tendidas y compactadas.

La recepción de lodos se lo realiza en las plataformas Nor y Sur Occidentales, las cuales se trabajan durante el día mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos por la noche (troje 4). Durante el día se recepta lodos sobre la quebrada el Curiquingue de la escombrera Oyacoto.

- **Personal y Equipo Utilizado**

Equipos:

5 Tractores
3 Excavadoras
1 Rodillo pata de cabra
1 Motoniveladora
1 Tanquero
1 Cargadora Frontal

Personal:

1 Superintendente
1 Residente de Obra
6 Operadores de Tractor
1 Operador de Rodillo
2 Operador de Motoniveladora
4 Operadores de Excavadoras
1 Chofer de Tanquero
2 Operador de Cargadora Frontal
3 Recibidores de materiales día y 3 en la noche
1 Eléctrico
1 Topógrafo
2 Cadeneros




1 Soldador

1 Mecánico de planta

2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de Abril, se presentaron lluvias de alta intensidad y durabilidad, pero sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas nor y sur -occidentales en la escombrera Troje 4, y en el troje 3 y en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.

Por el volumen de transporte durante el día y la noche, se cuenta con personal diurno y nocturno, para la recepción y disposición de estos materiales.


CONSORCIO TROJE OYACOTO
